



Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Facultad de Ingeniería
Centro de Investigación y Estudios de Posgrado

Propuesta de un sistema de mejora del indicador de entregas al cliente en productos clave, con aplicación en dosificadoras y accesorios dentro de la división industrial de una empresa de ingeniería hidráulica en la región Norteamérica.

T E S I S

Que para obtener el grado de:

Maestría en Planeación Estratégica e Innovación

Presenta:

Ing. Mayra Yesenia Jiménez Medina

Asesor(a):


Dr. Vicente Hernández García

Co asesor(a):

Dr. Juan Manual Izar Landeta

San Luis Potosí, S. L. P.

Septiembre de 2025



17 de julio de 2025

**ING. MAYRA YESENIA JIMÉNEZ MEDINA
P R E S E N T E.**

En atención a su solicitud de Temario, presentada por el **Dr. Vicente Hernández García y Dr. Juan Manuel Izar Landeta**, Asesor y Coasesor de la Tesis que desarrollará Usted, con el objeto de obtener el Grado de **Maestro en Planeación Estratégica e Innovación**, me es grato comunicarle que en la sesión del H. Consejo Técnico Consultivo celebrada el día 17 de julio del presente año, fue aprobado el Temario propuesto:

TEMARIO:

"Propuesta de un sistema de mejora del indicador de entregas al cliente en productos clave, con aplicación en dosificadoras y accesorios dentro de la división industrial de una empresa de ingeniería hidráulica en la región Norteamérica"

Introducción.

1. Fundamentos para la optimización del desempeño operativo: cadena de suministro, mejora continua y herramientas tecnológicas
2. Aplicación del ciclo PDCA como método para la mejora de indicaciones en la cadena de suministro
3. Diseño e implementación del sistema de mejora propuesto

Conclusiones

Referencias

"MODOS ET CUNCTARUM RERUM MENSURAS AUDEBO"

ATENTAMENTE



DR. EMILIO JORGE GONZÁLEZ GALVÁN
DIRECTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SAN LUIS POTOSÍ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIRECCION

www.uaslp.mx

Ccp. Archivo
-bvl/g

Av. Manuel Nava 8
Zona Universitaria • CP 78219
San Luis Potosí, S.L.P.
tel. (444) 826 2330 al 39
fax (444) 826 2330

"1945-2025: 80 años formando profesionales de la Ingeniería en beneficio de la sociedad"



UASLP
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí



FACULTAD DE
INGENIERÍA



CENTRO DE
**INVESTIGACIÓN
Y ESTUDIOS
DE POSGRADO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
FACULTAD DE INGENIERÍA
Área de Investigación y Estudios de Posgrado

DECLARACIÓN

El presente trabajo que lleva por título:

Propuesta de un sistema de mejora del indicador de entregas al cliente en productos clave, con aplicación en dosificadoras y accesorios dentro de la división industrial de una empresa de ingeniería hidráulica en la región Norteamérica.

se realizó en el periodo de junio de 2024 a septiembre de 2025 bajo la dirección del Dr. Vicente Hernández García y Dr. Juan Manual Izar Landeta.

Originalidad

Por este medio aseguro que he realizado el trabajo reportado, y la escritura de este documento de tesis para fines académicos sin ayuda indebida de terceros y sin utilizar otros medios más que los indicados.

Las referencias e información tomadas directa o indirectamente de otras fuentes se han definido en el texto como tales y se ha dado el debido crédito a las mismas.

El autor exime a la UASLP de las opiniones vertidas en este trabajo escrito y asume la responsabilidad total del mismo.

Este trabajo no ha sido sometido como tesis o trabajo terminal a ninguna otra institución nacional o internacional en forma parcial o total, exceptuando el caso cuando existe un convenio específico de doble titulación celebrado entre ambas instituciones.

Se autoriza a la UASLP para que divulgue este documento para fines académicos.

El autor del trabajo escrito, Ing. Mayra Yesenia Jiménez Medina

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como a todos los asesores y maestros que formaron parte de este camino académico. Gracias por compartir sus conocimientos, su experiencia y por cada consejo que me permitió crecer profesional y personalmente durante esta maestría.

A mi amado esposo, cuyo apoyo incondicional y orgullo en cada uno de mis logros han sido una fuente constante de fortaleza y motivación a lo largo de este proceso.

A mis padres, por inculcarme desde siempre el valor del aprendizaje continuo y por motivarme a seguirme preparando para alcanzar mis metas. A mis hermanas, con la esperanza de ser para ellas una inspiración y un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación todo es posible.

A mi querida abuelita, por escucharme recitar mi tesis una y mil veces, siempre con la misma emoción y con palabras de aliento que me llenaron de confianza en cada paso.

De manera muy especial, agradezco a Juan Curi, quien fue pieza clave en el desarrollo de este proyecto, un mentor excepcional y un amigo invaluable en esta etapa.

Asimismo, agradezco profundamente a la empresa donde laboro, por su respaldo y apoyo económico que hicieron posible mi formación en esta maestría.

A todos ustedes, gracias por ser parte de este logro.

Índice

INTRODUCCION.....	1
ANTECEDENTES.....	2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.....	4
JUSTIFICACIÓN	5
OBJETIVOS.....	6
<i>Objetivo general.....</i>	<i>6</i>
<i>Objetivos específicos.....</i>	<i>6</i>
HIPÓTESIS.....	6
1. FUNDAMENTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO OPERATIVO: CADENA DE SUMINISTRO, MEJORA CONTINUA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.....	7
1.1 ¿QUÉ ES LA CADENA DE SUMINISTRO?.....	7
1.1.1 <i>Objetivos de la gestión de la cadena de suministro.....</i>	<i>7</i>
1.1.2 <i>Factores determinantes del rendimiento de la cadena de suministro.....</i>	<i>8</i>
1.2 PLANIFICACIÓN	9
1.2.1 <i>Ejecución logística.....</i>	<i>10</i>
1.2.2 <i>Previsión de la demanda.....</i>	<i>10</i>
1.2.2.1 Tipos de previsión	10
1.2.3 <i>Planificación y programación de la producción.....</i>	<i>11</i>
1.3 INVENTARIOS.....	12
1.3.1 <i>Agotamiento de inventario.....</i>	<i>14</i>
1.4 RENDIMIENTO DE VENTAS	14
1.4.1 <i>Estado de órdenes de venta.....</i>	<i>15</i>
1.4.2 <i>Bloqueos de entrega en órdenes de venta.....</i>	<i>15</i>
1.5 RENDIMIENTO DE LOS SUMINISTROS.....	16
1.5.1 <i>Distribución en la cadena de suministro.....</i>	<i>17</i>
1.6 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y TIEMPOS DE ENTREGA.....	19
1.6.1 <i>Precisión del tiempo de entrega</i>	<i>20</i>
1.6.2 <i>Indicadores de tiempo de entrega estándar.....</i>	<i>21</i>
1.6.2.1 Tiempo de Entrega Objetivo (TLT, por sus siglas en inglés: Target Lead Time).....	22
1.6.2.2 Tiempo de Entrega Actual (CLT, por sus siglas en inglés: Current Lead Time)	22
1.6.2.3 Tiempo de Transporte (TT, por sus siglas en inglés: Transit Time).....	23
1.6.2.4 Tiempo de Entrega Requerido (RLT, por sus siglas en ingles Required Lead Time)	23
1.6.3 <i>Impacto de los tiempos de entrega en la competitividad y satisfacción del cliente....</i>	<i>23</i>
1.7 METODOLOGÍAS DE MEJORA CONTINUA.....	24
1.7.1 <i>Mejora continua.....</i>	<i>24</i>
1.7.1.1 Características del Kaizen	24
1.7.2 <i>Ciclo PDCA.....</i>	<i>25</i>
1.7.3 <i>Análisis de causa raíz</i>	<i>26</i>
1.7.4 <i>Principio 80/20.....</i>	<i>27</i>

1.7.5	<i>La Técnica de los Cinco Porqués</i>	28
1.7.6	<i>Gestión por indicadores</i>	29
1.8	HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ENTREGAS	29
1.8.1	<i>SAP BW/4HANA</i>	29
1.8.2	<i>Informe de SAP BW - COTTR</i>	30
1.8.3	<i>Transacción SAP Tcode VA03 - Visualizar pedidos de venta</i>	31
1.8.3.1	Funciones de VA03:	32
2.	APLICACIÓN DEL CICLO PDCA COMO MÉTODO PARA LA MEJORA DE INDICADORES EN LA CADENA DE SUMINISTRO.	33
2.1	NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN	33
2.2	DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	33
2.3	POBLACIÓN Y MUESTRA	33
2.3.1	<i>Población</i>	33
2.3.2	<i>Tipo de muestreo</i>	34
2.3.3	<i>Justificación del muestreo</i>	34
2.4	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS	34
2.4.1	<i>Metodología PDCA</i>	34
2.4.2	<i>Etapas 1: Planear</i>	35
2.4.2.1	Identificación del problema:.....	35
2.4.2.2	Definición de objetivos claros:.....	36
2.4.2.3	Diseño del plan de acción:	37
2.4.3	<i>Etapas 2: Hacer</i>	37
2.4.3.1	Establecimiento del proceso de implementación	38
2.4.3.2	Ejecución de acciones conforme al diagrama de flujo	38
2.4.4	<i>Etapas 3: Verificar</i>	38
2.4.4.1	Verificación mediante tabla comparativa:.....	39
2.4.4.2	Análisis de cumplimiento	39
2.4.5	<i>Etapas 4: Actuar</i>	39
2.4.5.1	Estandarización mediante capacitación	39
2.4.5.2	Monitoreo y evaluación	40
2.4.5.3	Estrategia de mejora continua.....	41
3.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MEJORA PROPUESTO.	42
3.1	ETAPA 1: PLANEAR.....	42
3.1.1	<i>Identificación del problema:</i>	42
3.1.2	<i>Definición de objetivos claros:</i>	43
3.1.3	<i>Diseño del plan de acción:</i>	43
3.2	ETAPA 2: HACER	44
3.2.1	<i>Establecimiento del proceso de implementación</i>	44
3.2.2	<i>Ejecución de acciones conforme al diagrama de flujo</i>	46
3.3	ETAPA 3: VERIFICAR	54
3.3.1	<i>Verificación mediante tabla comparativa.</i>	54
3.3.2	<i>Análisis de cumplimiento</i>	55
3.4	ETAPA 4: ACTUAR	55

3.4.1 Estandarización mediante capacitación	55
3.4.2 Monitoreo y evaluación	56
3.4.3 Estrategia de mejora continua.....	57
CONCLUSIONES	59
PROYECTOS A FUTURO	60
REFERENCIAS.....	61

Tabla de figuras

ILUSTRACIÓN 1 ORGANIZACIÓN POR DIVISIONES DE LA EMPRESA.....	2
ILUSTRACIÓN 2 DIVISIÓN DE LA EMPRESA POR REGIONES OPERATIVAS.....	3
ILUSTRACIÓN 3 MARCO DE TOMA DE DECISIONES EN LA CADENA DE SUMINISTRO.....	9
ILUSTRACIÓN 4 POBLACIÓN DEL ESTUDIO.....	33
ILUSTRACIÓN 5 DIAGRAMA DE FASES BASADO EN EL CICLO PDCA.....	35
ILUSTRACIÓN 6 PLANTILLA DE LA TÉCNICA DE LOS 5 PORQUÉS PARA IDENTIFICAR LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA. ...	36
ILUSTRACIÓN 7 PLANTILLA PARA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.....	36
ILUSTRACIÓN 8 PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT PARA DISEÑAR EL PLAN DE ACCIÓN.....	37
ILUSTRACIÓN 9 PLANTILLA DE DIAGRAMA DE FLUJO PARA REPRESENTAR LOS PASOS A SEGUIR EN EL PROYECTO.	38
ILUSTRACIÓN 10 PLANTILLA DE TABLA DE COMPARACIÓN DE OBJETIVOS VS RESULTADOS.....	39
ILUSTRACIÓN 11 PLANTILLA DE PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL.....	40
ILUSTRACIÓN 12 PLANTILLA DE GRÁFICA DE TENDENCIA PARA VISUALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR. .	40
ILUSTRACIÓN 13 PLANTILLA PARA REGISTRO DE PROPUESTAS DE MEJORA.	41
ILUSTRACIÓN 14 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LOS 5 PORQUÉS CON EL RESULTADO DEL ANÁLISIS.	42
ILUSTRACIÓN 15 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	43
ILUSTRACIÓN 16 DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN POR MEDIO DE UN DIAGRAMA DE GANTT.	44
ILUSTRACIÓN 17 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS A SEGUIR DURANTE EL PROYECTO.	45
ILUSTRACIÓN 18 FILTROS APLICADOS AL REPORTE COTTR.	46
ILUSTRACIÓN 19 FILTRO PARA VISUALIZAR PRODUCTOS DE SEGMENTACIÓN A	46
ILUSTRACIÓN 20 FILTRO PARA VISUALIZAR ORDENES ENTREGADAS FUERA DE TIEMPO.....	47
ILUSTRACIÓN 21 ESTRUCTURA INICIAL DE LA BASE DE DATOS.....	47
ILUSTRACIÓN 22 ESTRUCTURA CON DIFERENCIA DE DÍAS ENTRE FECHA DE CREACIÓN Y REQUERIDA.	48
ILUSTRACIÓN 23 ESTRUCTURA CON DIFERENCIA DE DÍAS ENTRE FECHA REQUERIDA Y DE ENTREGA.....	48
ILUSTRACIÓN 24 TABLA DE FALLAS CONOCIDAS.	48
ILUSTRACIÓN 25 ESTRUCTURA CON COMENTARIOS.	49
ILUSTRACIÓN 26 TABLA DE COMENTARIOS Y FRECUENCIA DE APARICIÓN.....	49
ILUSTRACIÓN 27 TABLA CON ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS.....	50
ILUSTRACIÓN 28 TABLA CON ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES.	50
ILUSTRACIÓN 29 ESTRUCTURA CON CATEGORÍA Y ÁREA RESPONSABLE.....	51
ILUSTRACIÓN 30 RESUMEN EJECUTIVO CON DATOS CLAVE.	52
ILUSTRACIÓN 31 TABLA DE RESULTADOS DEL INDICADOR DE ENTREGAS POR MES.....	53
ILUSTRACIÓN 32 TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS VS OBJETIVOS.....	54
ILUSTRACIÓN 33 LISTA DE PERSONAL CAPACITADO EN EL USO DE LA HERRAMIENTA.....	56
ILUSTRACIÓN 34 GRÁFICA DE TENDENCIA DEL INDICADOR DE ENTREGAS A TIEMPO.	57
ILUSTRACIÓN 35 REGISTRO DE PROPUESTAS DE MEJORA.	58

INTRODUCCION

En el entorno altamente competitivo del sector manufacturero, el cumplimiento de los tiempos de entrega es un factor determinante para garantizar la satisfacción del cliente y preservar la competitividad empresarial. Esta investigación se centra en la división industrial de una organización global dedicada a la ingeniería hidráulica, especializada en soluciones inteligentes y sostenibles. Dentro de esta división, en la región de Norteamérica, el indicador de “Entregas a tiempo contra requerimiento del cliente”, que por sus siglas en inglés es COTTR (Customer On Time To Request), refleja un desempeño del 50%, frente al objetivo establecido del 70%. Esta brecha evidencia fallas significativas que impactan tanto en la percepción del cliente como en la eficiencia operativa de la compañía.

El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar las causas raíz que explican el bajo desempeño en las entregas de dosificadoras y accesorios, productos que pertenecen a la división industrial y que, por su alta demanda e impacto operativo, fueron seleccionados como muestra representativa para el análisis. Esta selección permite evaluar con mayor precisión los factores que afectan el cumplimiento de entrega y proponer soluciones enfocadas.

Para ello, se desarrollará una herramienta estandarizada que permita monitorear el desempeño de las entregas, categorizar las fallas y asignar responsabilidades de forma clara y estructurada. Esta herramienta busca facilitar la toma de decisiones informadas y promover un proceso de mejora continua dentro de la organización.

La tesis se estructura en cuatro capítulos principales:

- **Primera parte: Planteamiento del problema y objetivos.**
Este capítulo contextualiza el problema, establece los objetivos de la investigación y delimita el alcance y justificación del estudio. Asimismo, se presenta la hipótesis que orienta el desarrollo del análisis.
- **Segunda parte: Marco teórico.**
Aquí se exponen los conceptos y teorías relevantes que sustentan la investigación, incluyendo la estructura y dinámica de la cadena de suministro, los factores que determinan el desempeño logístico y los modelos de mejora continua.
- **Tercera parte: Marco metodológico.**
Este capítulo presenta la metodología empleada para abordar el problema de investigación. La estrategia está basada en el ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), que por sus siglas en inglés es conocido como PDCA (Plan-Do-Check-Act). En este apartado se expone el diseño de la investigación, las fases que guían su desarrollo, así como los criterios de validación y las técnicas utilizadas.
- **Cuarta parte: Resultados y conclusiones.**
Finalmente, se presentan los hallazgos del análisis, las limitaciones del estudio y las conclusiones obtenidas, destacando cómo la información generada puede respaldar futuras acciones correctivas.

Este enfoque busca no solo comprender las causas que originan el bajo desempeño en las entregas, sino también establecer las bases para un monitoreo eficiente y sostenido que permita a la empresa optimizar sus procesos y fortalecer su posición en el mercado. La implementación de esta herramienta representa una oportunidad para transformar los datos en un recurso estratégico, contribuyendo de forma sostenible al cumplimiento de los objetivos de negocio.


Antecedentes

La presente investigación se desarrolla en una organización global del sector manufacturero, especializada en ingeniería hidráulica, cuyo propósito es mover y transformar el agua mediante soluciones inteligentes, sostenibles y de alta eficiencia energética. Sus productos y servicios están diseñados para aplicaciones en edificios comerciales, construcciones domésticas, sectores industriales y sistemas de suministro de agua. Con sede en Dinamarca, opera en más de 55 países y cuenta con más de 19,000 empleados organizados en una estructura que combina unidades globales, regionales y locales.

Para optimizar sus operaciones, la organización se divide en cuatro divisiones principales:

- **Servicios para edificios comerciales (CBS):** Enfocados en distribuidores, instaladores y contratistas.
- **Servicios para construcciones domésticas (DBS):** Destinados a propietarios de viviendas y socios de distribución.
- **Sector industrial (IN):** Orientados a industrias como alimentos, bebidas, farmacéutica, electrónica y energías renovables.
- **Sector de suministro de agua (WU):** Dirigidos a usuarios municipales, de riego y de aguas subterráneas.

Ilustración 1 Organización por divisiones de la empresa.

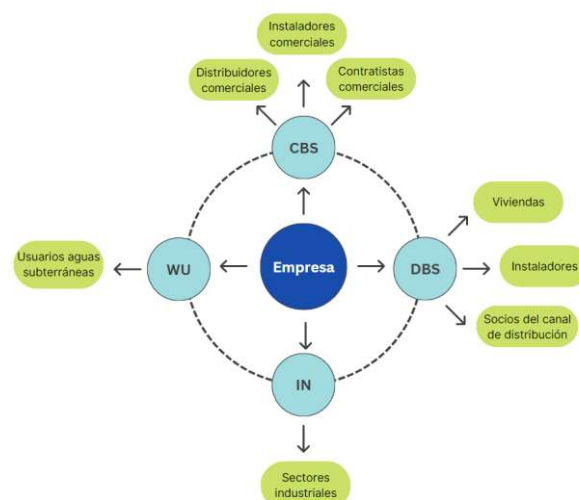

Fuente: Elaboración propia (2024).

A nivel global, la empresa opera en seis regiones: América, China, Asia y Oceanía, Medio Oriente y África, Europa Occidental, y Europa Central y Oriental. Este estudio se enfoca en la **división industrial de la zona de Norteamérica**, región en la que se desempeña la investigadora, con el objetivo de analizar el desempeño de las entregas en este mercado específico. Dentro de esta región, los centros de distribución que abastecen el mercado son **GMU2** y **GMUD**.

Ilustración 2 División de la empresa por regiones operativas.



Fuente: Elaboración propia (2024).

Dentro de la gestión de la cadena de suministro, la **segmentación de productos** es un proceso clave que permite clasificar los productos según su comportamiento de demanda y los niveles de inventario requeridos en los centros de distribución. Esta clasificación define los puntos de desacoplamiento de la cadena de suministro, diferenciando entre productos que deben mantenerse en inventario y aquellos que se producen bajo pedido (Kapusi, 2023).

Las categorías de segmentación utilizadas en la empresa son las siguientes:

- **Categoría A:** Productos de demanda estable, mantenidos en inventario en los centros de distribución, con tiempo de entrega estándar de 1 día.
- **Categoría B:** Productos de demanda inestable, pero de alto volumen, cuyos componentes están disponibles en las plantas de producción con tiempos de entrega preacordados.
- **Categoría C:** Productos de bajo volumen, fabricados bajo pedido con tiempos de entrega conocidos.
- **Categoría D:** Productos de diseño específico y órdenes especiales, con tiempos de entrega desconocidos.

Este estudio se enfoca en los **productos A**, ya que su análisis es más sencillo en comparación con otras categorías. Debido a su naturaleza de demanda estable y la

obligación de mantener inventario suficiente, se espera que estos productos tengan alta disponibilidad y entregas puntuales.

Uno de los principales indicadores de la cadena de suministro de la empresa es el **COTTR**, que mide el porcentaje de pedidos entregados a los clientes en la fecha solicitada. Este indicador es clave, ya que está directamente relacionado con la segmentación de productos, la gestión de inventarios y la eficiencia operativa.

El desempeño de las entregas se analiza mediante reportes extraídos de **SAP BW**, que consolidan información histórica sobre los pedidos realizados y su cumplimiento. Sin embargo, el análisis actual presenta limitaciones, ya que no permite identificar con precisión las causas raíz de los retrasos, ni categorizar los fallos de manera sistemática para asignar responsabilidades y definir planes de acción efectivos. Por ello, esta investigación busca abordar dicha problemática, proporcionando una base de datos estructurada que facilite el análisis del desempeño de entrega y la identificación de los factores que afectan el COTTR.

Planteamiento del problema

El desempeño del indicador de entregas en tiempo, actualmente en un 50%, evidencia fallas importantes en los procesos de la división industrial de Norteamérica de la empresa. Este bajo resultado no sólo afecta la percepción del cliente y la confianza en la marca, sino que también compromete la competitividad en un mercado donde la capacidad de responder de manera ágil y precisa es esencial.

Aunque las entregas fuera de tiempo han sido una problemática constante, esta investigación se enfoca en el análisis de los datos del primer semestre del 2024. En un principio, se consideró que la raíz del problema estaba en la falta de inventario en los centros de distribución. Como respuesta, se implementó un plan para aumentar la disponibilidad de productos. Sin embargo, esta medida no logró mejorar los resultados, lo que reveló que las fallas tenían múltiples causas que no habían sido identificadas ni comprendidas en su totalidad.

Actualmente, las entregas tardías carecen de un sistema estructurado que permita analizar y categorizar las razones detrás de las fallas, así como asignar responsables. Este vacío organizativo dificulta tanto el monitoreo del desempeño como la implementación de estrategias correctivas eficaces. La necesidad de un análisis profundo y sistemático es evidente, ya que solo a través de una comprensión clara de las causas del problema será posible establecer herramientas que permitan su seguimiento y mejora en el desempeño de forma sostenible.

Delimitación del Problema

Esta investigación tiene como propósito identificar las causas raíz del bajo desempeño en las entregas de dosificadoras y accesorios durante el año 2024. El análisis se centrará

en los datos correspondientes al primer semestre del año, lo que permitirá trabajar con información reciente y representativa para establecer un diagnóstico confiable.

El estudio se enfocará únicamente en los productos clasificados dentro de la segmentación A, que son aquellos que se mantienen en inventario de manera continua debido a su alta demanda y relevancia operativa. Aproximadamente el 70% de los productos de dosificadoras y accesorios pertenecen a esta categoría, lo que asegura que la muestra seleccionada sea significativa para evaluar el desempeño de las entregas y la disponibilidad en los centros de distribución.

El alcance de la tesis se limita a generar un diagnóstico claro y estructurado, que permita identificar las fallas y asignar responsables, sirviendo como base para la toma de decisiones y la formulación de planes de mejora por parte de los equipos correspondientes. No se contempla en este documento la descripción detallada de los planes de acción específicos ni el análisis de productos distintos a los de la muestra establecida. Posterior a la ejecución de las acciones correctivas, se realizará una evaluación del desempeño, con el fin de verificar su impacto en la mejora del indicador de entregas.

Justificación

El bajo desempeño en las entregas afecta directamente la satisfacción del cliente y la competitividad de la empresa en un entorno empresarial altamente demandante. La falta de un análisis detallado y estructurado sobre las causas detrás de este problema limita la capacidad de implementar soluciones efectivas.

Esta tesis es fundamental porque se enfoca en identificar las causas raíz de las fallas en las entregas, lo que permitirá comprender los factores específicos que afectan el desempeño. Con esta comprensión, se podrá desarrollar una herramienta estandarizada para el seguimiento continuo del indicador, facilitando así la toma de decisiones informadas y la implementación de mejoras dirigidas.

La importancia de este trabajo radica en que proporcionará una base sólida para optimizar los procesos de entrega, lo que no solo mejorará la relación con los clientes, sino también la eficiencia operativa de la empresa. Al abordar este problema de manera estructurada, se contribuirá a mejorar el cumplimiento de los tiempos de entrega, fortaleciendo la competitividad de la empresa y optimizando recursos de forma sostenible.

Objetivos

Objetivo general

Lograr un desempeño superior al 70% en el indicador de entregas a tiempo de los productos dosificadoras y accesorios, a través de la implementación de una herramienta que facilite la detección, análisis y seguimiento de las causas que generan fallas en el cumplimiento de entregas.

Objetivos específicos

- Analizar los datos de entregas correspondientes al primer semestre de 2024 para identificar los factores que contribuyen al incumplimiento de los tiempos de entrega.
- Desarrollar una herramienta estandarizada para el monitoreo del desempeño de las entregas, que permita evaluar la evolución del indicador y facilitar la identificación de áreas problemáticas.
- Categorizar las causas raíz de las fallas en las entregas, asignando responsabilidades a las áreas correspondientes para proporcionar un análisis claro y estructurado.
- Proveer información detallada y organizada que facilite la toma de decisiones y apoye la implementación de planes de mejora.

Hipótesis

El diseño e implementación de una plantilla estandarizada permitirá identificar y categorizar de manera precisa las causas raíz de las fallas en las entregas, además de presentar los resultados de forma gráfica para facilitar su análisis. Este enfoque proporcionará a los equipos responsables la información necesaria para desarrollar e implementar planes de acción específicos, lo que, por ende, favorecerá una mejora progresiva y sostenible en el indicador de entregas a tiempo, fortaleciendo la competitividad de la empresa y la satisfacción del cliente.

1. Fundamentos para la optimización del desempeño operativo: cadena de suministro, mejora continua y herramientas tecnológicas.

1.1 ¿Qué es la cadena de suministro?

Una cadena de suministro se entiende como un sistema que abarca todas las entidades que participan, ya sea de manera directa o indirecta, en la satisfacción de una solicitud del cliente. Este sistema incluye una diversidad de actores, como fabricantes, proveedores, transportistas, almacenes, minoristas y los propios clientes. En el contexto de una organización, la cadena de suministro integra todas las funciones necesarias para atender las necesidades del cliente, incluyendo desarrollo de productos, marketing, operaciones, distribución, finanzas y atención al cliente.

La cadena de suministro es un sistema dinámico que se caracteriza por el intercambio constante de información, productos y recursos financieros entre sus diferentes etapas. El flujo de información abarca aspectos críticos como precios, disponibilidad de productos y detalles sobre las transacciones de venta. Este intercambio de información da lugar a una serie de interacciones a lo largo de la cadena, que incluye la gestión de órdenes de reabastecimiento y el control de inventarios.

Los clientes desempeñan un papel fundamental en la cadena de suministro, ya que el objetivo principal es satisfacer sus requerimientos y, al mismo tiempo, generar beneficios para las entidades implicadas. Aunque el término “cadena de suministro” a menudo sugiere un modelo lineal de movimiento de productos desde los proveedores hasta los consumidores finales, es vital reconocer que también existen flujos bidireccionales de información y recursos financieros dentro de estas redes. Adicionalmente, una cadena de suministro involucra comúnmente múltiples participantes en cada fase, lo que revela una estructura de red más compleja que una simple cadena. Por esta razón, se utilizan términos como “red de suministro” o “web de suministro” para describir adecuadamente las complejidades de las cadenas de suministro contemporáneas.

Una cadena de suministro típica puede incluir diversas etapas, tales como clientes, minoristas, mayoristas o distribuidores, fabricantes y proveedores de componentes o materias primas. Cada una de estas etapas está interconectada mediante flujos de productos, información y fondos, que pueden desplazarse en ambas direcciones. El diseño de una cadena de suministro debe responder a las necesidades del cliente y a los roles específicos de las diferentes etapas, lo que resalta la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptación en la gestión de la cadena de suministro (Chopra & Meindl, 2016).

1.1.1 Objetivos de la gestión de la cadena de suministro

El objetivo de una cadena de suministro es maximizar el valor total generado, conocido como excedente de la cadena de suministro, que se calcula como la diferencia entre el valor que el cliente asigna al producto y los costos totales de la cadena para satisfacer

esa demanda. Este excedente refleja la rentabilidad de la cadena, que se incrementa al restar los costos de los ingresos obtenidos.

Es fundamental evaluar el rendimiento de la cadena en términos de excedente en lugar de centrarse solo en las ganancias de cada etapa, ya que un enfoque en aumentar el excedente motiva a todos los participantes a contribuir al crecimiento general.

El siguiente paso es identificar las fuentes de valor y costos. El cliente es la única fuente de ingresos, y el valor que obtiene al adquirir un producto varía según varios factores. La gestión eficiente de los flujos de información, productos y fondos es clave para el éxito de la cadena, permitiendo así beneficiar a todos sus integrantes (Chopra & Meindl, 2016).


1.1.2 Factores determinantes del rendimiento de la cadena de suministro

El rendimiento de una cadena de suministro es un aspecto crítico para el éxito organizacional, dado que debe equilibrar la capacidad de respuesta a la demanda del cliente con la eficiencia operativa. Este equilibrio se logra a través de la interacción de seis factores fundamentales, donde cada uno de estos elementos desempeña un papel esencial en la optimización del rendimiento y la rentabilidad de la cadena de suministro:

- 1) **Instalaciones:** Este concepto se refiere a los puntos físicos dentro de la red de la cadena de suministro donde se almacenan, ensamblan o producen bienes. Las decisiones sobre el papel, la ubicación, la capacidad y la flexibilidad de estas instalaciones impactan significativamente en el rendimiento global de la cadena.
- 2) **Inventario:** Este término abarca todos los materiales en diferentes etapas de producción, así como los productos terminados disponibles para la venta. La gestión eficiente del inventario es fundamental, ya que una política de inventario bien diseñada puede alterar drásticamente la eficiencia de la cadena de suministro.
- 3) **Transporte:** Este factor se refiere al movimiento de productos entre distintos puntos de la cadena de suministro. La selección de modos de transporte y rutas influye de manera notable en la capacidad de respuesta y la eficiencia, afectando tanto los costos como los plazos de entrega.
- 4) **Información:** Este elemento incluye datos y análisis relacionados con todas las facetas de la cadena de suministro, abarcando instalaciones, inventario, transporte, costos, precios y clientes. La gestión efectiva de la información permite a las organizaciones alinear la oferta con la demanda y optimizar los costos operativos.
- 5) **Abastecimiento:** Este aspecto implica la decisión sobre qué entidad realizará actividades específicas dentro de la cadena de suministro, tales como producción, almacenamiento y transporte. Las decisiones de abastecimiento afectan tanto la eficiencia como la capacidad de respuesta de la cadena.
- 6) **Precios:** Este factor determina el monto que una organización cobrará por los bienes y servicios que ofrece. La estrategia de precios tiene un impacto directo sobre la demanda y, en consecuencia, sobre el rendimiento de la cadena de suministro, influyendo en la rentabilidad y la satisfacción del cliente.

Es necesario reconocer que estos factores no operan de manera independiente; su interrelación determina el rendimiento global de la cadena de suministro. Un diseño y operación efectivos de la cadena de suministro consideran esta interacción y realizan los compromisos necesarios para alcanzar el nivel deseado de capacidad de respuesta al costo más bajo posible (Chopra & Meindl, 2016).

Ilustración 3 Marco de toma de decisiones en la cadena de suministro.

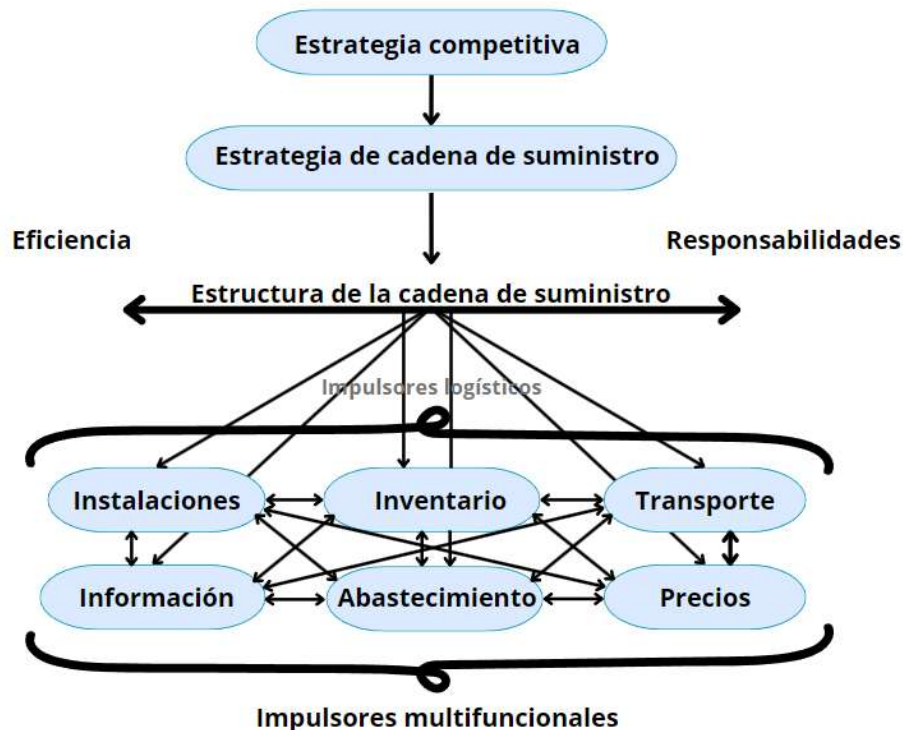

Fuente: Elaboración propia, basada en (Chopra & Meindl, 2016).

1.2 Planificación

La planificación se centra en definir qué se debe hacer, cómo y con qué recursos. Incluye distintos procesos clave:

- **Planificación y programación de la producción:** La planificación define a mediano-largo plazo qué se debe fabricar y en qué cantidades, considerando un escenario de capacidad infinita o con verificaciones básicas. En cambio, la programación se realiza a corto plazo, con mayor detalle, verificando la disponibilidad real de materiales, equipos y mano de obra antes de emitir órdenes de producción.
- **Planificación de la distribución:** Decide qué productos entregar, cuándo y en qué cantidad, a cada nivel de la cadena logística.
- **Planificación del servicio:** Busca equilibrar el nivel de servicio al cliente con los costos asociados, definiendo metas de servicio específicas para cada producto y almacén.

- **Previsión de la demanda:** Consiste en generar estimaciones de ventas considerando históricos y factores externos (como promociones o estacionalidad).
- **Diseño de la red de distribución:** A largo plazo, se analiza dónde ubicar fábricas o almacenes, buscando minimizar costos logísticos globales.

1.2.1 Ejecución logística

La ejecución pone en marcha lo planificado, con decisiones que se toman entre horas y semanas antes de la operación:

- **Gestión de pedidos:** Incluye captura, validación, y asignación de inventario.
- **Gestión de inventario:** Asegura que los niveles de stock coincidan con lo definido en la planificación, siguiendo la política de compras y parámetros logísticos.
- **Logística internacional:** Administra los aspectos operativos y documentales del comercio entre países.
- **Gestión del transporte:** Garantiza que los productos se muevan eficientemente, adaptándose a variaciones de demanda e incluyendo la generación dinámica de rutas.
- **Gestión de almacenes:** Asegura que los movimientos y operaciones dentro del almacén coincidan con lo planificado.

1.2.2 Previsión de la demanda

La previsión de la demanda es un componente esencial en la planificación de la cadena de suministro, ya que permite anticipar las necesidades futuras del mercado para tomar decisiones acertadas en producción, compras, inventario y distribución. Se trata de un proceso analítico que combina datos históricos con factores externos con el fin de estimar la demanda futura de productos o servicios.

Los directivos de una organización deben considerar constantemente este tipo de proyecciones para enfrentar con mayor preparación escenarios de incertidumbre, como fluctuaciones en la economía, modas cambiantes, acciones de la competencia o eventualidades como huelgas o problemas logísticos.

Para que estas proyecciones sean útiles, es indispensable conocer y aplicar los principios, técnicas y modelos de previsión más adecuados, reconociendo sus limitaciones y seleccionando la opción que mejor se adapte a la realidad y a los datos disponibles en la empresa.

1.2.2.1 Tipos de previsión

Una buena previsión parte del reconocimiento de que el futuro no es único ni completamente determinable, pero puede ser estimado, anticipado e incluso moldeado a partir de las decisiones del presente. En este sentido, se considera que toda previsión empresarial debe entenderse bajo tres características fundamentales:

- **Múltiple:** El futuro no es único ni completamente predecible, sino que puede presentarse en diversos escenarios alternativos. Por ello, una previsión eficaz no se limita a un solo resultado esperado, sino que considera múltiples posibilidades, a las que se les asignan probabilidades de ocurrencia.
- **Previsible:** Aunque el futuro no se puede conocer con certeza, es parcialmente anticipable a partir del análisis del pasado y del presente. Los patrones históricos de comportamiento de la demanda, la estacionalidad, y las tendencias de mercado permiten generar estimaciones razonables. En este sentido, prever no significa adivinar, sino inferir escenarios futuros con base en información objetiva y sistematizada.
- **Influenciable:** El futuro también es susceptible de ser moldeado por nuestras propias acciones. Las decisiones empresariales pueden cambiar el comportamiento del mercado. Esto significa que, al identificar distintos escenarios, la empresa no solo debe anticiparse, sino también actuar para promover la opción más favorable o mitigar riesgos.

Una previsión efectiva no depende únicamente del modelo estadístico utilizado, sino también de factores clave como:

- El conocimiento profundo del negocio por parte del responsable de la previsión.
- La etapa del ciclo de vida del producto.
- La información histórica de ventas, inventarios y comportamiento del mercado.
- Las analogías con otros productos o mercados.
- La disponibilidad de datos confiables y su correcta interpretación.
- La elección del modelo adecuado en función del horizonte temporal y la precisión requerida.

Aplicar herramientas estadísticas o software sofisticados no garantiza una buena previsión si no se cuenta con los conocimientos contextuales del negocio ni con información de calidad. La previsión es tanto un ejercicio técnico como estratégico, que requiere equilibrio entre el análisis de datos y la interpretación experta (Sabriá, 2004).

1.2.3 Planificación y programación de la producción

La planificación de la producción comprende el conjunto de actividades que permiten anticipar y organizar los recursos necesarios para fabricar los bienes o servicios que la empresa ha definido como parte de su estrategia. Su propósito es asegurar que los materiales, el personal y las capacidades operativas estén disponibles de manera oportuna, evitando tanto excesos como carencias que puedan afectar el cumplimiento de la demanda.

En los niveles más altos de planificación, no se trabaja con productos específicos, sino con familias de productos que comparten procesos, materias primas o recursos. Este enfoque permite una gestión más sencilla y estratégica en horizontes de mediano a largo plazo (6 a 18 meses).

Una vez establecido el plan agregado, se descompone progresivamente en programas más detallados y ejecutables, como el Plan Maestro de Producción.

El Plan Maestro de Producción (PMP) desglosa el plan agregado en cantidades específicas de productos a fabricar durante periodos definidos. Este plan se elabora considerando la capacidad real de producción, y es esencial para programar las actividades en los centros de trabajo.

Para validar la viabilidad de este plan, es necesario realizar un análisis de carga y capacidad, que compara la carga de trabajo estimada con los recursos disponibles en planta. Esto requiere información precisa sobre:

- Los productos y sus componentes.
- Los tiempos requeridos para cada operación.
- Las tasas de defectos.
- Las listas de materiales.
- El PMP propuesto.

Con estos datos, se calcula la demanda de capacidad por centro de trabajo, lo que permite anticipar cuellos de botella, redistribuir cargas o ajustar el plan. En caso de que la planificación inicial no sea viable, se deben hacer modificaciones hasta lograr un equilibrio entre la demanda y la capacidad.

Además, el proceso requiere definir periodos de congelamiento en el horizonte de planificación. Esto significa que las primeras semanas del plan no deben modificarse, ya que sobre ellas se construyen las siguientes fases y ajustes (Paredes Roldán, 2001).

1.3 Inventarios

Según las Normas de Información Financiera (NIF), el inventario es un activo circulante, es decir, una propiedad tangible que se guarda para vender, que está en proceso de producción para vender o que se usará en la producción. Esto incluye cosas como "trabajo en proceso", "materias primas" y "productos terminados". En los estados financieros, el inventario se muestra como un activo circulante, reflejando su valor monetario en el balance general.

Aunque las NIF consideran el inventario un activo porque puede generar ingresos, la gestión del inventario implica un costo. Por eso, manejar el inventario es interesante en el mundo de los negocios, ya que es un activo que a menudo parece un pasivo. Las diferentes formas de medir el inventario en la cadena de suministro son claves para evaluar la eficiencia y efectividad de dicha cadena.

Uno de los principales objetivos de la administración de la cadena de suministro es asegurar la eficiencia dentro y entre las empresas, a menudo lograda mediante la reducción del inventario. Aunque se reconoce la necesidad del inventario, se procura

mantenerlo al mínimo esencial. Esto ha dado lugar a estrategias como el inventario justo a tiempo, el inventario esbelto y la planeación, pronóstico y reabastecimiento colaborativos (PPRC).

El objetivo de estas estrategias es optimizar los inventarios y mantener baja la inversión en ellos, debido a los altos costos asociados, como el desembolso de efectivo, almacenamiento y administración. Estos costos motivan a los gerentes a mantener inventarios bajos para usar el dinero de manera más eficiente en otros aspectos del negocio. Además, el rendimiento sobre los activos se ve afectado por el inventario, ya que se considera un activo en el balance general.

Recientemente, la perspectiva del inventario ha cambiado, y ahora se ve desde el punto de vista de la administración de riesgos. Aunque las empresas intentan mantener inventarios bajos debido a los costos de mantenimiento, se ha incrementado el énfasis en los costos de no tener inventarios suficientes, como la falta de existencias y las interrupciones imprevistas en la cadena de suministro. Esto ha llevado a un mayor uso del inventario de seguridad como un medio para gestionar riesgos.

Las interrupciones en la cadena de suministro, a menudo causadas por la incertidumbre en la disponibilidad de información, los plazos de entrega de los proveedores y la ejecución de tareas son un problema que muchas empresas enfrentan invirtiendo en inventarios. Además, el inventario se utiliza para protegerse contra fluctuaciones monetarias y de precios, aprovechando descuentos por volumen y asegurando precios y tipos de cambio favorables. Esto ayuda a las empresas a evitar que los costos del inventario superen sus restricciones presupuestarias y de capital.

La administración efectiva del inventario implica encontrar un equilibrio: mantener inventarios suficientes para asegurar la producción continua y los flujos comerciales, mientras se minimiza la inversión para mantener un desempeño financiero sólido. Este equilibrio se conoce como nivel de inventario óptimo.

Lograr niveles óptimos de inventario no es sencillo y requiere diversos métodos analíticos y decisiones interconectadas para mantener flujos adecuados a lo largo de la cadena de suministro.

En la construcción del esquema de clasificación para la gestión de inventario, es crucial definir los procesos de reabastecimiento y las métricas de servicio de manera interconectada y establecer los diferentes tipos que existen. Los procesos de reabastecimiento iniciales son el proceso de cantidad fija del pedido en el punto fijo del pedido (Q,ROP, por sus siglas en inglés Fixed Order Point) y el proceso de intervalo de pedido fijo, pedido a nivel (T,OUL, por sus siglas en inglés Order Up To Level). En las medidas del nivel de servicio se comienza con el uso de la métrica del periodo de protección del inventario (PPIS, por sus siglas en inglés Protection Period In-Stock) y el índice de reabastecimiento a nivel de artículo (ILFR, por sus siglas en inglés Item-Level Fill Rate) (Waller & Esper, 2017).

1.3.1 Agotamiento de inventario

Tener inventario puede ser costoso, pero también lo es no tenerlo. En la administración del inventario, el servicio al cliente es crucial y la disponibilidad de productos en inventario puede afectar la probabilidad de satisfacer las necesidades del cliente. Cuando un artículo no está disponible, se incurre en costos reales por ventas perdidas, que van más allá del margen de utilidad del producto agotado.

Si una fábrica no tiene un producto específico, puede perder no solo el margen de utilidad de ese artículo, sino también las ventas de otros productos que el cliente planeaba comprar. Los datos de compra permiten a las empresas calcular la probabilidad de que los clientes abandonen la compra si no encuentran un artículo específico.

En algunos casos, la disponibilidad de productos puede afectar la fidelidad del cliente. Si una empresa no tiene un producto necesario repetidamente, los clientes pueden optar por comprar en la competencia de forma permanente.

A medida que surge más oferta de productos, los clientes pueden cambiar sus preferencias de compra según la disponibilidad del inventario. Algunos clientes pueden probar productos en otra empresa si no encuentran su marca preferida, lo que afecta la dinámica de la competencia en el mercado (Waller & Esper, 2017).

1.4 Rendimiento de ventas

El rendimiento de ventas se refiere a la eficacia con la que un equipo de ventas logra sus metas de ingresos asignadas. Por otro lado, la gestión del rendimiento de ventas implica obtener visibilidad y control sobre las acciones clave de una organización, como pronósticos, planificación, implementación, monitoreo y recompensa del desempeño.

La gestión del rendimiento de ventas es crucial para alinear estrategias de ventas y acciones, proporcionar visibilidad sobre los KPI y mejorar los pronósticos comerciales. Las expectativas de los clientes y las operaciones de ventas son cada vez más complejas, por lo que tener prácticas sólidas de gestión es esencial para lograr el éxito a largo plazo.

La gestión del rendimiento de ventas se compone de dos elementos principales: las partes y el proceso. Las partes incluyen la gestión de territorios, la gestión de cuotas y la compensación por incentivos, que permiten equilibrar territorios, establecer cuotas alineadas con los objetivos y crear sistemas de compensación precisos.

El proceso consta de cinco etapas cíclicas: planificación, gestión y monitoreo continuo, recompensa, análisis del rendimiento y pronóstico. Estas etapas se repiten para mejorar constantemente el desempeño de ventas.

La gestión del rendimiento de ventas ofrece una serie de beneficios en todos los niveles de una organización:

- Para las empresas, brinda una mayor visibilidad de las previsiones de ingresos, facilitando la planificación y el presupuesto.
- Para las organizaciones de ventas, proporciona una visión detallada del territorio, las cuotas y los incentivos, mejorando las posibilidades de éxito de los representantes y optimizando los recursos disponibles.
- Para los líderes de ventas, ofrece una vista en tiempo real del desempeño de sus equipos, permitiendo un mejor entrenamiento y apoyo, así como el establecimiento de objetivos realistas (Alleyne, 2023).

1.4.1 Estado de órdenes de venta

Dentro del sistema de gestión de pedidos de la organización se encuentran diferentes condiciones o estados en las órdenes de venta. Los más comunes son:

- Abierta: La orden de venta ha sido creada en el sistema, pero aún no se ha procesado ni confirmado.
- Confirmada: La orden de venta ha sido revisada y confirmada tanto por el cliente como por la empresa. Se espera que se complete según lo acordado.
- No confirmada: La orden de venta está en espera de confirmación, ya sea por parte del cliente o de la empresa. Puede estar pendiente de aprobación o de alguna acción adicional antes de que se pueda confirmar.
- Bloqueada: La orden de venta está temporalmente bloqueada debido a algún problema o restricción, como problemas de crédito del cliente, discrepancias en los precios o la disponibilidad de productos, entre otros.
- Atrasada: La orden de venta no se ha completado dentro del plazo esperado o programado. Puede deberse a retrasos en la producción, problemas de suministro, o cualquier otra razón que haya impedido su finalización o entrega a tiempo.
- Completada: La orden de venta se ha procesado con éxito y se ha entregado al cliente según lo acordado. Se considera como finalizada y cerrada en el sistema.

La gestión efectiva de los estados de las órdenes de venta es fundamental para garantizar una operación comercial fluida y eficiente (Hadjú, 2023).

1.4.2 Bloqueos de entrega en órdenes de venta

La colocación de bloqueos en las órdenes de venta en SAP tiene como objetivo controlar y gestionar el flujo de pedidos, asegurando que se cumplan ciertos criterios antes de que puedan ser procesados o modificados.

Los tipos de bloqueos que pueden aplicarse en las órdenes son los siguientes:

- **Bloqueos R (Bloqueos de comercio digital)**: Se utilizan para garantizar la revisión de los datos de la orden, como la verificación de información, solicitudes especiales y comentarios. Estos bloqueos se aplican automáticamente por el sistema según los parámetros establecidos por la empresa.

- **Bloqueos ZA (Bloqueos de aprobación):** Permiten crear flujos de trabajo para asegurar que la orden sea aprobada antes de su procesamiento. Al igual que los bloqueos R, se colocan automáticamente por el sistema de acuerdo con los parámetros predefinidos.
- **Bloqueos Y (Bloqueos de confirmación):** Se emplean para verificar las condiciones de seguridad una vez creada la orden, y para comprobar si hay información faltante o desalineada. Estos bloqueos se aplican manualmente al crear la orden o después de su liberación al sistema, pero antes de preparar la entrega al cliente.
- **Bloqueos ZF (Bloqueos de finanzas):** Se utilizan para asegurar la verificación financiera, como la confirmación de pagos iniciales o la liberación de crédito para los clientes. Estos bloqueos se aplican automáticamente en los datos maestros del cliente, o bien pueden ser colocados manualmente si las reglas de crédito establecidas no son claras (Bijelić, 2024).

1.5 Rendimiento de los suministros

El proceso de compras y aprovisionamiento se define como las actividades relacionadas con la obtención de productos o servicios para una unidad de producción o provisión de servicios (Fagerhaug, 1999). Paralelamente, el proceso de desarrollo de proveedores abarca los esfuerzos para cultivar relaciones con proveedores existentes y adquirir nuevos. El proceso de compras y suministros se encarga de recopilar las necesidades de otros procesos, adquirir las materias primas y componentes, y controlar los costos de compra para lograr economías de escala.

En el ámbito de compras y abastecimiento, la elección de proveedores ha evolucionado, expandiendo los criterios considerados. Anteriormente, el foco se centraba en los precios, descuidando aspectos como la calidad y la confiabilidad. Ahora, la evaluación de proveedores se adapta a los diversos contextos de la cadena de suministro (estratégico, táctico y operativo) y se basa en mediciones que abordan la eficiencia, el flujo, la integración, la respuesta y la satisfacción del cliente. Además, la gestión de proveedores implica analizar cómo las habilidades de los proveedores se alinean con las necesidades a largo plazo de la empresa, así como la relación de la organización con su grupo de proveedores (Franco, 2014).

La medición del desempeño en el proceso de aprovisionamiento es crucial para la efectividad y eficiencia de la cadena de suministro. La estructura de medición propuesta por Gunasekaran, Patel y McGaughey (2004) destaca la importancia que las empresas otorgan al tiempo de entrega de los proveedores, por encima del precio, lo que sugiere una mayor prioridad en las mediciones no financieras respecto a las financieras. Las mediciones incluyen las siguientes variables para cada nivel:

- Nivel estratégico: tiempo de entrega, calidad, iniciativas de ahorro de costos y comparación de precios de los proveedores con los del mercado.
- Nivel táctico: eficiencia en el ciclo de tiempo de la orden de compra, flujo de efectivo, calidad y flexibilidad en la capacidad de la empresa.

- Nivel operativo: representación técnica diaria, cumplimiento del cronograma, capacidad para evitar quejas y logro de entregas sin defectos.

La implementación de medidas de rendimiento en las cadenas de abastecimiento es primordial para maximizar el potencial de sus operaciones. El uso de técnicas de medición multicriterio permite considerar todas las variables y contribuye a una mayor efectividad en el proceso de compras y abastecimiento.

El proceso de medición es una herramienta de control, cuyo perfeccionamiento está ligado a las características específicas de la cadena de suministro, como su complejidad y longitud. Si hay una falta de alineación entre el nivel estratégico y el operativo no se garantiza la satisfacción total del cliente ya que la retroalimentación es inadecuada entre ambos niveles. Por esto, es importante definir adecuadamente la complejidad y longitud de la cadena. Por un lado, la complejidad esta influenciada por varios factores como: el número de relaciones con proveedores, el grado de diferenciación entre ellos, el tiempo de entrega, la confiabilidad, el alcance y tamaño del aprovisionamiento global. Por otro lado, la longitud de la cadena se refiere al número de eslabones o intermediarios que participan en el flujo de materiales, así como al número de parámetros que la cadena debe soportar durante su proceso. Los principales parámetros con los que se mide son: el tiempo de entrega, el costo de envío y la confiabilidad en términos de tiempo y calidad, los cuales están relacionados con las distancias geográficas entre los nodos, los modos de transporte seleccionados, así como, las regulaciones comerciales y legales aplicables al transporte de carga (Franco, 2014).

1.5.1 Distribución en la cadena de suministro

El papel de la distribución en la cadena de suministro es fundamental para mover y almacenar productos desde la etapa inicial con el proveedor hasta la final con el cliente. Abarca todas las etapas intermedias de la cadena, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto final al consumidor. La distribución impacta directamente en la rentabilidad de una empresa y en el valor percibido por el cliente.

El proceso de diseño de una red de distribución se divide en dos fases: la visualización de la estructura general de la cadena de suministro y la especificación de ubicaciones y capacidades en detalle. La elección de una red de distribución adecuada puede ayudar a alcanzar diversos objetivos de la cadena de suministro, desde reducir costos hasta aumentar la capacidad de respuesta. Tomar la decisión de distribuir directamente a grandes cadenas o utilizar distribuidores pueden influir en los costos y la eficiencia de la cadena de suministro, por lo que evaluar estas opciones es crucial para satisfacer las necesidades de las empresas y sus clientes.

El diseño de la red de distribución es crucial para satisfacer las necesidades del cliente y mantener la rentabilidad de la empresa. Se evalúa en función del valor proporcionado al cliente y el costo de satisfacer esas necesidades.

Los factores que son influenciados por la estructura de la red de distribución son:

- **Tiempo de respuesta:** tiempo que tarda un cliente en recibir un pedido.
- **Variedad de productos:** número de productos diferentes o configuraciones que ofrece la red de distribución.
- **Disponibilidad de productos:** probabilidad de tener un producto en stock cuando llega un pedido del cliente.
- **Experiencia del cliente:** facilidad con la que los clientes pueden realizar y recibir pedidos y hasta qué punto esta experiencia está personalizada.
- **Tiempo de llegada al mercado:** tiempo que se tarda en llevar un nuevo producto al mercado.
- **Visibilidad de pedidos:** tiempo que se tarda en llevar un nuevo producto al mercado.
- **Capacidad de devolución:** facilidad con la que un cliente puede devolver mercancía insatisfactoria y como se manejan dichas devoluciones.

El diseño de la red de distribución debe adaptarse a las necesidades y preferencias del cliente. Las empresas que atienden a clientes dispuestos a esperar tiempos de respuesta más largos pueden concentrarse en unas pocas ubicaciones con mayor capacidad. Por otro lado, aquellas que buscan clientes que valoran tiempos de respuesta cortos deben tener instalaciones cercanas y numerosas, aunque con capacidad limitada. Los cambios en el diseño de la red afectan los costos de inventario, transporte, instalaciones y manejo de información, lo que requiere una evaluación cuidadosa de los impulsores de la cadena de suministro. Los costos de inventario, transporte, instalaciones y manejo de información se ven afectados por los cambios en el diseño de la red, que deben considerarse junto con otros factores como abastecimiento y precios para optimizar la cadena de suministro.

A medida que aumenta el número de instalaciones en una cadena de suministro, aumenta el inventario requerido, lo cual puede incrementar los costos. Para reducir estos costos, las empresas buscan consolidar y limitar el número de instalaciones en su red de cadena de suministro.

La reducción del número de instalaciones puede disminuir los costos de distribución ya que permite a una empresa aprovechar las economías de escala. Cada empresa debe determinar el número óptimo de instalaciones que minimice estos costos.

Los componentes de servicio al cliente y costo son fundamentales para evaluar los diseños de red de distribución. No existe una red de distribución que sea superior en todas las dimensiones, por lo que es crucial que las fortalezas de la red de distribución estén alineadas con la estrategia de la empresa (Chopra & Meindl, 2016).

1.6 Satisfacción del cliente y tiempos de entrega

Para evaluar el nivel de servicio al cliente, se utilizan indicadores ampliamente reconocidos en el entorno empresarial. Estos permiten medir el grado en que la cadena de suministro cumple con las expectativas del cliente en términos de cantidad, calidad y oportunidad.

Algunos de ellos son los siguientes:

- **Cumplimiento de órdenes:** Este indicador mide el porcentaje de pedidos de cliente que se surten en el volumen solicitado, dentro del periodo de tiempo comprometido. Refleja la capacidad de la empresa para satisfacer la demanda tal como fue solicitada, sin modificaciones ni faltantes.
- **Precisión en la entrega:** Evalúa la proporción de productos entregados sin defectos, errores o discrepancias frente a lo solicitado. Un alto nivel de precisión implica que el cliente recibió exactamente lo que pidió, en las condiciones esperadas y sin devoluciones por fallas de calidad o errores de surtido.
- **Entregas a tiempo:** Se refiere al porcentaje de productos entregados en la fecha acordada. Este indicador refleja tanto la puntualidad en el despacho como la eficiencia en los procesos logísticos y de transporte.

De manera integrada, estos tres indicadores permiten construir un modelo para calcular el Índice de Servicio al Cliente, el cual se define como:

Índice de Servicio al Cliente

$$= (\% \text{ de órdenes completas}) \times (\% \text{ de productos correctos}) \times (\% \text{ de entregas a tiempo})$$

Este índice refleja la eficacia general de la cadena de suministro para cumplir con las expectativas del cliente. Un valor bajo en cualquiera de los componentes revela fallos en uno o más eslabones del sistema logístico.

Causas comunes de incumplimiento

- Fallos en el cumplimiento de órdenes debido a la falta de disponibilidad de materiales, fallas en el almacenamiento, retrasos en producción o falta de producto terminado.
- Errores en la precisión de entrega reflejan problemas como productos dañados, artículos equivocados, rechazo del cliente por no cumplir con especificaciones de calidad o problemas durante el transporte.
- Entregas fuera de tiempo suelen ser consecuencia de demoras en el despacho, problemas de transporte o gestión ineficiente en la distribución (Flores, 2004).

El principal propósito de la medición del rendimiento de entrega es centrarse en la experiencia del cliente desde que se recibe el pedido hasta que se entrega, considerando la última fecha de entrega solicitada por el cliente.

La Fecha de Entrega Solicitada por el Cliente (RDD, por sus siglas en inglés Required Delivery Date) es la fecha que refleja el requisito del cliente para la entrega de mercancías. Sirve como puente de comunicación entre el cliente y la organización, y es hacia la cual debe apuntar la cadena de suministro.

Según los estándares internos de la organización, para asegurar tener un buen rendimiento de entrega es necesario cumplir con los siguientes factores clave:

- Alinear los tiempos de entrega con los de los clientes.
- Reducir el número de bloqueos en los pedidos.
- Configurar correctamente los datos maestros de cada producto dentro del sistema de gestión.
- Mejorar las prácticas de gestión de pedidos.
- Planificar el inventario correcto.
- Tener alta precisión en el pronóstico de ventas.
- Fiabilidad en los tiempos de entrega de extremo a extremo (Hadjú, 2023).

1.6.1 Precisión del tiempo de entrega

El tiempo de entrega se define como el intervalo transcurrido desde el inicio hasta la conclusión de un proceso. Las empresas lo miden en diferentes áreas como la fabricación, la gestión de la cadena de suministro y la gestión de proyectos para identificar posibles ineficiencias. La reducción del tiempo de entrega mejora la productividad y los ingresos, mientras que los tiempos más prolongados pueden tener un impacto negativo en las ventas y los procesos de producción.

El tiempo de entrega es fundamental en la gestión de inventario y la cadena de suministro. Se puede dividir en preprocesamiento, procesamiento y postprocesamiento. Para calcularlo, se suman todos ellos. En una empresa manufacturera, se incluye el tiempo de adquisición, fabricación y envío, mientras que, en una minorista, se abarca la adquisición de productos finales y su envío.

El tiempo de entrega varía entre las fuentes de la cadena de suministro, lo que dificulta predecir cuándo esperar la entrega de los artículos y coordinar la producción. La programación del tiempo de entrega ayuda a recibir componentes juntos y reduce los costos. Algunos retrasos no pueden anticiparse, pero trabajar con proveedores confiables y mantener inventarios pueden mitigar problemas.

El tiempo de entrega corto y confiable es crucial para las empresas, ya que afecta tanto aspectos financieros como operativos, así como su relación con los clientes. Algunos ejemplos específicos de su importancia incluyen:

- Mejora de la satisfacción del cliente al recibir los productos en el día acordado y rápidamente.
- Reducción del riesgo de obsolescencia de productos.
- Disminución de los costos laborales al eliminar ineficiencias.

- Aumento de las órdenes al ofrecer tiempos de entrega confiables y cortos.
- Mejora en la eficiencia de asignación de capital al reducir el tiempo en que el capital está inmovilizado.

Para hacer confiables los tiempos de entrega, las empresas pueden eliminar procesos innecesarios, monitorear métodos de transporte, incentivar un mejor servicio, adquirir materiales de manera diferente, mantener un inventario más alto y promover el aprendizaje interno.

Existen tres tipos principales de tiempo de entrega: al cliente, de materiales y de producción, que pueden agregarse para formar un tiempo de entrega acumulado, útil para comprender el proceso de fabricación y distribución. El tiempo de entrega en una empresa está influenciado por una serie de factores que pueden dividirse en tres categorías principales: tiempo de adquisición, tiempo de fabricación y tiempo de envío.

- **Tiempo de adquisición**, relacionado con la obtención de materias primas para la producción. Factores como la falta de conocimiento sobre las necesidades de materiales, demoras en la solicitud de compras, falta de proveedores seleccionados y procesos de inspección prolongados pueden aumentar el tiempo de entrega.
- **Tiempo de fabricación**, se refiere a las actividades internas de la empresa. Factores como las ineficiencias en el diseño o ubicación de las plantas de procesamiento, suministro insuficiente de energía o servicios públicos, escasez de mano de obra calificada, problemas de transporte interno y regulaciones gubernamentales pueden contribuir a tiempos de entrega más largos.
- **Tiempo de envío**, se relaciona con la entrega del producto final al cliente. Factores como la elección de métodos de entrega lentos, condiciones climáticas adversas, falta de información precisa sobre remesas y problemas en la gestión de la cadena de suministro pueden retrasar aún más la entrega.

Es fundamental que las empresas identifiquen y aborden estos factores para reducir el tiempo de entrega y mejorar la eficiencia operativa. Tener tiempos de entrega confiables y precisos es crucial para mantener la satisfacción del cliente y garantizar un funcionamiento fluido de la cadena de suministro (Kenton, 2024).

1.6.2 Indicadores de tiempo de entrega estándar

El tiempo de entrega representa el número de días laborables necesarios para que un producto esté listo para su envío. En la empresa, este tiempo varía según la segmentación del producto, que actúa como un habilitador clave para su cálculo. Todos los materiales deben contar con una segmentación asignada en el registro maestro de materiales.

Es fundamental que la información sobre los tiempos de entrega sea precisa, confiable y accesible tanto para el personal interno como para los clientes. Además, debe actualizarse regularmente a nivel de material.

1.6.2.1 Tiempo de Entrega Objetivo (TLT, por sus siglas en inglés: Target Lead Time)

El TLT debe ser estable y competitivo, alineado con los estándares del mercado, y se define en función del equilibrio entre costo y servicio para maximizar la satisfacción del cliente. Se establece semestralmente y se mide en días laborables. Este tiempo considera el periodo desde la creación del pedido hasta la fecha estimada de salida, sin incluir el tiempo de transporte.

Entradas para establecer el TLT:

- Requisitos del mercado según la estrategia divisional.
- Categorías de Segmentación para productos terminados:
 - A: Materiales en existencia, TLT = 1 día.
 - B: Ensamblaje por pedido, TLT = 5 días.
 - C: Fabricación por pedido, ajustado según los servicios de la cadena de suministro.
 - D: Ingeniería por pedido, TLT = (en blanco).

Los productos nuevos deben asignarse a una segmentación que cumpla con los requisitos del mercado y un TLT alineado. Si la segmentación no está definida, se asignará la categoría D con un TLT en blanco hasta su actualización.

1.6.2.2 Tiempo de Entrega Actual (CLT, por sus siglas en inglés: Current Lead Time)

El CLT debe coincidir con el TLT bajo condiciones normales. Sin embargo, puede diferir temporalmente en caso de interrupciones significativas en la cadena de suministro, como fallas en maquinaria o problemas con proveedores.

El CLT se mide desde la creación del pedido hasta la emisión de mercancías, indicando cuándo el producto estará listo en la planta de producción. Este tiempo no incluye el tiempo de transporte y se calcula en días laborables.

Entradas para establecer el CLT:

- El CLT debe mantenerse actualizado para todas las categorías de segmentación.
- Los productos nuevos deben iniciar con una categoría D y un CLT definido, si es posible. Posteriormente, el proceso semestral de segmentación ajustará estos valores.

1.6.2.3 Tiempo de Transporte (TT, por sus siglas en inglés: Transit Time)

El Tiempo de Transporte representa el periodo acordado para trasladar bienes de un punto a otro. Este tiempo se mide desde el despacho hasta la llegada, y puede calcularse en días calendario o días laborables, dependiendo de la configuración de la ruta y los calendarios aplicables.

1.6.2.4 Tiempo de Entrega Requerido (RLT, por sus siglas en ingles Required Lead Time)

El Tiempo de Entrega Requerido es el tiempo necesario para completar el proceso de entrega desde la fecha de requerimiento hasta su ejecución. Este indicador es crucial para la planificación y gestión de inventarios, ya que garantiza la disponibilidad de productos en el momento en que se necesiten (Arana, 2023).

1.6.3 Impacto de los tiempos de entrega en la competitividad y satisfacción del cliente

El tiempo de entrega es un factor clave en los sectores comerciales y logísticos, ya que se refiere al intervalo entre cuando un cliente realiza un pedido y cuando lo recibe. Este aspecto es crucial tanto para la satisfacción del cliente como para la eficiencia operativa de las empresas. En un entorno en el que la rapidez de los servicios es cada vez más valorada, comprender y optimizar los tiempos de entrega se ha convertido en una prioridad para muchas organizaciones.

El tiempo de entrega se calcula sumando los tiempos de cada proceso involucrado, como el procesamiento del pedido, la preparación y el envío. Estos tiempos pueden variar dependiendo de la empresa, el tipo de producto y la ubicación del cliente, lo que hace que obtener mediciones precisas sea un desafío.

Los tiempos de entrega tienen un impacto directo en la satisfacción del cliente. Los pedidos entregados a tiempo mejoran la experiencia de compra y fomentan la lealtad del cliente, mientras que los retrasos pueden generar frustración y disminuir la confianza en la marca. Además, la comunicación sobre los tiempos de entrega juega un papel fundamental. Informar proactivamente a los clientes sobre el estado de sus pedidos y cualquier posible retraso puede mitigar la insatisfacción.

Si bien la rapidez en la entrega es un factor decisivo para muchos clientes, la satisfacción también depende de la calidad del producto y del servicio al cliente. Un enfoque integral que contemple estos aspectos es esencial para mantener relaciones duraderas con los clientes.

En mercados altamente competitivos, los tiempos de entrega se convierten en un diferenciador clave. Las empresas que logran ofrecer entregas rápidas y eficientes tienen más probabilidades de destacarse frente a sus competidores. Además, la capacidad de

adaptarse a las expectativas cambiantes de los clientes y a la demanda del mercado es crucial para mantener una posición ventajosa.

Finalmente, las empresas deben evaluar de manera constante sus tiempos de entrega y buscar oportunidades de mejora. Esto no solo les ayudará a mantenerse competitivas, sino que también contribuye a una mejor experiencia para el cliente (Arturo, 2024).

1.7 Metodologías de mejora continua

1.7.1 Mejora continua

La mejora continua, también conocida como Kaizen, es una palabra que proviene de dos ideogramas japoneses (kanjis): KAI, que significa "cambio", y ZEN, que significa "bueno". Combinados, resultan en la palabra "mejoramiento".

Para Masaaki Imai, quien acuñó el término, el Kaizen es el mejoramiento continuo que involucra a todos. El "New Shorter Oxford English Dictionary" lo define como una filosofía que busca el mejoramiento continuo de las prácticas de trabajo y la eficiencia del personal. El concepto Kaizen es una filosofía de vida en todos los ámbitos, ya que mejorar es parte de ella y se realiza de manera constante.

En 1997, los investigadores John Bessant y Sarah Caffyn desarrollaron el proyecto "Investigación sobre la Mejora Continua para generar Ventajas Competitivas" (CIRCA, por sus siglas en inglés: Continuous Improvement Research for Competitive Advantage), donde demostraron que las organizaciones que practican la mejora continua evolucionan por cinco niveles:

- Nivel 0: Sin actividad de mejora continua.
- Nivel 1: Sacar ideas a la luz.
- Nivel 2: Mejora continua estructurada y sistematizada.
- Nivel 3: Mejora continua vinculada a la estrategia.
- Nivel 4: Mejora e innovación continua autónoma.
- Nivel 5: Construcción de la organización que aprende.

Bessant y Caffyn definen la mejora continua como “un proceso planeado, sistemático y organizado de toda la organización que busca un cambio incremental de las prácticas existentes que redunde en el rendimiento de la compañía” (Súarez, 2007).

1.7.1.1 Características del Kaizen

El Kaizen abarca al menos cinco características que lo describen:

- **Administrar la organización con Kaizen:** Operar, medir y mantener los estándares establecidos.
- **Enfoque en los procesos, no en los resultados:** El trabajo es una serie de procesos interrelacionados, compuestos por actividades básicas que generan un

resultado o un producto final. Por lo tanto, se fomenta su medición y mejora para dar como resultado productos o servicios de calidad.

- **La calidad como prioridad:** Mejorar cada una de las dimensiones de la gestión de una empresa.
- **Hablar con datos:** Datos y hechos claros, expresados en cifras, eliminan las corazonadas y fortalecen una cultura de datos, objetividad y sistematización del trabajo.
- **El cliente como proceso siguiente:** Asegurar que cada paso en la cadena entregue su producto o servicio de manera que cumpla con las expectativas y necesidades del siguiente paso, garantizando así la calidad y eficiencia en todo el proceso (Súarez, 2007).

1.7.2 Ciclo PDCA

El ciclo PDCA, también denominado ciclo de Deming o ciclo de Shewhart, constituye una metodología propia de la manufactura esbelta que tuvo sus inicios en la década de 1930, en un contexto marcado por la pérdida de exclusividad en los productos y el surgimiento de estrategias de gestión de calidad orientadas a la competitividad en el mercado global. Según diversos autores, su creador original fue Walter A. Shewhart, destacado estadístico estadounidense; no obstante, William Edward Deming lo perfeccionó y promovió durante la década de 1950, consolidándolo como uno de los métodos más reconocidos y aplicados a nivel mundial. En sus comienzos, esta herramienta se empleó principalmente para el control de calidad en productos, pero su versatilidad permitió su evolución hacia un enfoque destinado a la mejora de procesos organizacionales. En la actualidad, el ciclo PDCA se caracteriza por su orientación hacia la mejora continua y se reconoce como un sistema lógico y estructurado para la optimización de actividades.

Por otra parte, diversos estudios destacan que el ciclo PDCA trasciende su definición como herramienta de manufactura esbelta, al posicionarse como una filosofía de mejora continua que se integra en la cultura organizacional de las empresas. Este enfoque promueve el aprendizaje continuo y la creación de conocimiento como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible de las organizaciones (Realyvásquez-Vargas, Arredondo, Carrillo, & Ravelo, 2018).

El ciclo PDCA se compone de cuatro etapas fundamentales que estructuran su enfoque de mejora continua:

1. **Planificar (Plan, P):** Esta etapa constituye el punto de partida, donde se identifica la oportunidad de mejora y se definen los objetivos que se desean alcanzar. Se lleva a cabo un análisis detallado para diagnosticar el problema, definir como se pretende solucionar y desarrollar un plan de acción para su implementación. Durante este proceso, se utilizan herramientas analíticas como el diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa, el mapeo de procesos y la lluvia de ideas, que facilitan la identificación y priorización de las áreas críticas a abordar.
2. **Hacer (Do, D):** En esta etapa, se implementan las acciones previstas en el plan, introduciendo cambios en los procesos con el propósito de eliminar las causas de las problemáticas identificadas. La ejecución se sustenta en metodologías y

herramientas como esquemas de acción, benchmarking, diagramas de flujo y hojas de verificación, que garantizan un control estructurado de las actividades realizadas.

2. **Verificar (Check, C):** El enfoque de esta fase radica en evaluar la efectividad de las soluciones implementadas. Se recopilan y analizan datos para comparar los resultados obtenidos con los objetivos establecidos en la planificación. Herramientas como hojas de control, gráficos de control e índices de capacidad del proceso son utilizadas para medir el impacto y determinar si las acciones correctivas han logrado los resultados esperados.
3. **Actuar (Act, A):** La última etapa se orienta hacia la consolidación y estandarización de las soluciones que han demostrado ser efectivas. Estas se integran en los procesos organizacionales como prácticas normativas y se establece un sistema de monitoreo continuo para garantizar la sostenibilidad de las mejoras alcanzadas.

El ciclo PDCA se caracteriza por ser un proceso iterativo y dinámico que no tiene un punto final. El conocimiento generado en la etapa de actuación se utiliza como insumo para nuevos ciclos de mejora, fomentando así un aprendizaje organizacional continuo y un desarrollo progresivo de los sistemas y procesos (Jagusiak-Kocik, 2017).

1.7.3 Análisis de causa raíz

El Análisis de Causa Raíz (ACR) es una técnica estructurada utilizada para identificar las causas fundamentales de los incidentes, con el fin de prevenir su recurrencia mediante cambios en los procesos y sistemas involucrados. A diferencia de otros enfoques que se centran en los errores inmediatos, el ACR busca comprender los fallos del sistema que contribuyen a estos incidentes, analizando factores humanos, organizacionales y de proceso.

Metodología del ACR:

1. Identificación del incidente: Se deben determinar qué incidentes son relevantes para la investigación, tomando en cuenta su severidad, el potencial de aprendizaje y los recursos disponibles.
2. Recopilación de información: Es fundamental obtener toda la documentación relevante e información de diversas fuentes. Este paso incluye entrevistas y la recopilación de datos de procesos y sistemas involucrados.
3. Análisis de causas subyacentes: Una vez recopilada la información, se debe identificar y analizar las causas profundas, utilizando herramientas como diagramas causa-efecto. Esto ayuda a establecer conexiones entre los factores que contribuyen al incidente.
4. Estudio de barreras preventivas: Es necesario identificar barreras dentro del sistema que puedan reducir la posibilidad de que se repita el incidente, sean de tipo físico, organizacional o administrativo.

5. Desarrollo de soluciones y plan de acción: A partir del análisis, se debe crear un plan de acción para modificar los procesos y sistemas que permitieron el incidente, y asignar responsabilidades para implementar los cambios.
6. Informe final: El análisis concluye con la creación de un informe que resuma los hallazgos, las causas identificadas y las acciones correctivas propuestas, asegurando que sea claro y accesible.

El éxito del ACR depende de una aplicación rigurosa y del compromiso de los profesionales involucrados. Es esencial que el análisis sea completo, consistente y basado en evidencia, con un equipo multidisciplinario que garantice una visión objetiva del incidente (Ruiz, González, & Alcalde, 2005).

1.7.4 Principio 80/20

El principio 80/20 establece que una pequeña proporción de causas, esfuerzos o contribuciones genera la mayoría de los resultados o beneficios. Por ejemplo, se dice que el 80% de los logros en el trabajo proviene apenas del 20% del tiempo empleado, lo que sugiere que gran parte del esfuerzo restante tiene un impacto menor. En esencia, este principio revela un desequilibrio natural entre causas y efectos, mostrando que la mayoría de los resultados suele concentrarse en pocas acciones clave.

Este patrón fue identificado por el economista italiano Vilfredo Pareto en 1897, al analizar la distribución de la riqueza en Inglaterra, donde observó que una minoría controlaba la mayor parte de los recursos. Además, Pareto descubrió que esta desigualdad seguía patrones matemáticos constantes y se repetía en diferentes países y contextos.

Aunque Pareto reconoció la importancia de su hallazgo, no logró explicarlo claramente, y el principio permaneció en segundo plano durante años. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando volvió a ganar relevancia gracias a dos figuras clave:

- El profesor George K. Zipf, quien formuló el principio del mínimo esfuerzo, mostrando que los recursos tienden a organizarse para reducir el trabajo necesario, siguiendo también un patrón 20-80.
- Y Joseph Moses Juran, pionero de la gestión de calidad, quien aplicó el principio al ámbito industrial bajo el concepto de “los pocos vitales”, enfocándose en eliminar las principales fallas para mejorar la calidad de los productos.

La importancia del principio 80/20 radica en que desafía la idea común de que todas las causas y factores tienen el mismo peso. Por el contrario, al analizar cualquier actividad o proceso, suele revelarse un desequilibrio mayor de lo esperado, donde pocas acciones generan la mayor parte de los resultados. Comprender esta relación permite enfocar esfuerzos de manera más estratégica para obtener mejores resultados (Koch, 2009).

1.7.5 La Técnica de los Cinco Porqués

Esta técnica consiste en abordar un problema comenzando por el resultado visible y cuestionando sus causas sucesivamente mediante la pregunta “¿por qué?” al menos cinco veces. Se trata de una herramienta sencilla pero poderosa para llegar al origen de los problemas, promoviendo el análisis profundo mediante la indagación continua. Aunque su aplicación puede parecer simple, su efectividad depende de una mentalidad enfocada en la resolución estructurada de problemas. Si no se aplica con intención y rigor, la técnica puede convertirse en un ejercicio superficial sin resultados reales.

Para utilizarla de forma efectiva, es fundamental considerar tres elementos clave:

1. Formular una descripción clara y precisa del problema.
2. Responder con total honestidad y objetividad cada una de las preguntas.
3. Tener la firme disposición de llegar hasta la causa raíz y tomar acciones correctivas.

Esta metodología fue desarrollada por Sakichi Toyoda para Toyota Industries Corporation, y ha sido ampliamente adoptada en sistemas de mejora continua.

La aplicación colaborativa de esta técnica mejora significativamente su efectividad. A continuación, se describen los cinco pasos básicos para implementarla:

1. **Definir el problema con el equipo:** Reunir al equipo involucrado para consensuar una formulación clara del problema. En esta fase también se determina si es necesario integrar a otros participantes con conocimiento relevante.
2. **Hacer la primera pregunta “¿por qué?”:** Preguntar por qué ocurre el problema. Es probable que surjan varias respuestas iniciales razonables. Todas deben anotarse de forma visible (en rotafolios, pizarras o notas adhesivas).
3. **Repetir la pregunta “¿por qué?” cuatro veces más:** A partir de cada respuesta obtenida, volver a preguntar “¿por qué?” y registrar las nuevas respuestas cerca de su respuesta anterior, creando una especie de árbol de causas. Si la causa raíz no se encuentra en cinco niveles, se puede seguir preguntando hasta que ya no se obtenga información útil.
4. **Identificar la causa raíz:** Revisar todas las respuestas finales buscando patrones o causas de tipo sistémico. En equipo, discutir y acordar cuál parece ser la causa fundamental del problema. Esta etapa debe cerrar con una revisión crítica de los resultados, validando la lógica del análisis con otras personas si es necesario.
5. **Diseñar acciones correctivas:** Una vez identificada la causa raíz, se deben proponer acciones para eliminarla. Aunque otras personas pueden encargarse de ejecutar estas acciones, el equipo que realizó el análisis debe participar en la planificación, ya que sus aportes enriquecen la solución final (Serrat, 2014).

1.7.6 Gestión por indicadores

¿Qué son los KPIs?

Los Indicadores Clave de Desempeño que por sus siglas en ingles son conocidos como KPIs (Key Performance Indicator) son herramientas esenciales para medir el rendimiento organizacional y se centran en los aspectos más críticos para el éxito actual y futuro de una organización. Estos indicadores deben ser no financieros, medidos con frecuencia (preferentemente de manera diaria o semanal) y estar directamente relacionados con los objetivos estratégicos de la empresa. A través de su monitoreo constante, los KPIs permiten identificar de manera temprana las desviaciones en el desempeño y aplicar acciones correctivas de forma ágil y eficiente.

Una característica esencial de los KPIs es su vínculo con los factores críticos de éxito que por sus siglas en ingles son conocidos como CSF (Critical Success Factors) de la organización, los cuales son determinantes para su éxito o fracaso. Los KPIs, además de ser métricas de resultados, deben guiar las acciones dentro de la empresa y fomentar la mejora continua. Estos indicadores no solo permiten observar el desempeño pasado, sino que influyen en las decisiones futuras y facilitan la implementación de ajustes inmediatos.

Los KPIs también deben estar vinculados a la responsabilidad de individuos o equipos específicos dentro de la organización, lo que permite que las decisiones y las acciones sean tomadas a todos los niveles. De esta manera, la mejora del desempeño es una responsabilidad compartida. Un KPI bien diseñado tiene el poder de influir positivamente en otros indicadores de desempeño dentro de la organización, ayudando a mejorar de forma integral el rendimiento y la eficiencia (Parmenter, 2007).

1.8 Herramientas y Tecnologías para la Optimización de Entregas

1.8.1 SAP BW/4HANA

SAP BW/4HANA es una solución integral de almacenamiento de datos construida sobre SAP HANA. Como la capa de almacenamiento de datos local de la Plataforma Tecnológica Empresarial de SAP, permite consolidar datos en toda la empresa, proporcionando una vista consistente y unificada de sus datos. Está diseñado para ayudar a las empresas a mantener y mejorar su ventaja competitiva optimizando procesos y permitiendo reacciones rápidas y alineadas con el mercado. Proporciona herramientas para integrar, transformar y consolidar información empresarial de aplicaciones SAP y fuentes externas, ofreciendo una infraestructura de alto rendimiento para la evaluación e interpretación de datos. Esto ayuda a los responsables de la toma de decisiones a tomar decisiones informadas e identificar acciones específicas.

Características Clave:

- Despliegue en la Nube y Local: Opciones de despliegue flexibles para adaptarse a las necesidades de su negocio.

- Modelado y Administración Simplificados: Procesos optimizados para una gestión de datos más sencilla.
- Integración con Aplicaciones SAP y de Terceros: Integración sin problemas para aprovechar datos de diversas fuentes.
- Experiencia de Usuario Intuitiva: Interfaz fácil de usar para una mayor productividad.

Beneficios:

- Información en Tiempo Real: Obtenga información en tiempo real para optimizar procesos y apoyar innovaciones.
- Utilización Integral de Datos: Aproveche al máximo los datos de aplicaciones SAP, soluciones de terceros y datos no estructurados (SAP, 2024).

1.8.2 Informe de SAP BW - COTTR

El informe de SAP BW - COTTR evalúa el rendimiento de entrega de extremo a extremo en relación con las fechas solicitadas por los clientes, identificando áreas de mejora para la empresa.

Alcance:

- Pedidos Rastreados: Pedidos de ventas externos.
- Medición: Desde la recepción del pedido hasta la llegada de los bienes al cliente.
- Inclusiones: Líneas de pedidos estándar con estados de entrega según su segmentación en el mercado (A, B, C, D).
- Exclusiones: Materiales de embalaje, ciertos tipos de pedidos de ventas, líneas rechazadas y pedidos internos.

Reglas Generales:

- Fecha de Entrega Solicitada que por sus siglas en ingles es conocida como RDD (Required Delivery Date): Capturada en el encabezado del pedido y ajustada a nivel de línea.
- Congelación de Datos: Los datos se congelan y no actualizan los cambios si se realizan después de la fecha de entrega solicitada.

Filtros y Agrupaciones:

El informe COTTR permite agrupar y filtrar los datos según varios criterios para proporcionar información detallada y específica. Algunos ejemplos de filtros y agrupaciones incluyen:

- Por Cliente: Agrupar los datos por cliente para analizar el rendimiento de entrega específico para cada uno.
- Por Producto: Filtrar y agrupar por tipo de producto o número de material para identificar tendencias y problemas específicos de productos.
- Por Fecha: Agrupar por períodos de tiempo (mensual, trimestral, anual) para observar el rendimiento a lo largo del tiempo.
- Por Planta de Entrega: Filtrar por la planta de entrega para evaluar el rendimiento de diferentes ubicaciones de producción.
- Por Estado del Pedido: Agrupar por estado del pedido (A, B, C) para analizar el progreso y los cuellos de botella en el procesamiento de pedidos.
- Por Método de Envío: Filtrar por métodos de envío (por ejemplo, terrestre, aéreo, marítimo) para evaluar el impacto de los diferentes métodos en el tiempo de entrega (Masao, 2022).

Aplicación de filtros y enfoque del análisis en productos relevantes:

Después de descargar el reporte COTTR desde BW SAP, se aplican filtros condicionales para delimitar la información relevante. Estos filtros permiten centrar el análisis en variables específicas, como tipos de pedidos, fechas de entrega o estados particulares. Al depurar los datos, se evita trabajar con información irrelevante que podría distorsionar los resultados, garantizando un análisis más eficiente. Posteriormente, el enfoque se dirige a los productos clave, en este caso, dosificadoras y accesorios. Al concentrarse en estos productos, se busca identificar patrones específicos de incumplimiento o mejora en su proceso de entrega. Esta focalización asegura que los hallazgos obtenidos sean accionables y estén alineados con los objetivos de la investigación, permitiendo elaborar propuestas específicas para resolver los problemas detectados en la entrega de dichos productos.

1.8.3 Transacción SAP Tcode VA03 - Visualizar pedidos de venta

SAP ofrece soluciones de software para empresas de todos los tamaños e industrias, ayudándolas a gestionar sus negocios de manera rentable, adaptarse continuamente y crecer de manera sostenible. Sus aplicaciones estándar, soluciones por industria, plataformas y tecnologías permiten mapear y diseñar todos los procesos de negocio, desde la compra de materias primas hasta la producción y la satisfacción del cliente (SAP, 2024).

Dentro del módulo de Ventas y Distribución (SD) se encuentra la transacción VA03, que se utiliza para visualizar pedidos de ventas existentes sin permitir su modificación, garantizando así la integridad de los datos. Aunque esta transacción no presenta riesgos de alteración de la información, es importante considerar la confidencialidad de los datos visualizados. No todos los usuarios tienen acceso a la transacción VA03 en SAP; este acceso se controla mediante roles y perfiles de seguridad para asegurar que solo las personas autorizadas puedan consultar la información de los pedidos de ventas.

VA03 es esencial en el proceso de ventas y distribución, ya que proporciona una vista completa y detallada de los pedidos de ventas, incluyendo los cambios históricos realizados en toda la orden. Esto permite a los usuarios revisar la información del pedido, verificar datos históricos y responder de manera efectiva a las consultas de los clientes.

1.8.3.1 Funciones de VA03:

- **Visualización de Datos Generales:** Permite ver información detallada del pedido, como la organización de ventas, el canal de distribución, la división y el grupo de ventas.
- **Historial de Cambios:** Proporciona un registro completo de todas las modificaciones realizadas en el pedido, lo cual es crucial para auditorías y seguimiento.
- **Consultas Específicas:** Los usuarios pueden buscar pedidos utilizando diversos criterios, como el número de contrato, el nombre del cliente o el número de pedido físico.
- **Seguridad y Acceso:** El acceso a VA03 está controlado mediante roles y perfiles de seguridad, garantizando que solo el personal autorizado pueda visualizar la información de los pedidos.
- **Integración con Otras Aplicaciones:** VA03 se integra con otras aplicaciones de SAP, permitiendo una gestión más eficiente de los pedidos y facilitando el acceso a información relacionada (CVOSOFT IT ACADEMY, 2024).

2. Aplicación del ciclo PDCA como método para la mejora de indicadores en la cadena de suministro.

2.1 Nivel de la investigación

La presente investigación es de carácter explicativo y correlacional. Su objetivo principal es analizar y explicar las causas raíz del bajo desempeño en el indicador de entregas a tiempo, identificando los factores que influyen en este. Asimismo, busca establecer relaciones entre las variables involucradas en el proceso de entregas, priorizando aquellas que tienen un mayor impacto en el desempeño del indicador.

2.2 Diseño de investigación

El diseño de esta investigación es no experimental y transversal. Se clasifica como no experimental porque no se manipulan las variables objeto del estudio, en su lugar se trabaja con datos ya existentes recopilados de los sistemas de gestión de la empresa. De este modo, el análisis se realiza a partir de la observación de los fenómenos tal como ocurrieron en su contexto real sin intervención directa del investigador. Por otro lado, es un estudio de corte transversal, ya que se centra en el análisis de la información correspondiente a un período específico, lo que permite describir y examinar la situación en un momento determinado. Esta estructura facilita identificar patrones y características presentes en el desempeño logístico durante el período seleccionado.

2.3 Población y muestra

2.3.1 Población

La población de esta investigación incluye los pedidos de dosificadoras y accesorios clasificados como segmentación A, que fueron entregados fuera de tiempo durante el primer semestre de 2024 en la división industrial de Norteamérica.

Ilustración 4 Población del estudio.



Fuente: Elaboración propia (2024).

2.3.2 Tipo de muestreo

Se utiliza un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que el análisis se enfoca en los datos disponibles y accesibles de los productos específicos bajo la gestión del investigador durante el periodo de estudio. Este enfoque permite trabajar con información reciente, relevante y procesable, obtenida de los sistemas internos de la empresa (SAP BW).

2.3.3 Justificación del muestreo

El muestreo por conveniencia se justifica por los siguientes motivos:

- **Acceso a los datos:** La información seleccionada corresponde a los productos bajo la gestión directa del investigador, lo que garantiza la calidad y disponibilidad de los datos necesarios.
- **Representatividad de los problemas:** Aunque la investigación se centra en dosificadoras y accesorios, el problema del bajo desempeño en las entregas es transversal a todos los productos de la empresa. Por lo tanto, analizar este subconjunto permite identificar patrones y tendencias relevantes para el resto de la población.
- **Restricciones de tiempo y recursos:** El enfoque en productos específicos permite optimizar el análisis en función del tiempo disponible para la investigación y las herramientas utilizadas, como Excel y SAP BW.
- **Relevancia para la toma de decisiones:** Los resultados obtenidos serán directamente aplicables a la mejora del desempeño en las entregas de los productos seleccionados, lo que puede servir como modelo para extender la metodología a otros productos en el futuro.


2.4 Técnicas e instrumentos para recolección de datos

Para la recolección de datos, se utilizaron dos técnicas principales: la consulta de bases de datos y la revisión documental. La consulta se efectuó extrayendo información histórica de los sistemas internos de la empresa, específicamente los registros de órdenes de cliente generados en BW SAP. La revisión documental consistió en el análisis de documentos y registros existentes para identificar y clasificar las causas de los retrasos en las entregas. Los reportes descargados de SAP y bases de datos organizadas en Excel se emplearon como instrumentos para el procesamiento y análisis de la información.

2.4.1 Metodología PDCA

La metodología empleada en este estudio se basa en el ciclo PDCA, un modelo reconocido por su enfoque estructurado en la mejora continua. A continuación, se presenta el diagrama que resume las fases a seguir y las actividades clave en cada etapa del proceso.

Ilustración 5 Diagrama de Fases Basado en el Ciclo PDCA.

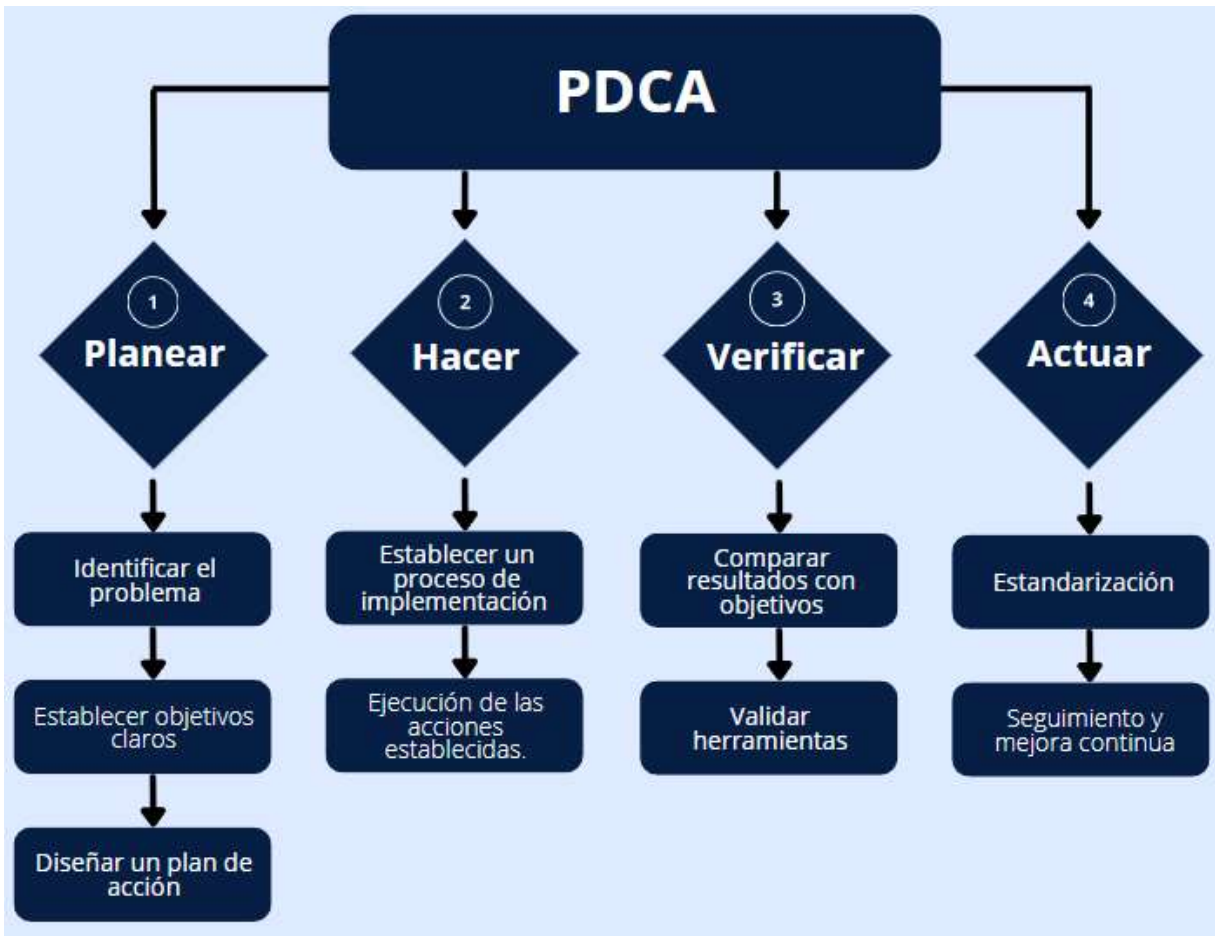

Fuente: Elaboración propia (2024).

2.4.2 Etapa 1: Planear


Siguiendo la metodología PDCA, la primera fase de la investigación corresponde a la planificación, donde se identificará la causa raíz del problema, se establecerán los objetivos y se diseñará un plan de acción para la recopilación y análisis de datos (Jagusiak-Kocik, 2017).

2.4.2.1 Identificación del problema:

El primer paso consiste en identificar la causa raíz del problema para establecer una base sólida que permita la implementación de mejoras efectivas. Para ello, se utilizará la técnica de los 5 porqués, la cual permitirá analizar de manera estructurada las razones detrás del bajo desempeño en las entregas y llegar a la causa raíz.

Este análisis se realizará mediante la aplicación de preguntas sucesivas que profundicen en los motivos del problema identificado, asegurando que cada respuesta conduzca a

una nueva pregunta hasta llegar a la causa de origen. La información obtenida se documentará en la siguiente plantilla:

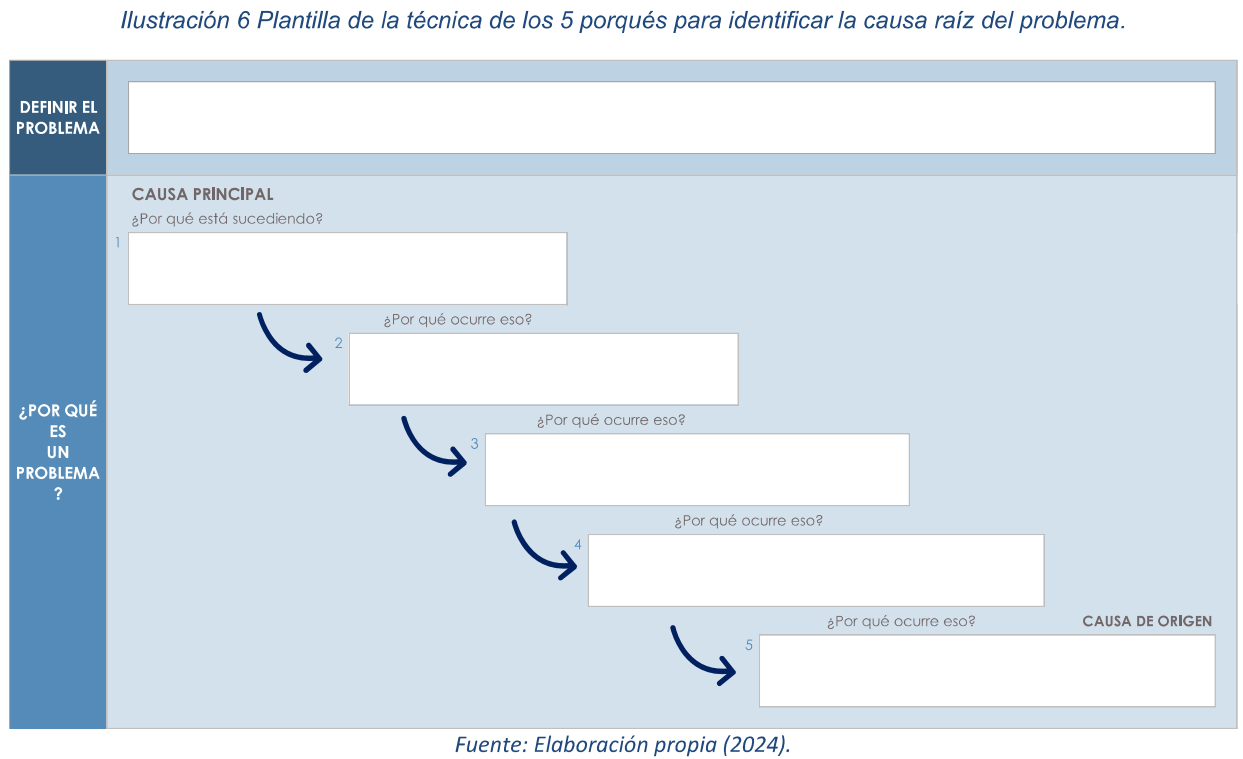

2.4.2.2 Definición de objetivos claros:

Una vez establecida la causa raíz, se procederá a la definición de objetivos. Para ello, se utilizará una tabla que permitirá plasmar de manera clara el problema detectado, el aspecto que se busca mejora y los objetivos específicos a alcanzar y el cómo se van a medir. Este instrumento facilitara la alineación del plan de acción con los resultados esperados.

Ilustración 7 Plantilla para definición de objetivos

Problema detectado	¿Cómo se busca solucionar?	Objetivo específico	¿Cómo se va a medir?

Fuente: Elaboración propia (2024)

2.4.2.3 Diseño del plan de acción:

Finalmente, se diseñará un plan de acción para abordar la causa raíz identificada. Para su representación visual y gestión efectiva del tiempo, se utilizará un diagrama de Gantt, el cual permitirá organizar las actividades en una línea temporal, facilitando el seguimiento del progreso y cumplimiento de las tareas establecidas.

Ilustración 8 Plantilla de Diagrama de Gantt para diseñar el plan de acción.

TÍTULO DEL PROYECTO

Responsable del proyecto

	Mes			Mes			Mes			Mes			Mes			Mes			Mes			Mes						
ACTIVIDAD	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem
Título de la fase 1																												
Tarea 1																												
Tarea 2																												
Tarea 3																												
Título de la fase 2																												
Tarea 1																												
Tarea 2																												
Tarea 3																												
Título de la fase 3																												
Tarea 1																												
Tarea 2																												
Tarea 3																												
Título de la fase 4																												
Tarea 1																												
Tarea 2																												
Tarea 3																												

Fuente: Elaboración propia (2024).

Esta planificación asegurará que las acciones a implementar en las siguientes fases estén basadas en un diagnóstico preciso, con objetivos claros y tiempos bien definidos, garantizando así una ejecución estructurada y eficiente del proyecto.


2.4.3 Etapa 2: Hacer

En esta fase se implementarán las acciones definidas en el plan de acción con el objetivo de abordar y eliminar las causas raíz de los problemas identificados (Jagusiak-Kocik, 2017).

2.4.3.1 Establecimiento del proceso de implementación

Para documentar y estructurar la ejecución de las acciones, se elaborará un diagrama de flujo que represente visualmente los pasos a seguir para cumplir el plan de acción. Esta herramienta permitirá una comprensión clara del proceso y servirá como guía para su implementación.

Ilustración 9 Plantilla de diagrama de flujo para representar los pasos a seguir en el proyecto.

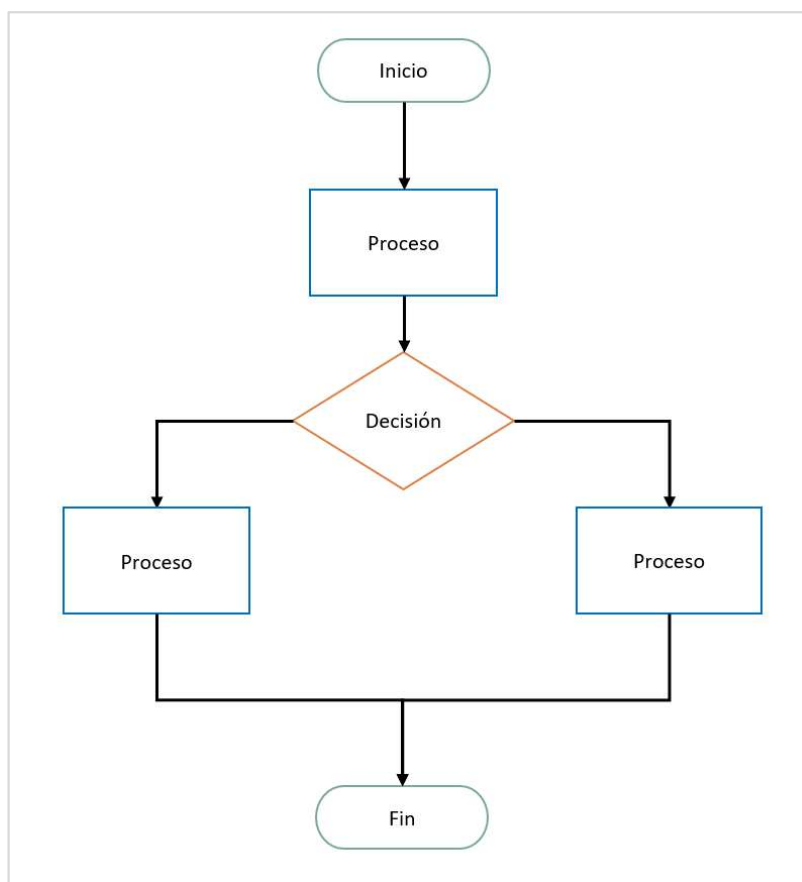

Fuente: Elaboración propia (2024).

2.4.3.2 Ejecución de acciones conforme al diagrama de flujo

Una vez definidos los procesos en el diagrama de flujo, se procederá con la ejecución de cada uno de ellos. Para ello, se realizará una descripción detallada de cada actividad.

2.4.4 Etapa 3: Verificar

En esta etapa se recopilarán y analizarán los datos obtenidos tras la implementación del plan de acción, para comparar los resultados obtenidos con los objetivos establecidos en la fase de planeación (Jagusiak-Kocik, 2017).

2.4.4.1 Verificación mediante tabla comparativa:

Para llevar a cabo esta verificación, se elaborará una tabla que incluirá los siguientes elementos:

- **Objetivo planteado:** La meta establecida en la etapa de planificación.
- **Resultado obtenido:** Los datos generados a partir de la implementación de las acciones correctivas.
- **Estatus de cumplimiento:** Un indicador visual (casilla de verificación) que permitirá identificar si el objetivo fue alcanzado o si requiere ajustes adicionales.

Ilustración 10 Plantilla de tabla de comparación de objetivos VS resultados.

Objetivo planteado	Resultado obtenido	Estatus de cumplimiento
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐

Fuente: Elaboración propia (2024).

2.4.4.2 Análisis de cumplimiento

A partir de esta verificación, se determinará si las acciones implementadas lograron mejorar el desempeño del indicador y en qué medida se cumplieron los objetivos establecidos.

2.4.5 Etapa 4: Actuar

La última etapa se orienta hacia la consolidación y estandarización de las soluciones que han demostrado ser efectivas. Estas se integran en los procesos organizacionales como prácticas normativas y se establece un sistema de monitoreo continuo para garantizar la sostenibilidad de las mejoras alcanzadas (Jagusiak-Kocik, 2017). Para ello, se implementarán estrategias de capacitación, monitoreo y evaluación, con el fin de fomentar la mejora continua.

2.4.5.1 Estandarización mediante capacitación

Para garantizar que la herramienta desarrollada sea utilizada de manera eficiente y que se puedan interpretar los resultados correctamente se llevará a cabo una estrategia de capacitación dirigida a los usuarios clave. Como parte de esta metodología, se utilizará una lista de capacitación, la cual permitirá documentar que colaboradores han recibido la formación, asegurando la correcta difusión del conocimiento.

Ilustración 11 Plantilla de plan de capacitación de personal.

PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL

Tema:

Fecha:

No.	Nombre	Apellido	Departamento	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				


Dictado por:

Fuente: Elaboración propia (2024).

2.4.5.2 Monitoreo y evaluación

Con el objetivo de medir la evolución del indicador y verificar la efectividad de las acciones implementadas, se utilizará una gráfica de tendencia, la cual permitirá visualizar el comportamiento del indicador de entregas a lo largo del tiempo, identificando patrones de mejora o retroceso.

Ilustración 12 Plantilla de gráfica de tendencia para visualizar el comportamiento del indicador.

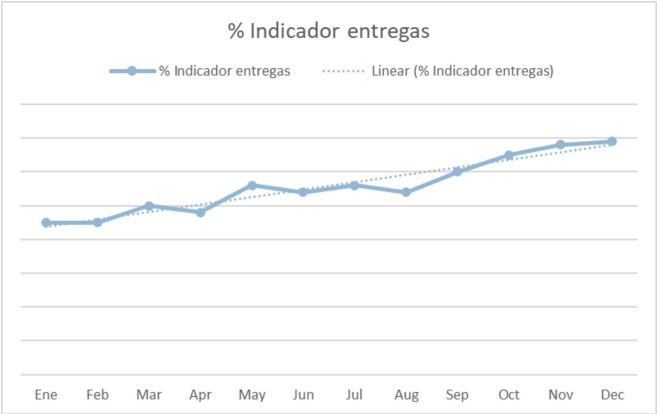

Fuente: Elaboración propia (2024).

2.4.5.3 Estrategia de mejora continua

Para garantizar que las mejoras se mantengan y evolucionen conforme a las necesidades del proceso, se establecerá un método de seguimiento estructurado. Se utilizará una tabla de seguimiento de mejoras, que será revisada en cada junta mensual. Esta tabla permitirá registrar y evaluar las propuestas de optimización en el uso de la herramienta, documentando los cambios implementados y sus efectos en el proceso.

Ilustración 13 Plantilla para registro de propuestas de mejora.

REGISTRO DE PROPUESTAS DE MEJORA					
No.	Fecha	Empleado	Propuesta	Plan de acción	Estado
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Fuente: Elaboración propia (2024).

Este enfoque permitirá realizar revisiones periódicas asegurando que la herramienta continúe evolucionando de manera alineada con los objetivos de mejora y brindando una estructura formal para la toma de decisiones.

3. Diseño e implementación del sistema de mejora propuesto.


3.1 Etapa 1: Planear

En esta fase, se llevó a cabo la identificación del problema, la definición de los objetivos y el diseño del plan de acción.

3.1.1 Identificación del problema:

Como primer paso se completó la plantilla de los 5 porqués con el objetivo de identificar la causa raíz del bajo desempeño en las entregas.

Ilustración 14 Aplicación de la técnica de los 5 porqués con el resultado del análisis.

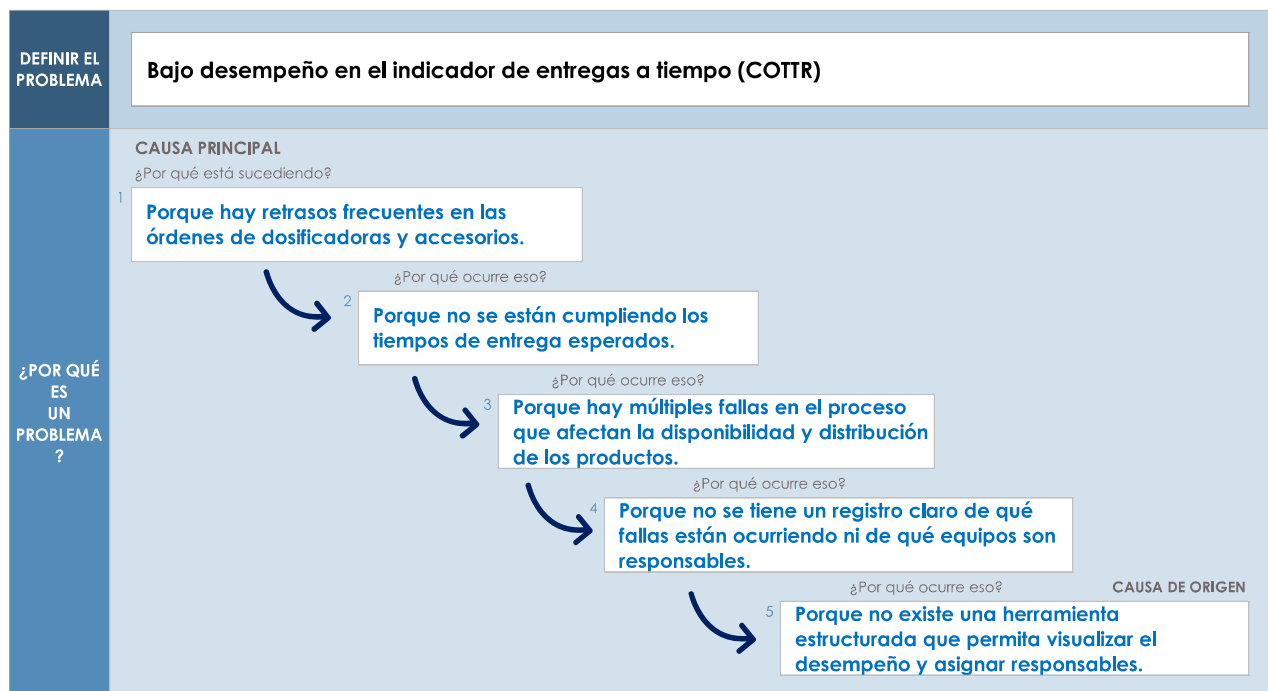

Fuente: Elaboración propia (2024).

A través de este análisis, se determinó que el problema principal se debía a la inexistencia de una herramienta estructurada que permita visualizar la causa detrás del mal desempeño de las entregas y asignar responsables a cada incidencia.

La falta de un sistema que consolide esta información dificulta la identificación de patrones en los retrasos y limita la capacidad de los equipos para tomar decisiones informadas. Como resultado, las acciones implementadas hasta el momento no lograban atacar el problema de manera efectiva, ya que se basaban en supuestos en lugar de datos.

3.1.2 Definición de objetivos claros:

Una vez establecida la causa raíz del problema, se procedió a la definición de objetivos. Para ello, se completó la plantilla de definición de objetivos, como se muestra a continuación:

Ilustración 15 Definición de objetivos específicos.

Problema detectado	¿Cómo se busca solucionar?	Objetivo específico	¿Cómo se va a medir?
Falta de una herramienta para el registro de fallas.	Implementado un registro estructurado de fallas en el indicador de entregas.	Desarrollar una herramienta que permita documentar y analizar las fallas en las entregas.	Tabla de registro de las fallas.
No se puede identificar visualmente los problemas críticos.	Facilitando la identificación de las fallas con mayor impacto en el indicador.	Identificar y priorizar las fallas según su impacto.	Análisis a través de un gráfico de Pareto.
No se tiene claridad sobre qué equipo contribuye más a las fallas.	Identificar que equipos o áreas presentan más oportunidades de mejora.	Analizar y clasificar las fallas según el equipo responsable para enfocar acciones de mejora.	Gráfico de pastel que muestre la distribución de fallas por equipo.
Hay mucha información para procesar.	Sintetizando la información de manera clara, precisa y visualmente accesible.	Elaborar un resumen ejecutivo que facilite el análisis de datos clave.	Resumen ejecutivo con datos clave.
Bajo porcentaje de entregas a tiempo.	Implementado la herramienta desarrollada para analizar fallas y tomar decisiones correctivas.	Mejorar el cumplimiento de entregas mediante decisiones basadas en la información generada por la herramienta desarrollada.	Comparación del porcentaje de entregas antes y después de la implementación de la herramienta.

Fuente: Elaboración propia (2024).


A partir de esta tabla, se concluyó que los objetivos principales son:

- Desarrollar una herramienta que permita documentar y analizar las fallas en las entregas.
- Identificar y priorizar las fallas según su impacto.
- Analizar y clasificar las fallas según el equipo responsable para enfocar acciones de mejora.
- Elaborar un resumen ejecutivo que facilite el análisis de datos clave.
- Mejorar el cumplimiento de entregas mediante decisiones basadas en la información generada por la herramienta desarrollada.

3.1.3 Diseño del plan de acción:

Finalmente, se diseñó un plan de acción estructurado en actividades clave que permiten abordar de forma ordenada y eficiente el problema detectado.

Ilustración 16 Diseño del plan de acción por medio de un diagrama de Gantt.

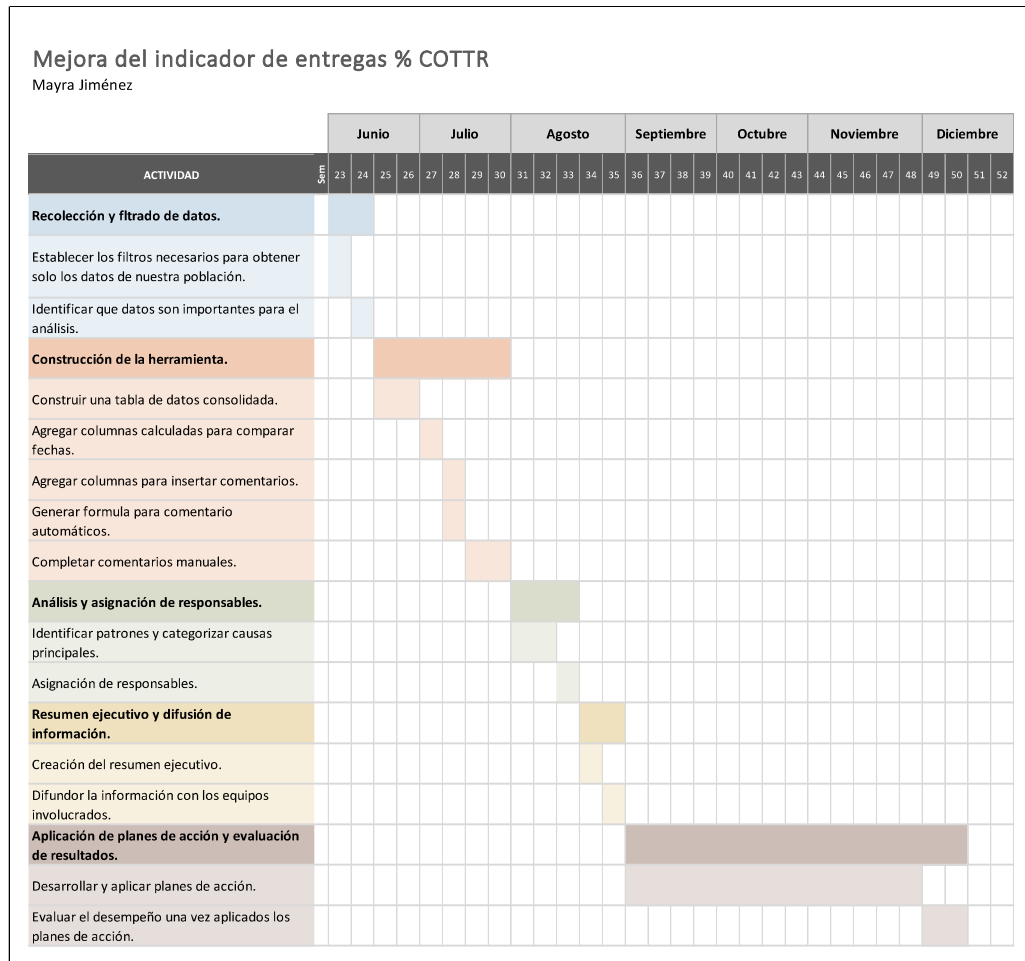

Fuente: Elaboración propia (2024).

Este plan contempló desde la recolección y depuración de los datos relevantes, hasta la construcción de una herramienta de análisis automatizada, categorización de causas raíz, asignación de responsables y comunicación de resultados. Las actividades fueron organizadas en un cronograma semanal, el cual sirvió como guía para avanzar con claridad y orden, asegurando el cumplimiento de cada fase.


3.2 Etapa 2: Hacer

En esta fase se llevó a cabo la implementación de las acciones definidas en el plan, con el objetivo de atender las causas raíz previamente definidas.

3.2.1 Establecimiento del proceso de implementación

Para guiar y estructurar el proceso, se utilizó un diagrama de flujo que permitió visualizar de forma clara los pasos a seguir. A continuación, se presenta el diagrama con cada uno de los procesos definidos:

Ilustración 17 Diagrama de flujo de procesos a seguir durante el proyecto.

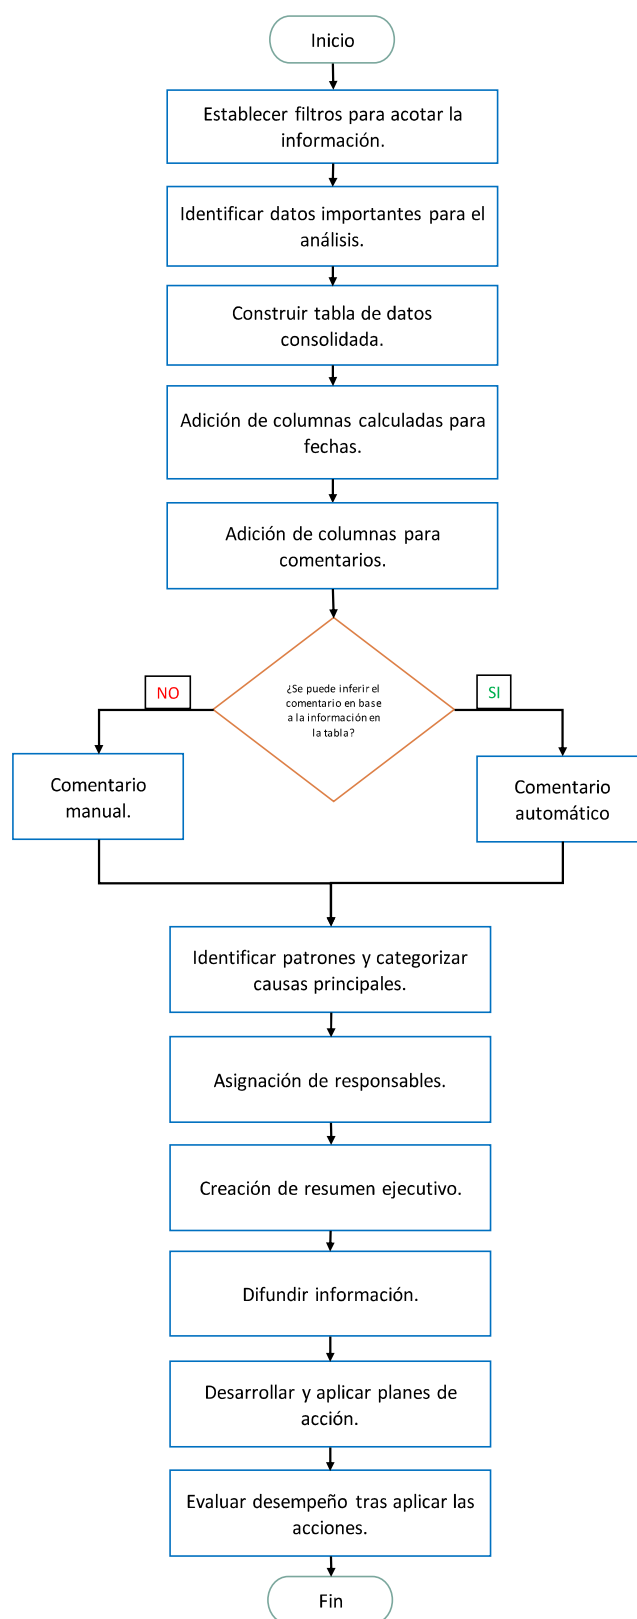

Fuente: Elaboración propia (2024).

3.2.2 Ejecución de acciones conforme al diagrama de flujo

Una vez establecido el flujo de trabajo, se procedió con la ejecución de cada una de las actividades. En la siguiente sección se describen los pasos realizados, de acuerdo con el orden definido en el diagrama.


a) Establecimiento de filtros para acotar la información.

El primer paso consistió en identificar los filtros necesarios a aplicar para la población de estudio. Los filtros aplicados fueron:

- Plantas que pertenecen a la zona de Norteamérica: GMU2 y GMUD.
- Periodo de tiempo: enero 2024 a junio 2024.
- Productos: Dosificadoras y accesorios.

Estos filtros se aplicaron directamente en el reporte de COTTR de SAP BW, como se muestra a continuación.

Ilustración 18 Filtros aplicados al reporte COTTR.

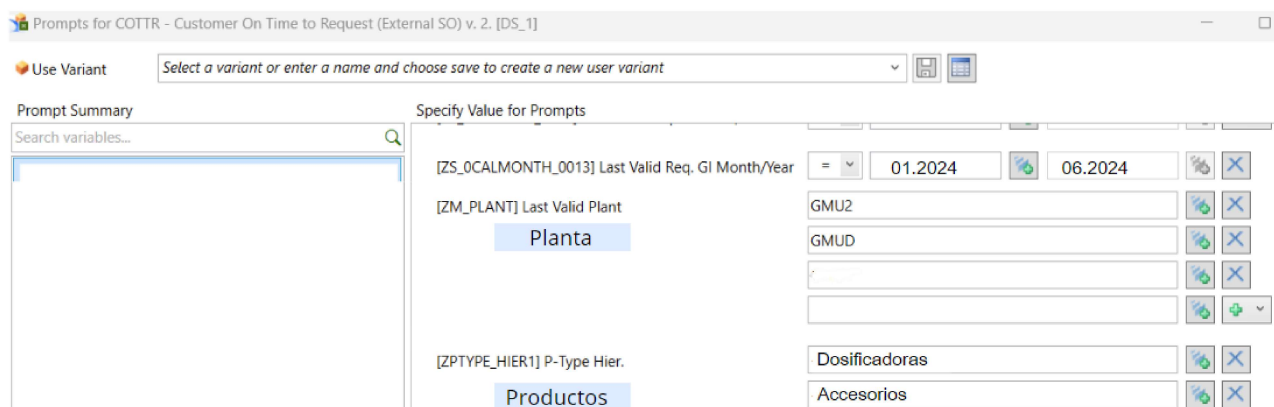

Fuente: Elaboración propia (2024).

Adicionalmente, se incorporó un filtro por categoría de segmentación para visualizar únicamente los materiales clasificados como Segmentación A.

Ilustración 19 Filtro para visualizar productos de segmentación A



Fuente: Elaboración propia (2024).

Finalmente, se implementó un filtro que permite visualizar únicamente las líneas cuyo resultado en el indicador es igual a 0%, es decir, órdenes entregadas fuera de tiempo.

Ilustración 20 Filtro para visualizar ordenes entregadas fuera de tiempo.

Settings

Based on measure:

Shipped as LastValid Re

Definition

Only Include Members

Between 0 and: 0

Add

Rules

Based on Shipped as Last

Equal To 0

Fuente: Elaboración propia (2024).

b) Identificación de datos importantes para el análisis.

Para realizar un análisis detallado, se identificaron como datos esenciales los siguientes:

- Planta de entrega (centro de distribución)
- Número de orden y línea
- Número y descripción de la parte
- Número del cliente
- Fechas de creación, requerida y de entrega
- Cantidad requerida
- Disponibilidad de inventario en la fecha requerida

c) Construcción de tabla de datos consolidada.

En esta etapa se construyó una tabla de datos en Microsoft Excel, en la cual se organizó la información de forma estructurada para facilitar la visualización e interpretación de los datos más relevantes del análisis.

Ilustración 21 Estructura inicial de la base de datos.

Planta	Número de orden	Línea	Numero de parte	Descripción del material	Número de cliente	Fecha de creación	Fecha requerida	Fecha de entrega	Cantidad requerida	Disponibilidad de inventario en la fecha requerida

Fuente: Elaboración propia (2024).

d) Adición de columnas calculadas para fechas.

A la tabla consolidada se incorporaron dos columnas adicionales con cálculos realizados mediante fórmulas en Microsoft Excel. Estas columnas permitieron cuantificar la diferencia en días entre las fechas clave del proceso:

- Diferencia entre fecha de creación y fecha requerida: se obtuvo restando la fecha de creación a la fecha requerida.

Ilustración 22 Estructura con diferencia de días entre fecha de creación y requerida.

Planta	Número de orden	Línea	Numero de parte	Descripción del material	Número de cliente	Fecha de creación	Fecha requerida	Fecha de entrega	Cantidad requerida	Disponibilidad de inventario en la fecha requerida	Diferencia entre fecha de creación y requerida (RLT)
GMU2	8110882	10	97722658	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602050484	2024/02/02	2024/01/05	2024/02/06	3	9	=+H2-G2

Fuente: Elaboración propia (2024).

- Diferencia entre fecha requerida y fecha de entrega: se obtuvo restando la fecha de entrega a la fecha de requerida.

Ilustración 23 Estructura con diferencia de días entre fecha requerida y de entrega.

Planta	Número de orden	Línea	Numero de parte	Descripción del material	Número de cliente	Fecha de creación	Fecha requerida	Fecha de entrega	Cantidad requerida	Disponibilidad de inventario en la fecha requerida	Diferencia entre fecha de creación y requerida (RLT)	Diferencia entre fecha requerida y de entrega (ALT)
GMU2	8110882	10	97722658	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602050484	2024/02/02	2024/01/05	2024/02/06	3	9	-28	=+H2-I2

Fuente: Elaboración propia (2024).

e) Adición de columnas para comentarios.

Se incorporaron columnas adicionales a la estructura para permitir el registro de fallas mediante comentarios. Se consideraron comentarios automáticos para aquellas fallas que pueden inferirse basándose en la información proporcionada en la base de datos y en las columnas calculadas de fechas. Se utilizó la siguiente tabla como referencia, la cual incluye las fallas conocidas actualmente:

Ilustración 24 Tabla de fallas conocidas.

Fallas conocidas:
Falta de existencias
Fecha requerida anterior a la fecha de creación
Fecha requerida igual a la fecha de creación

Fuente: Elaboración propia (2024).

Los comentarios automáticos detallan la causa de la falla y se generaron a partir de la fórmula SI.CONJUNTO, que consideró las siguientes condiciones:

- Fechas de entrega (requerida y real).
- Disponibilidad de inventario.

- Fecha de creación de la orden (si fue creada fuera del tiempo previsto o con fechas no alineadas al sistema).
- En caso de que exista un comentario manual, este prevalece sobre el comentario automático.

Para las órdenes en las que el sistema no pudo generar un comentario automático, se efectuó un análisis manual mediante la transacción VA03 en SAP. En este proceso, se revisó minuciosamente el historial de cambios de cada orden con el objetivo de identificar y documentar la causa raíz del retraso.

A continuación, se presenta la estructura con las columnas adicionales para comentarios:

Ilustración 25 Estructura con comentarios.

Planta	Número de orden	Línea	Número de parte	Descripción del material	Número de cliente	Fecha de creación	Fecha requerida	Fecha de entrega	Cantidad requerida	Disponibilidad de inventario en la fecha requerida	Diferencia entre fecha de creación y requerida (RLT)	Diferencia entre fecha requerida y de entrega (ALT)	Comentario automático	Comentario manual
GMU2	8110882	10	97722658	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602050484	2024/02/02	2024/01/05	2024/02/06	3	9	-28	-32	Fecha requerida anterior a la fecha de creación	
GMU2	8113731	10	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600000045	2024/01/15	2024/01/17	2024/01/31	1	1	2	-14	Falta de existencias	Falta de existencias
GMU2	674549254	20	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2023/11/14	2024/01/05	2024/02/21	1	3	52	-47	Falta de existencias	Falta de existencias
GMU2	674549714	10	97722740	DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600004055	2023/11/16	2024/01/02	2024/01/03	1	1	47	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)
GMU2	674549773	10	98071153	RSL-1100-2L-G5/8 PV/T/C U7	600000096	2023/11/16	2024/01/02	2024/01/03	3	7	47	-1	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta
GMU2	674549944	10	97722374	DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-311003BG	600000063	2023/11/17	2024/01/26	2024/02/02	1	1	70	-7	Falta de existencias	Falta de existencias
GMU2	674550409	10	99406010	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C with acc. SUEZ US	600003895	2023/11/21	2024/01/23	2024/03/01	1	0	63	-38	Falta de existencias	

Fuente: Elaboración propia (2024).

f) Identificación de patrones y categorización de causas principales.

Una vez registrados todos los comentarios asociados a cada fallo, se procedió a analizar la información en busca de patrones recurrentes. Para ello, se creó una tabla dinámica que resumió los comentarios más comunes y su frecuencia de aparición.

Ilustración 26 Tabla de comentarios y frecuencia de aparición.

Comentario automático	Count of Comentario automático
Datos modificados en la orden de venta	19
Ejecución tardía de la entrega	2
Falta de existencias	381
Fecha no alineada con fechas de ruta	51
Fecha requerida anterior a la fecha de creación	56
Fecha requerida igual a la fecha de creación	170
Liberación tardía del crédito	68
Orden con entrega completa	23
Otros	39
Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	492
Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	88
Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	55
Grand Total	1444

Fuente: Elaboración propia (2024).

Este análisis permitió agrupar las fallas en categorías representativas, lo que facilitó la identificación y visualización de las causas más frecuentes del incumplimiento del indicador de entregas COTTR. Esta tabla se utilizó como referencia para clasificar las fallas como se muestra a continuación:

Ilustración 27 Tabla con asignación de categorías.

Comentario automático	Count of Comentario automático	Categoría
Datos modificados en la orden de venta	19	→ Manejo de ordenes de venta
Ejecución tardía de la entrega	2	→ Ejecución tardía de la entrega
Falta de existencias	381	→ Falta de existencias
Fecha no alineada con fechas de ruta	51	→ Creación incorrecta de la orden
Fecha requerida anterior a la fecha de creación	56	→ Creación incorrecta de la orden
Fecha requerida igual a la fecha de creación	170	→ Creación incorrecta de la orden
Liberación tardía del crédito	68	→ Liberación tardía del crédito
Orden con entrega completa	23	→ Orden con entrega completa
Otros	39	→ Otros
Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	492	→ Remoción tardía de bloqueo
Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	88	→ Remoción tardía de bloqueo
Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	55	→ Liberación tardía del crédito
Grand Total	1444	

Fuente: Elaboración propia (2024).

g) Asignación de responsables.

Una vez definidas las categorías de fallas, se procedió a la asignación de responsables para cada una de ellas. Esta etapa fue clave para asegurar la trazabilidad de las incidencias y promover la implementación de acciones correctivas por parte de los equipos involucrados en la cadena de suministro.

Para esta asignación se consideraron los siguientes criterios:

- Análisis del alcance de cada área: Se evaluaron las funciones y atribuciones de los distintos equipos dentro de la organización.
- Vinculación de las categorías con los departamentos responsables: Se asignó cada falla a la unidad correspondiente, con base en su capacidad para corregirla o mitigar su impacto.

Ilustración 28 Tabla con asignación de responsables.

Comentario automático	Count of Comentario automático	Categoría	Responsable
Datos modificados en la orden de venta	19	→ Manejo de ordenes de venta	→ Área de gestión de pedidos
Ejecución tardía de la entrega	2	→ Ejecución tardía de la entrega	→ Área de logística
Falta de existencias	381	→ Falta de existencias	→ Área de planeación
Fecha no alineada con fechas de ruta	51	→ Creación incorrecta de la orden	→ Área de gestión de pedidos
Fecha requerida anterior a la fecha de creación	56	→ Creación incorrecta de la orden	→ Área de gestión de pedidos
Fecha requerida igual a la fecha de creación	170	→ Creación incorrecta de la orden	→ Área de gestión de pedidos
Liberación tardía del crédito	68	→ Liberación tardía del crédito	→ Área de finanzas
Orden con entrega completa	23	→ Orden con entrega completa	→ Área de planeación
Otros	39	→ Otros	→ Otros
Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	492	→ Remoción tardía de bloqueo	→ Área de gestión de pedidos
Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	88	→ Remoción tardía de bloqueo	→ Área de gestión de pedidos
Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	55	→ Liberación tardía del crédito	→ Área de finanzas
Grand Total	1444		

Fuente: Elaboración propia (2024).

Este esquema de responsabilidades proporcionó mayor claridad a cada equipo sobre las fallas bajo su competencia y les permitirá tomar medidas específicas para mejorar el desempeño de indicador COTTR. Así mismo, establecerá las bases para un monitoreo continuo que permitirá evaluar la efectividad de las acciones correctivas implementadas.

Con base en el esquema anterior, se añadieron dos columnas adicionales a la tabla consolidada que reflejan la categoría de la falla y el área responsable correspondiente a cada comentario.

Ilustración 29 Estructura con categoría y área responsable.

Planta	Número de orden	Línea	Número de parte	Descripción del material	Número de cliente	Fecha de creación	Fecha requerida	Fecha de entrega	Cantidad requerida	Disponibilidad de inventario en la fecha requerida	Diferencia entre fecha de creación y requerida (BLT)	Diferencia entre fecha requerida y de entrega (ALT)	Comentario automático	Comentario manual	Categoría	Área responsable
GMU2	8110882	10	97722658	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U/7/8G	602050484	2024/02/02	2024/01/05	2024/02/06	3	9	-28	-32	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	8113731	10	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A78G	600000045	2024/01/15	2024/01/17	2024/01/31	1	1	2	-14	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674549254	20	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U/7/8G	600012110	2023/11/14	2024/01/05	2024/02/21	1	3	52	-47	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674549714	10	97722740	DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31U/7/8G	600004035	2023/11/16	2024/01/02	2024/01/03	1	1	47	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674549773	10	98071153	RSL-1100-2L-GS/8 PV/T/C U7	600000096	2023/11/16	2024/01/02	2024/01/03	3	7	47	-1	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos

Fuente: Elaboración propia (2024).

Para consultar la tabla completa, véase el apartado de anexos.

h) Creación de resumen ejecutivo.

Se generó un resumen ejecutivo con el objetivo de facilitar el análisis de los datos clave y presentar de forma visual los hallazgos obtenidos. En este resumen se incluyen los siguientes gráficos:

- Un *gráfico* que muestra el resultado del indicador de entregas de enero a junio de 2024 y su promedio de cumplimiento.
- Un *gráfico de Pareto* que presenta las fallas identificadas, ordenadas de mayor a menor impacto.
- Un *gráfico de pastel* que presenta la distribución de fallas por equipo responsable.
- Un *mapa de árbol* que ilustra la proporción de cada categoría dentro del total de incidencias.
- Un resumen con el top 3 de *fallas y categorías*, que permite visualizar las problemáticas más relevantes.

FALLAS QUE AFECTAN EL INDICADOR DE ENTREGAS COTTR


DIVISION
INDUSTRIAL

PRODUCTOS
**DOSIFICADORAS Y
ACCESORIOS (A)**

REGION
NORTEAMERICA




Promedio de % de Entregas a tiempo (COTTR)

53%

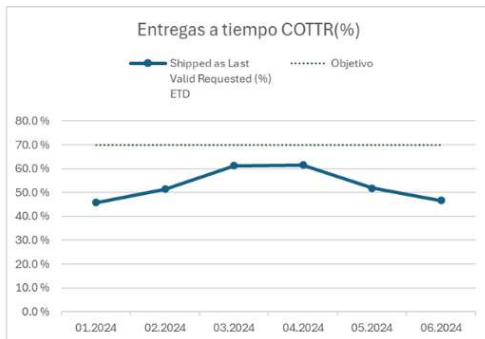

TOP 3 CATEGORIAS

- Remoción tardía de bloqueo
- Falta de existencias
- Creación incorrecta de la orden

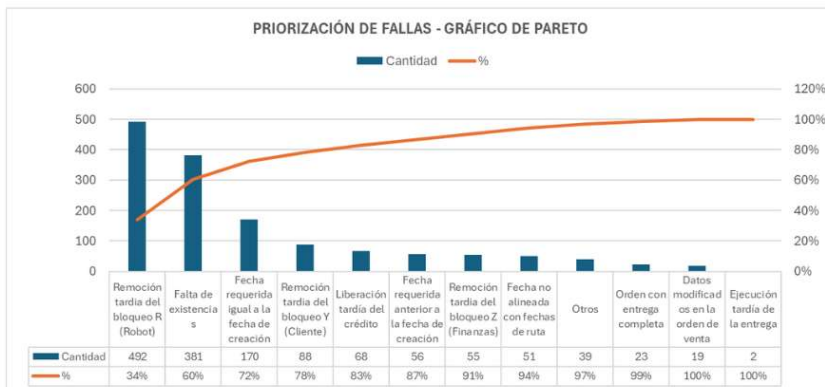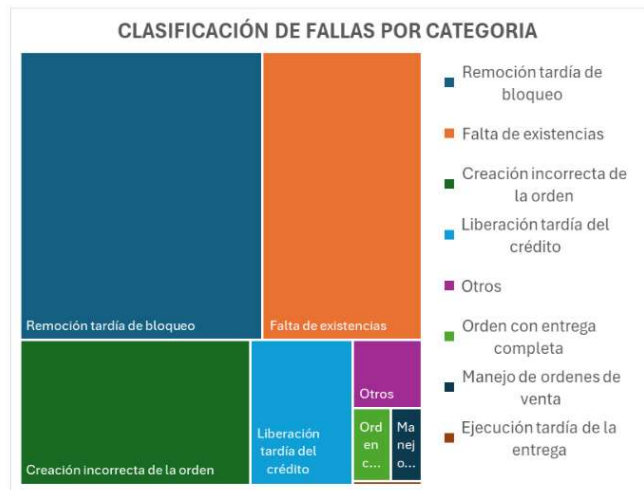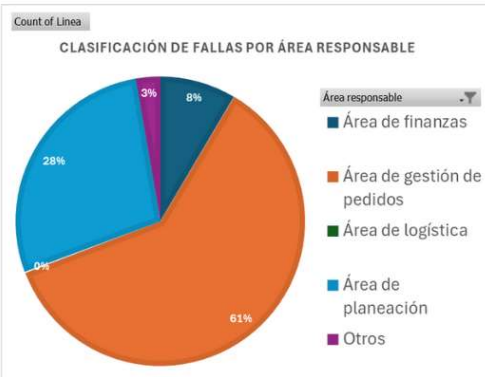

TOP 3 FALLAS

- Remoción tardía de bloqueo R.
- Falta de existencias.
- Fecha requerida igual a la fecha de creación.

Fuente: Elaboración propia (2024).

i) Desarrollar y aplicar planes de acción.

En esta etapa, se estableció un plazo de tres meses para que cada área desarrollara y ejecutara un plan de acción específico, enfocado en corregir las fallas identificadas bajo su responsabilidad.

Es importante señalar que los planes de acción no se detallan en este documento, ya que son variados, con enfoques distintos y gestionados por diferentes equipos. Asimismo, el seguimiento individual de estos planes queda fuera del alcance de la presente tesis.

j) Evaluar desempeño tras aplicar las acciones.

Una vez transcurridos los tres meses correspondientes a la ejecución de las acciones correctivas, se procedió a extraer un nuevo reporte aplicando los mismos filtros utilizados en el análisis inicial. En esta ocasión, el enfoque fue exclusivamente para mostrar los resultados del indicador de entregas a tiempo (COTTR), desglosados por mes.

Ilustración 31 Tabla de resultados del indicador de entregas por mes.

Current Req. GI Month	All SO lines	Shipped as Last Valid Requested (%) ETD	Objetivo	Promedio
01.2024	703	45.8 %	70.0 %	53.1 %
02.2024	732	51.4 %	70.0 %	
03.2024	730	61.2 %	70.0 %	
04.2024	812	61.5 %	70.0 %	
05.2024	711	51.9 %	70.0 %	
06.2024	628	46.7 %	70.0 %	
07.2024	707	72.3 %	70.0 %	72.8 %
08.2024	686	67.5 %	70.0 %	
09.2024	656	63.3 %	70.0 %	
10.2024	762	78.3 %	70.0 %	
11.2024	689	77.4 %	70.0 %	
12.2024	663	78.3 %	70.0 %	

Fuente: Elaboración propia (2024).

En la tabla se muestra como el indicador de entregas evolucionó favorablemente durante el segundo semestre del 2024, una vez que las acciones correctivas fueron ejecutadas. El promedio de indicador de entregas a tiempo aumentó del 53% registrado en el primer semestre al 73% en el segundo semestre, demostrando que las medidas aplicadas fueron efectivas y contribuyeron significativamente a la mejora del desempeño en las entregas.

3.3 Etapa 3: Verificar

En esta etapa, se llevó a cabo la verificación de los resultados obtenidos tras la aplicación de los planes de acción, con el objetivo de evaluar si las metas establecidas en la etapa de planeación fueron alcanzadas.

3.3.1 Verificación mediante tabla comparativa.

Se completó la plantilla de comparación de objetivos vs. resultados, en la cual se registraron los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos planteados. La tabla se presenta a continuación, mostrando de forma clara la relación entre las metas establecidas y los valores alcanzados.

Ilustración 32 Tabla comparativa de resultados vs objetivos.

Objetivo planteado	Resultado obtenido	Estatus de cumplimiento
Desarrollar una herramienta que permita documentar y analizar las fallas en las entregas.	Tabla de datos que registra fallas y permite analizar sus causas raíz.	
Identificar y priorizar las fallas según su impacto.	Gráfico de Pareto que permite identificar los problemas principales visualmente. TOP 3: * Remoción tardía de bloqueo R - 34%. * Falta de existencias - 26%. * Fecha requerida igual a la fecha de creación - 12%.	
Analizar y clasificar las fallas según el equipo responsable para enfocar acciones de mejora.	Gráfico de pastel que muestra la distribución de fallas por equipo. Las áreas con mayor impacto al indicador de entregas son: * Gestión de pedidos - 61% * Planeación - 28% * Finanzas - 8%	
Elaborar un resumen ejecutivo que facilite el análisis de datos clave.	Resumen de los datos obtenidos, representados mediante gráficos que concentran la información de forma clara y visual.	
Mejorar el cumplimiento de entregas mediante decisiones basadas en la información generada por la herramienta desarrollada.	El promedio de entregas a tiempo aumentó del 53% al 73% en el segundo semestre del 2024, demostrando la efectividad de las medidas aplicadas.	

Fuente: Elaboración propia (2024).

3.3.2 Análisis de cumplimiento

El análisis ha demostrado que los resultados alcanzaron o superaron los objetivos establecidos, lo cual refleja la efectividad de las acciones correctivas implementadas. Estos resultados validan el plan de acción y permiten avanzar hacia la siguiente fase del ciclo de mejora continua para estandarizar y mantener los logros obtenidos.

3.4 Etapa 4: Actuar

En esta última etapa, se procedió a la consolidación y estandarización de las soluciones que demostraron ser efectivas durante las fases anteriores. Estas acciones se integraron a los procesos organizacionales como prácticas normativas y se estableció un sistema de monitoreo continuo para asegurar la sostenibilidad de las mejoras alcanzadas.

3.4.1 Estandarización mediante capacitación

Para garantizar el uso eficiente de la herramienta desarrollada y la correcta interpretación de sus resultados se implementó una estrategia de capacitación dirigida a los usuarios clave.

Se utilizó una lista de capacitación para documentar que colaboradores recibieron la formación, asegurando así la correcta difusión del conocimiento dentro de los equipos involucrados.

Ilustración 33 Lista de personal capacitado en el uso de la herramienta.

PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL				
Uso de herramienta para evaluar Tema: <u>fallas en el indicador COTTR</u> Fecha: <u>Enero 2025</u>				
No.	Nombre	Apellido	Departamento	Firma
1	Homero	B.	Planeación	HBG
2	Alicia	B.	Planeación	AB
3	Juan	C.	Planeación	JMC
4	Dario	G.	Planeación	JUG
5	Robert	D.	Planeación	RD
6	Megan	W.	Gestión de pedidos	MW
7	Randi	Y.	Gestión de pedidos	RY
8	Lance	W.	Gestión de pedidos	LW
9	John	P.	Logística	JP
10	Jorge	S.	Logística	JS
11	Erwin	S.	Finanzas	ES
12				
13				
14				
15				
Dictado por:		Mayra Jiménez		


Fuente: Elaboración propia (2024).

Esta acción permitió estandarizar el uso de la herramienta y fortalecer las competencias del personal en el seguimiento del indicador.

3.4.2 Monitoreo y evaluación

Como parte del sistema de control, se estableció el uso de una gráfica de tendencia, basada en la tabla obtenida en el paso j de la segunda etapa, que permite monitorear de manera continua la evolución del indicador de entregas a lo largo del tiempo. Esta herramienta visual facilita la detección de patrones de mejora, así como de posibles retrocesos, lo que permite actuar de forma oportuna ante cualquier desviación.

Ilustración 34 Gráfica de tendencia del indicador de entregas a tiempo.

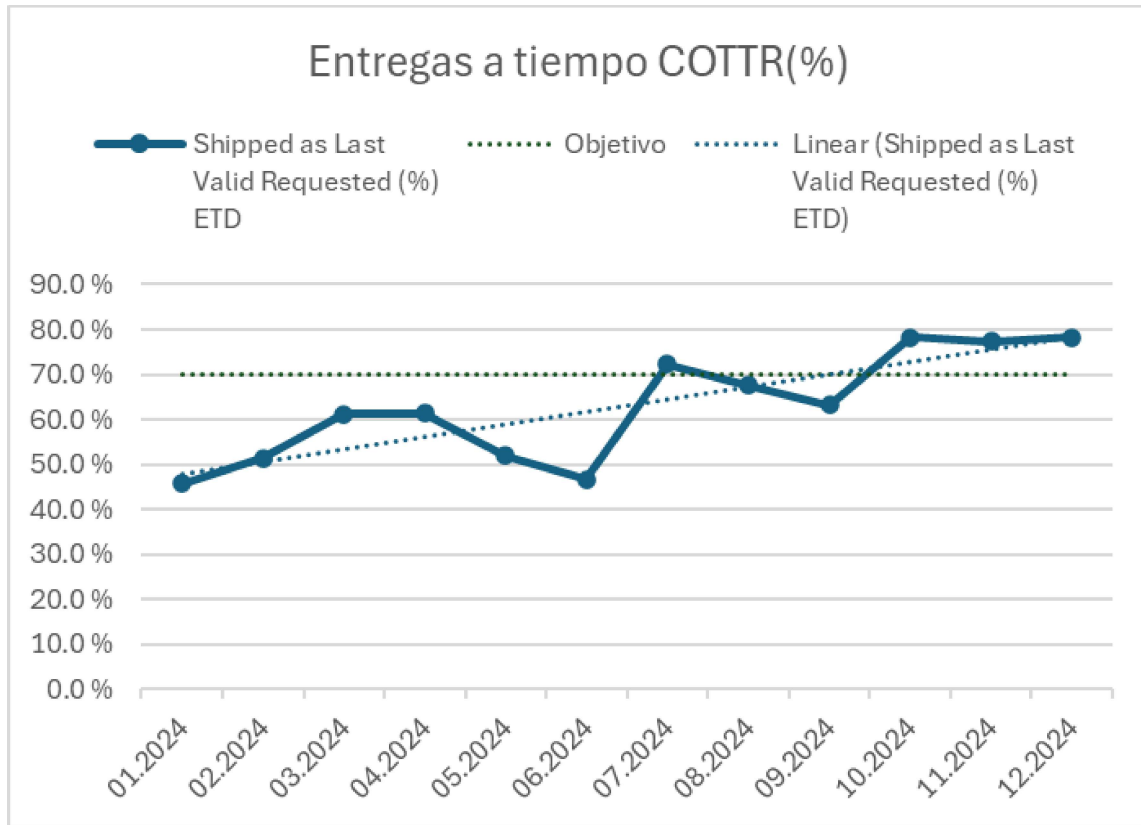

Fuente: Elaboración propia (2024).

La implementación de este monitoreo periódico garantiza que las mejoras alcanzadas se mantengan en el tiempo, además de proporcionar una visibilidad contante sobre el desempeño del proceso.

3.4.3 Estrategia de mejora continua

Para fortalecer la mejora continua, se implementó un método estructurado de seguimiento mediante una tabla de registro de mejoras, la cual es revisada durante cada junta mensual.

Esta tabla permite documentar las propuestas de optimización en el uso de la herramienta, registrar los cambios implementados y evaluar sus efectos en el desempeño del proceso. Gracias a esta estructura, se garantiza que la herramienta continúe evolucionando en línea con los objetivos organizacionales y que las decisiones se tomen con base en información actualizada y documentada.

A continuación, se presenta la tabla que contiene algunas de las propuestas de mejora planteadas a inicios de este año.

Ilustración 35 Registro de propuestas de mejora.

REGISTRO DE PROPUESTAS DE MEJORA					
No.	Fecha	Empleado	Propuesta	Plan de acción	Estado
1	Enero 2025	Juan C.	Implementar la herramienta para todos los productos.	Modificar los filtros y expandir la herramienta.	En proceso
2	Enero 2025	Homero B.	Expandir la herramienta para todas las segmentaciones.	Modificar los filtros y expandir la herramienta.	En proceso
3	Febrero 2025	Mayra J.	Convertir la herramienta en un tablero POWER BI automático.	Desarrollo del tablero con especialistas de IT.	En proceso
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Fuente: Elaboración propia (2024).

Este enfoque de estandarización y seguimiento no solo asegura la sostenibilidad de los resultados obtenidos, sino que también refuerza la cultura de mejora continua dentro de la organización.

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió cumplir de manera satisfactoria con el objetivo general de mejorar el indicador de entregas a tiempo en las familias de productos dosificadoras y accesorios, mediante la construcción e implementación de una herramienta metodológica orientada a la identificación y análisis de causas raíz. Los resultados evidencian que el indicador COTTR experimentó un incremento sustancial, al pasar de 53% en el primer semestre de 2024 a 73% en el segundo, lo que representa una mejora del 20%. Dicho avance valida empíricamente la pertinencia de las acciones emprendidas y confirma la utilidad de aplicar el principio de Pareto en la gestión de problemáticas operativas.

En cuanto a los objetivos específicos, estos fueron alcanzados de manera integral. El análisis detallado de los datos permitió categorizar con rigor las principales fallas, mientras que el diseño de una herramienta en Excel, con capacidad de actualización y monitoreo mensual, facilitó no solo la sistematización de la información, sino también la asignación de responsabilidades directas por cada causa identificada. La aplicación de la metodología PDCA se reveló como un marco idóneo para estructurar las fases del proyecto, garantizando un proceso disciplinado de planeación, ejecución, verificación y estandarización de mejoras.

De manera complementaria, se instauró un sistema formal de mejora continua sustentado en revisiones periódicas y registros estructurados, lo que asegura la sostenibilidad de los logros alcanzados y abre la posibilidad de que la herramienta evolucione conforme a las necesidades estratégicas de la organización. Cabe destacar que el impacto del proyecto trascendió el plano operativo, ya que la mejora del indicador se tradujo en un fortalecimiento de la relación con los clientes, en un incremento de la confianza hacia los procesos de la empresa y en una consolidación de su competitividad en el mercado. Estos efectos generaron un reconocimiento institucional que posiciona el proyecto como un referente a nivel regional y global en la gestión de entregas.

En suma, los hallazgos permiten concluir que la combinación de un enfoque metodológico riguroso con la disciplina de la mejora continua constituye un mecanismo eficaz para transformar el desempeño organizacional y, al mismo tiempo, incidir de manera positiva en la percepción externa de la compañía.

PROYECTOS A FUTURO

A partir de los resultados alcanzados, se identifican varias oportunidades de continuidad que pueden potenciar y consolidar los avances logrados. En primer lugar, se contempla la ampliación del alcance de la herramienta hacia otras familias de productos y segmentaciones, con el propósito de integrar un sistema global que permita gestionar de manera uniforme el indicador de entregas a tiempo en toda la organización.

En segundo lugar, se propone la evolución tecnológica de la herramienta, migrándola de Excel hacia una plataforma dinámica en Power BI. Esta transición permitiría automatizar procesos, visualizar información en tiempo real y agilizar la toma de decisiones estratégicas con mayor precisión.

De manera complementaria, una vez resueltas las fallas principales que impactaban de forma más evidente en el desempeño, se abre la posibilidad de profundizar en el análisis de causas secundarias o menos visibles, cuyo tratamiento puede generar nuevas mejoras en el indicador y contribuir a un desempeño más robusto y sostenible.

Finalmente, se plantea el escalamiento organizacional del modelo de mejora continua, de forma que este se convierta en una práctica estándar aplicada de manera transversal en todas las áreas de la compañía. Con ello, se aseguraría no solo la permanencia de los resultados obtenidos, sino también la incorporación de buenas prácticas y aprendizajes a la estrategia de largo plazo de la organización.

REFERENCIAS

- Alleyne, A. (30 de 11 de 2023). *¿Qué es la gestión del rendimiento de ventas (SPM)? Beneficios, cómo hacerlo y tips*. Obtenido de Oracle: <https://www.oracle.com/es/cx/sales/sales-performance-management/what-is-sales-performance-management/>
- Arana, L. (2023). *Lead Time standard (TLT, CLT, PDT, TT)*. Obtenido de documento de la empresa.
- Arturo. (2024). *Tiempos de entrega: Clave para la Satisfacción del Cliente. Aprende Industrial*.
- Bijelić, T. (2024). *Delivery blocks in sales orders*. Obtenido de documento de la empresa.
- Chopra, S., & Meindl, P. (2016). *Supply Chain Management Strategy, Planning and Operation*. Pearson.
- CVOSOFT IT ACADEMY. (Consulta: Diciembre de 2024). *CVOSOFT IT ACADEMY*. Obtenido de <https://www.cvosoftware.com/glosario-sap/sap-mm/va03-1606.html>
- Fagerhaug, T. (1999). *A new improvement oriented method and model for self-assessment for bussiness excellence*. Trondheim, Noruega.
- Flores, J. (2004). *Medición de la efectividad de la cadena de suministro*. Panorama.
- Franco, Á. (2014). *Medición del rendimiento en el proceso de compras y suministros. Universidad Autónoma de Occidente, Cali-Colombia*.
- Hadjú, F. (2023). *Order management*. Obtenido de documento de la empresa.
- Jagusiak-Kocik, M. (2017). *PDCA cycle as a part of continuous improvement in the production company - a case study. PRODUCTION ENGINEERING ARCHIVES*, 19-22.
- Kapusi, V. (2023). *Segmentation process*. Obtenido de documento de la empresa.
- Kenton, W. (28 de 2 de 2024). *Lead Time: Definition, How It Works, and Example*. Obtenido de Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/l/leadtime.asp>
- Koch, R. (2009). *El secreto de lograr más con menos*. Paidós.
- Masao, G. (Febrero de 2022). *Customer On Time To Request (COTTR) (External SO)*. Obtenido de Documento interno de la empresa.
- Paredes Roldán, J. (2001). *Planificación y control de la producción*.
- Parmenter, D. (2007). *Key performance indicators : developing, implementing, and using winning KPIs*.
- Realyvásquez-Vargas, A., Arredondo, K., Carrillo , T., & Ravelo, G. (2018). *Applying the Plan-Do-Check-Act (PDCA) Cycle to Reduce the Defects in the Manufacturing Industry. A Case Study. MDPI*.
- Ruiz, P., González, C., & Alcalde, J. (2005). *Análisis de causas raíz. Una herramienta útil para la prevención de errores. Revista de Calidad Asistencial*, 71-78.
- Sabriá, F. (2004). *La cadena de suministro*. Marge Books.
- SAP. (Consulta: Diciembre de 2024). *¿Qué es SAP?* Obtenido de <https://www.sap.com/latinamerica/about/what-is-sap.html>
- SAP. (Consulta: Octubre de 2024). *SAP*. Obtenido de <https://www.sap.com/products/technology-platform/bw4hana-data-warehousing.html>
- Serrat, O. (2014). *The Five Whys Technique*. En *Knowledge Solutions* (págs. 307-310). ADB.

Sánchez, F. (2007). *El Kaizen: La Filosofía de Mejora Continua e Innovación Incremental detrás de la Administración por Calidad Total*. Panorama.

Waller, M. A., & Esper, T. L. (2017). *Administración de inventarios*. Pearson.

ANEXOS

Planta	Número de orden	Línea	Número de parte	Descripción del material	Número de cliente	Fecha de creación	Fecha requerida	Fecha de entrega	Cantidad requerida	Disponibilidad de inventario en la fecha requerida	Diferencia entre fecha de creación y fecha requerida (RLT)	Diferencia entre fecha requerida y de entrega (ALT)	Comentario automático	Comentario manual	Categoría	Área responsable
GMU2	8110882	10	97722658	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602050484	2024/02/02	2024/01/05	2024/02/06	3	9	-28	-32	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	8113731	10	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600000045	2024/01/15	2024/01/17	2024/01/31	1	1	2	-14	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674549254	20	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2023/11/14	2024/01/05	2024/02/21	1	3	52	-47	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674549714	10	97722740	DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600004055	2023/11/16	2024/01/02	2024/01/03	1	1	47	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674549773	10	98071153	RSL-1100-2L-G5/8 PV/T/C U7	600000096	2023/11/16	2024/01/02	2024/01/03	3	7	47	-1	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674549944	10	97722374	DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-311003BG	600000063	2023/11/17	2024/01/26	2024/02/02	1	1	70	-7	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674550409	10	99406010	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C with acc. SUEZ US	600003895	2023/11/21	2024/01/23	2024/03/01	1	0	63	-38	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674550969	40	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2023/11/27	2024/01/05	2024/02/22	4	3	39	-48	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674551900	20	97722760	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600006570	2023/12/01	2024/01/09	2024/01/11	1	0	39	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674552453	10	95730750	PLV-G5/8-3 PV/T U7	600000096	2023/12/05	2024/01/26	2024/03/04	6	0	52	-38	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674553045	90	97702492	Acc.connector PVC-R,tubing 1/4x3/8	600000486	2023/12/08	2024/01/05	2024/01/09	6	6	28	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674553143	10	97722489	DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-32U7U7BG	600004040	2023/12/08	2024/01/10	2024/01/11	2	1	33	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554339	10	97722381	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-31U7U7BG	600004330	2023/12/15	2024/01/11	2024/02/20	2	4	27	-40	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554583	40	97722540	DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-311004BG	600004330	2023/12/18	2024/01/29	2024/02/22	6	5	42	-24	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554743	10	97722569	DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600000469	2023/12/18	2024/01/03	2024/01/31	1	1	16	-28	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674554743	40	99159492	DDA 200-4 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600000469	2023/12/18	2024/01/03	2024/01/25	2	0	16	-22	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554743	50	97722362	DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-311003BG	600000469	2023/12/18	2024/01/03	2024/02/20	10	2	16	-48	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554864	50	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-32U7U7BG	602013686	2023/12/19	2024/01/05	2024/02/23	1	0	17	-49	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554864	60	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-32U7U7BG	602013686	2023/12/19	2024/01/05	2024/02/23	1	0	17	-49	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554927	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600006570	2023/12/19	2024/01/26	2024/01/29	1	1,455	38	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674554927	40	97722361	DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31U7U7BG	600006570	2023/12/19	2024/01/26	2024/01/29	2	4	38	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674554927	130	96629222	Acc. cable 5m, analog output, straight	600006570	2023/12/19	2024/01/26	2024/01/29	1	406	38	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674555016	10	99159454	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600000141	2023/12/19	2024/01/08	2024/01/09	50	104	20	-1	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674555304	10	97721106	DDE 6-10 P-PV/E/C-X-311003BG	600004330	2023/12/20	2024/01/10	2024/03/05	3	0	21	-55	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674555406	30	97722446	DDA 7.5-16 FCM-PV/E/C-F-311003BG	602050524	2023/12/21	2024/01/24	2024/02/23	3	1	34	-30	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674555406	40	97722446	DDA 7.5-16 FCM-PV/E/C-F-311003BG	602050524	2023/12/21	2024/01/08	2024/01/17	1	2	18	-9	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674555606	70	97722692	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000382	2023/12/22	2024/01/31	2024/03/15	11	3	40	-44	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674555613	20	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600000096	2023/12/22	2024/01/02	2024/01/03	4	8	11	-1	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674555683	20	99171932	E-box 500 V20, Ethernet DDA	600012110	2023/12/22	2024/01/08	2024/01/15	1	0	17	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674555792	60	97721102	DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-311003BG	600004330	2024/01/29	2024/01/05	2024/02/02	3	2	-24	-28	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674555813	20	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	600004330	2023/12/26	2024/01/02	2024/02/23	4	3	7	-52	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674555918	10	97722588	DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-32U7U7BG	600000158	2023/12/27	2024/01/02	2024/01/04	1	0	6	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674556039	10	97722365	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600000043	2023/12/28	2024/01/04	2024/02/12	1	0	7	-39	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674556047	10	97721064	DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-311003BG	600000486	2023/12/28	2024/01/31	2024/03/05	20	2	5	-63	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674556047	70	95730491	Install. Kit 1003 PVC/E/C-0.17"x1/4"-NL	600000486	2023/12/28	2024/01/08	2024/01/09	3	25	11	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556172	10	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread,1/2"MNPT	600004330	2023/12/28	2024/01/02	2024/01/04	1	50	5	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556173	10	98148805	Tank 60L,PE-transp./black	600005211	2023/12/28	2024/01/02	2024/02/06	2	8	5	-35	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674556196	20	97722370	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311003BG	600000158	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	5	72	4	-7	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	30	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000158	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	5	54	4	-7	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	90	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000158	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	3	33	4	-7	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	100	97722692	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000158	2023/12/29	2024/01/17	2024/01/18	1	7	19	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	110	97722369	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600000158	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2	43	4	-7	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	140	97722588	DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-32U7U7BG	600000158	2023/12/29	2024/01/12	2024/01/16	1	4	14	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	160	97722489	DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-32U7U7BG	600000158	2023/12/29	2024/01/26	2024/01/29	1	3	28	-3	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	170	97722744	DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600000158	2023/12/29	2024/01/31	2024/02/01	1	2	33	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	180	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600000158	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2	120	4	-7	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	250	97721080	DDE 6-10 B-PV/T/C-X-311003BG	600000158	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	10	54	4	-7	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	260	97721068	DDE 6-10 B-PVC/T/C-X-311003BG	600000158	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	10	20	4	-7	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	420	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread,1/2"MNPT	600000158	2023/12/29	2024/01/08	2024/01/09	10	63	10	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	590	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000158	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	20	1,566	4	-7	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	600	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000158	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	20	740	4	-7	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556379	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004075	2024/01/02	2024/01/03	2024/01/04	2	728	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556413	10	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	600004745	2024/01/02	2024/01/02	2024/01/12	15	172	0	-10	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556413	30	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread,1/2"MNPT	600004745	2024/01/02	2024/01/02	2024/01/12	5	50	0	-10	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556436	10	98070957	FV-NL-G5/8 PV/V,E/C U7	600004330	2024/01/03	2024/01/03	2024/01/04	5	41	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556467	10	97722369	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600002545	2024/01/02	2024/01/03	2024/01/04	8	43	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556467	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600002545	2024/01/02	2024/01/03	2024/01/04	8	1,555	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos

GMU2	674556467	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600002545	2024/01/02	2024/01/03	2024/01/04	8	479	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556471	10	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600003895	2024/01/02	2024/01/03	2024/03/12	8	36	1	-69	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556471	20	97702505	Acc.connector PV-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600003895	2024/01/02	2024/01/03	2024/03/19	16	29	1	-76	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556471	30	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600003895	2024/01/02	2024/01/03	2024/03/12	8	120	1	-69	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556471	40	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/01/02	2024/01/03	2024/03/12	16	1,555	1	-69	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556471	50	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600003895	2024/01/02	2024/01/03	2024/03/12	16	479	1	-69	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556471	60	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003895	2024/01/02	2024/01/03	2024/03/12	16	728	1	-69	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556494	10	97722760	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602005415	2024/01/02	2024/01/12	2024/05/23	5	4	10	-132	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674556511	10	97721102	DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-310003BG	600004330	2024/01/02	2024/01/05	2024/01/08	1	2	3	-3	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674556516	10	97721110	DDE 6-10 P-PV/V/C-X-310003BG	600004330	2024/01/02	2024/01/03	2024/01/04	1	7	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556585	10	99159490	DDA 200-4 FCM-PVC/V/C-F-31A7A7BG	602023629	2024/01/11	2024/01/10	2024/01/12	1	2	-1	-2	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556644	10	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600003895	2024/01/03	2024/01/03	2024/01/04	12	36	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556644	20	97702505	Acc.connector PV-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600003895	2024/01/03	2024/01/03	2024/01/10	24	29	0	-7	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556644	30	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600003895	2024/01/03	2024/01/03	2024/01/04	12	120	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556644	40	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/01/03	2024/01/03	2024/01/04	24	1,555	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556644	50	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600003895	2024/01/03	2024/01/03	2024/01/04	24	479	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556644	60	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003895	2024/01/03	2024/01/03	2024/01/04	24	728	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556686	10	99406010	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C with acc. SUEZ US	600003895	2024/01/03	2024/01/03	2024/03/01	2	0	0	-58	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674556705	10	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-310003BG	600003895	2024/01/03	2024/01/30	2024/02/23	4	2	27	-24	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674556737	30	97691905	Acc.connector PP-U7,inch tubing comb.	602001430	2024/01/03	2024/01/04	2024/01/05	3	411	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556741	10	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600005597	2024/01/03	2024/01/03	2024/01/05	1	74	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556779	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602001430	2024/01/04	2024/01/05	2024/01/08	2	1,605	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556783	10	99159483	DDA 200-4 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	602005395	2024/01/04	2024/01/05	2024/01/08	1	15	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556785	20	98070958	FV-NL-G5/8 PV/T/C U7	602008859	2024/01/04	2024/01/05	2024/01/12	1	209	1	-7	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556785	50	98070955	FV-NL-G5/8 PE/V,E/C U7	602008859	2024/01/04	2024/01/05	2024/01/12	2	162	1	-7	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556806	10	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000043	2024/01/04	2024/01/03	2024/01/05	1	53	-1	-2	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556819	10	98071078	RSL-0400-2L-G5/8 PE/V,E/C U7	602005415	2024/01/04	2024/01/04	2024/01/05	1	7	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557003	30	99406010	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C with acc. SUEZ US	600003895	2024/01/04	2024/01/09	2024/03/01	1	0	5	-52	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674557014	10	95730818	MFV-G5/8-10 PV/V U7	600004075	2024/01/05	2024/01/05	2024/01/08	24	260	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557015	10	99082040	Acc.connector PVC-A7, thread.3/4" NPT	600004055	2024/01/05	2024/01/05	2024/01/08	4	43	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557050	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602005395	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	5	1,581	3	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557090	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004075	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/09	2	765	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557092	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004075	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/09	2	765	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557213	10	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600004150	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/09	2	511	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557215	10	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-310003BG	600000063	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/09	1	12	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557215	20	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	600000063	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/09	1	164	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557224	20	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2024/01/05	2024/01/18	2024/02/21	14	0	13	-34	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674557231	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004075	2024/01/05	2024/01/05	2024/01/10	2	788	0	-5	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557232	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004075	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/10	2	765	3	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557233	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004075	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/10	2	765	3	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557250	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004075	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/10	2	765	3	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557251	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004075	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/10	2	765	3	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557254	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004330	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	1	765	3	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557314	10	99082042	Acc.connector PVDf-A7, thread.3/4"NPT	602011805	2024/01/08	2024/01/08	2024/01/09	2	44	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557324	10	97722658	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602025358	2024/01/08	2024/01/22	2024/01/23	2	6	14	-1	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674557327	10	99159468	DDA 120-7 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600000158	2024/01/08	2024/01/09	2024/01/15	1	23	1	-6	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557327	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000158	2024/01/08	2024/01/09	2024/01/15	1	1,557	1	-6	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557339	10	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600000158	2024/01/08	2024/01/09	2024/01/18	2	60	1	-9	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557339	20	97702505	Acc.connector PV-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600000158	2024/01/08	2024/01/09	2024/01/18	2	21	1	-9	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557370	30	95730815	MFV-G5/8-10 PVC/V U7	600000158	2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	2	100	1	-7	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557383	20	96529118	DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A4A4B	600004330	2024/01/08	2024/01/31	2024/04/01	2	3	23	-61	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674557407	10	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600003895	2024/01/08	2024/01/10	2024/02/07	4	13	2	-28	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557407	20	97702505	Acc.connector PV-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600003895	2024/01/08	2024/01/10	2024/02/07	8	74	2	-28	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557407	30	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600003895	2024/01/08	2024/01/10	2024/02/07	4	106	2	-28	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557407	40	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/01/08	2024/01/10	2024/02/07	8	1,617	2	-28	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557407	50	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600003895	2024/01/08	2024/01/10	2024/02/07	8	482	2	-28	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557407	60	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003895	2024/01/08	2024/01/10	2024/02/07	8	731	2	-28	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557462	10	95730914	Inject. unit 0200-16 PVC/V/C 4U7-21/100	6000000158	2024/01/08	2024/01/09	2024/01/18	1	134	1	-9	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557462	30	97691905	Acc.connector PP-U7,inch tubing comb.	6000000158	2024/01/08	2024/01/09	2024/01/18	2	394	1	-9	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos

GMU2	674557464	10	96529006	DME 375-10 AR-PP/E/G-F-31A4A4B	600004857	2024/01/08	2024/01/09	2024/01/10	6	16	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557493	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602051614	2024/01/08	2024/01/08	2024/01/10	10	1,581	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557559	10	97722662	DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	602005395	2024/01/09	2024/01/10	2024/01/15	1	14	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557574	10	97722475	DDA 12-10 AR-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600000158	2024/01/09	2024/01/11	2024/01/15	2	4	2	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557574	20	95730500	Install. Kit 1006 PVC/T/C-1/4"x3/8"-NL	600000158	2024/01/09	2024/01/11	2024/01/15	2	25	2	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557627	10	97722358	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-311003BG	600000043	2024/01/09	2024/01/10	2024/01/11	1	6	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557689	10	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	602051614	2024/01/09	2024/01/09	2024/03/14	1	1	0	-65	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674557709	30	98589048	Acc. cable 3 m, GENibus, straight	600000242	2024/01/09	2024/01/10	2024/05/14	3	66	1	-125	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674557736	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004075	2024/01/10	2024/01/10	2024/01/11	24	1,617	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557736	20	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600004075	2024/01/10	2024/01/10	2024/01/11	100	656	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557741	10	97722382	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-311003BG	600000063	2024/01/10	2024/01/10	2024/02/12	1	1	0	-33	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674557804	10	95730493	Install. Kit 1003 PV/V/C-0.17"x1/4"-NL	600000158	2024/01/10	2024/01/11	2024/01/15	2	119	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557812	50	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602001430	2024/01/10	2024/01/11	2024/01/15	1	482	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557812	60	98589048	Acc. cable 3 m, GENibus, straight	602001430	2024/01/10	2024/01/11	2024/01/15	1	66	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557812	80	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602001430	2024/01/10	2024/01/11	2024/01/15	1	721	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557815	10	99159460	DDA 60-10 AR-SS/T/SS-F-31A3A3BG	600000088	2024/01/10	2024/01/11	2024/01/15	1	4	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557819	10	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600006570	2024/01/10	2024/01/11	2024/01/15	3	44	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557825	10	95730493	Install. Kit 1003 PV/V/C-0.17"x1/4"-NL	600000158	2024/01/10	2024/01/11	2024/01/16	3	119	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557890	10	97722761	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-311004BG	600006570	2024/01/10	2024/01/11	2024/01/16	6	6	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557912	40	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	602005704	2024/01/10	2024/01/11	2024/01/12	1	23	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557961	10	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600000096	2024/01/10	2024/01/19	2024/01/31	1	1	9	-12	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558008	10	95730492	Install. Kit 1003 PVC/T/C-0.17"x1/4"-NL	602001430	2024/01/11	2024/01/12	2024/01/15	2	110	1	-3	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674558008	20	95730817	MFV-G5/8-10 PVC/T U7	602001430	2024/01/11	2024/01/12	2024/01/15	2	43	1	-3	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674558008	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602001430	2024/01/11	2024/01/12	2024/01/15	2	721	1	-3	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674558008	40	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602001430	2024/01/11	2024/01/12	2024/01/15	2	1,575	1	-3	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674558008	50	97722373	DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31U7U7BG	602001430	2024/01/11	2024/01/12	2024/01/15	2	2	1	-3	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674558054	10	95730954	Inject. unit 0202-16 PVC/V/C 4U7-21/100	600012110	2024/01/11	2024/01/12	2024/01/17	2	2	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558054	20	95730958	Inject. unit 0202-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600012110	2024/01/11	2024/01/12	2024/01/17	1	32	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558060	20	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2024/01/11	2024/01/12	2024/02/22	1	0	1	-41	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558188	30	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/01/11	2024/01/12	2024/01/31	1	1	1	-19	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558208	10	97722544	DDA 12-10 FCM-PVC/T/C-F-311004BG	600004330	2024/01/11	2024/01/18	2024/03/15	4	0	7	-57	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558231	10	95730954	Inject. unit 0202-16 PVC/V/C 4U7-21/100	600012110	2024/01/12	2024/01/12	2024/01/17	2	2	0	-5	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558231	20	95730958	Inject. unit 0202-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600012110	2024/01/12	2024/01/12	2024/01/17	1	32	0	-5	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558245	10	97702508	Acc.connector SS-A9,pipe thread,1/2"MNPT	602001430	2024/01/12	2024/01/15	2024/01/16	4	90	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558245	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602001430	2024/01/12	2024/01/15	2024/01/16	2	1,519	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558245	40	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602001430	2024/01/12	2024/01/15	2024/01/16	2	680	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558245	50	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602001430	2024/01/12	2024/01/15	2024/01/16	2	482	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558245	60	98589048	Acc. cable 3 m, GENibus, straight	602001430	2024/01/12	2024/01/15	2024/01/16	2	63	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558247	30	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	602005395	2024/01/12	2024/01/15	2024/01/17	1	106	3	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558271	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004075	2024/01/12	2024/01/12	2024/01/15	2	721	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558271	30	97722382	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-311003BG	600004075	2024/01/12	2024/01/12	2024/02/12	2	1	0	-31	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558428	20	97702505	Acc.connector PV-A9,pipe thread,1/2"MNPT	600004330	2024/01/12	2024/01/12	2024/01/16	2	50	0	-4	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558433	20	99904127	Acc. DME4, M12 T-dist., 5 pins, B-cod.	600017539	2024/01/13	2024/01/17	2024/01/24	2	16	4	-7	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558437	10	97721162	DDE 15-4 P-PVC/E/C-X-311004BG	600004330	2024/01/13	2024/01/18	2024/02/08	1	0	5	-21	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558485	10	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600003593	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/18	1	556	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558573	10	99159454	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600004075	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/18	1	54	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558580	10	98148805	Tank 60l,PE-transp./black	602013686	2024/01/15	2024/01/15	2024/01/16	1	7	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558580	20	98148805	Tank 60l,PE-transp./black	602013686	2024/01/15	2024/01/15	2024/01/16	1	7	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558580	30	98070958	FV-NL-G5/8 PV/T/C U7	602013686	2024/01/15	2024/01/15	2024/01/16	1	193	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558580	40	95730926	Inject. unit 0200-16 PV/V/C 4U7-21/100	602013686	2024/01/15	2024/01/15	2024/01/16	1	102	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558580	50	98070958	FV-NL-G5/8 PV/T/C U7	602013686	2024/01/15	2024/01/15	2024/01/16	1	193	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558580	60	95730926	Inject. unit 0200-16 PV/V/C 4U7-21/100	602013686	2024/01/15	2024/01/15	2024/01/16	1	102	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558617	20	97722624	DDA 17-7 FC-PV/T/C-F-31U7U7BG	600006570	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/18	1	4	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558626	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600006591	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/18	4	1,511	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558626	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600006591	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/18	4	663	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558626	40	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600006591	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/18	4	465	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558632	20	95730507	Install. Kit 1004 PVC/E/C-3/8"x1/2"-NL	602001430	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/17	2	10	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558632	60	99159465	DDA 60-10 FCM-PV/V/C-F-31A7A7BG	602001430	2024/01/15	2024/01/25	2024/02/28	2	0	10	-34	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558632	70	95730816	MFV-G5/8-10 PVC/E U7	602001430	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/17	2	74	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558637	20	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602001430	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/17	1	465	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558637	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602001430	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/17	1	1,511	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558654	10	98148805	Tank 60l,PE-transp./black	602013686	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	1	7	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos

GMU2	674558654	20	95730926	Injct. unit 0200-16 PV/V/C 4U7-21/100	602013686	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	1	98	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558654	50	98070958	FV-NL-G5/8 PV/T/C U7	602013686	2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	1	193	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558654	70	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-32U7U7BG	602013686	2024/01/15	2024/01/16	2024/02/23	1	0	1	-38	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558681	10	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U003BG	600004280	2024/01/16	2024/01/16	2024/01/26	9	11	0	-10	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558681	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004280	2024/01/16	2024/01/16	2024/01/26	9	1,511	0	-10	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558681	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004280	2024/01/16	2024/01/16	2024/01/26	9	465	0	-10	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558719	10	95730818	MFV-G5/8-10 PV/V U7	600004330	2024/01/16	2024/01/16	2024/01/17	1	192	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558719	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004330	2024/01/16	2024/01/16	2024/01/17	1	663	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558720	10	95730918	Injct. unit 0200-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600003890	2024/01/16	2024/01/23	2024/02/02	5	0	7	-10	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558740	20	95730509	Install. Kit 1004 PV/V/C-3/8"x1/2"-NL	600000158	2024/01/16	2024/01/17	2024/02/20	1	0	1	-34	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558747	10	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2024/01/16	2024/01/16	2024/02/22	2	0	0	-37	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558758	70	95730958	Injct. unit 0202-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600000043	2024/01/16	2024/01/17	2024/01/19	1	24	1	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558779	10	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600006570	2024/01/16	2024/01/18	2024/01/19	2	22	2	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558792	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000486	2024/01/16	2024/01/18	2024/01/23	2	659	2	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558792	50	95730727	Acc.inlays PVC-R,tubing 1/4x3/8	600000486	2024/01/16	2024/01/18	2024/01/23	2	7	2	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558953	10	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600004330	2024/01/16	2024/01/18	2024/01/19	4	654	2	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558961	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004525	2024/01/16	2024/01/16	2024/01/22	2	1,511	0	-6	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558961	20	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004525	2024/01/16	2024/01/16	2024/01/22	2	465	0	-6	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558985	10	97721098	DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-311003BG	600004330	2024/01/17	2024/01/24	2024/02/12	3	0	7	-19	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559008	10	97722475	DDA 12-10 AR-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600000158	2024/01/17	2024/01/18	2024/01/22	1	2	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559008	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000158	2024/01/17	2024/01/18	2024/01/22	1	1,507	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559008	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000158	2024/01/17	2024/01/18	2024/01/22	1	659	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559008	40	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600000158	2024/01/17	2024/01/18	2024/01/22	1	462	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559014	10	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-311003BG	602001671	2024/01/17	2024/01/18	2024/01/22	1	11	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559206	10	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600004330	2024/01/17	2024/01/18	2024/01/19	2	497	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559217	10	95730818	MFV-G5/8-10 PV/V U7	600004075	2024/01/17	2024/01/18	2024/01/19	48	191	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559218	10	97721102	DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-311003BG	600004330	2024/01/17	2024/01/24	2024/02/01	4	1	7	-8	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559345	10	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-311003BG	600004330	2024/01/18	2024/01/19	2024/01/24	1	11	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559357	10	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	602014034	2024/01/18	2024/01/18	2024/01/31	1	1	0	-13	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559407	10	97722760	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602011805	2024/01/18	2024/01/24	2024/01/25	1	0	6	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559423	10	98070973	FV-2L-G5/8 PV/T/C U7	600000043	2024/01/18	2024/01/19	2024/01/22	1	36	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559453	10	97722425	DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31U7U7BG	602004263	2024/01/18	2024/01/19	2024/01/23	1	17	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559482	10	99159469	DDA 120-7 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	602001430	2024/01/18	2024/01/19	2024/01/22	1	8	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559482	20	97722673	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-311004BG	602001430	2024/01/18	2024/01/19	2024/01/22	1	3	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559542	10	97722425	DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31U7U7BG	600000137	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/23	4	17	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559542	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000137	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/23	8	1,505	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559542	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600000137	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/23	4	460	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559543	10	99406010	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C with acc. SUEZ US	600003895	2024/01/19	2024/01/24	2024/03/06	1	0	5	-42	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559554	10	96529158	DME 940-4 AR-PP/V/G-F-31AA48	600003895	2024/01/19	2024/01/19	2024/02/14	1	0	0	-26	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559564	10	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000158	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/23	2	37	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559564	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000158	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/23	2	1,505	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559591	20	98071078	RSL-0400-2L-G5/8 PE/V,E/C U7	602013686	2024/01/19	2024/01/22	2024/02/28	2	5	3	-37	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559605	30	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	602005395	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/24	3	36	3	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559605	40	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602005395	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/24	9	1,505	3	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559608	10	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	602005415	2024/01/19	2024/01/19	2024/01/22	1	27	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559612	10	95730762	PRV-G5/8-10 PP/V,E U7	600004330	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/23	1	5	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559615	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602004263	2024/01/19	2024/01/19	2024/01/23	1	656	0	-4	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559656	20	97702505	Acc.connector PV-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600000158	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/23	9	34	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559697	10	97721094	DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-311003BG	600004330	2024/01/19	2024/01/24	2024/02/20	1	59	5	-27	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559703	10	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600000043	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/23	1	18	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559708	10	96440448	Acc. cable 5m, pulse, 0/4-20mA in, DME	600000043	2024/01/19	2024/01/11	2024/01/23	1	316	-8	-12	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559708	30	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600000043	2024/01/19	2024/01/11	2024/01/23	1	48	-8	-12	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559708	40	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600000043	2024/01/19	2024/01/11	2024/01/23	4	48	-8	-12	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559708	50	96527111	Acc.cable 5m, ext.Stop in,dosing out,DME	600000043	2024/01/19	2024/01/11	2024/01/23	2	144	-8	-12	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559708	60	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600000043	2024/01/19	2024/01/11	2024/01/23	4	44	-8	-12	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559728	10	95730750	PLV-G5/8-3 PV/T U7	600000096	2024/01/21	2024/01/29	2024/02/26	3	0	8	-28	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559729	10	97722658	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602005415	2024/01/21	2024/01/22	2024/02/01	1	6	1	-10	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674559730	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/01/21	2024/01/22	2024/01/23	2	1,505	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos

GMU2	674559732	10	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600003895	2024/01/21	2024/01/24	2024/01/31	1	8	3	-7	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674559734	10	9722760	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602011805	2024/01/21	2024/01/24	2024/01/25	1	0	3	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559901	10	96529118	DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A4A4B	600004280	2024/01/22	2024/01/31	2024/05/08	5	3	9	-98	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559979	10	97221094	DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-311003BG	600004330	2024/01/22	2024/01/23	2024/02/20	2	2	1	-28	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559982	10	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	602005415	2024/01/22	2024/01/29	2024/01/31	1	8	7	-2	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674559992	10	99406010	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C with acc. SUEZ US	600003895	2024/01/23	2024/01/24	2024/03/06	2	0	1	-42	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674560008	10	95730493	Install. Kit 1003 PV/V/C-0.17"x1/4"-NL	600000043	2024/01/23	2024/01/24	2024/02/05	2	114	1	-12	Ejecución tardía de la entrega	Ejecución tardía de la entrega	Ejecución tardía de la entrega	Área de logística
GMU2	674560110	10	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600012110	2024/01/23	2024/01/26	2024/01/31	2	8	3	-5	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674560171	10	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600003895	2024/01/23	2024/01/24	2024/01/29	2	105	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560171	20	99159478	DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600003895	2024/01/23	2024/01/24	2024/01/29	1	25	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560171	30	9722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600003895	2024/01/23	2024/01/24	2024/01/29	2	2	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560171	40	95905799	DME 375-10 AR-PV/T/C-F-31A4A4B	600003895	2024/01/23	2024/01/24	2024/03/27	3	0	1	-63	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674560171	50	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/01/23	2024/01/24	2024/01/29	5	1,480	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560171	60	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600003895	2024/01/23	2024/01/24	2024/01/29	5	427	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560171	70	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003895	2024/01/23	2024/01/24	2024/01/29	5	641	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560171	80	97702505	Acc.connector PV-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600003895	2024/01/23	2024/01/24	2024/04/04	4	24	1	-71	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560171	90	96440448	Acc. cable 5m, pulse, 0/4-20mA in, DME	600003895	2024/01/23	2024/01/24	2024/01/29	3	300	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560171	100	96534215	Acc. cable 5m, relay output, DME60-940	600003895	2024/01/23	2024/01/24	2024/01/29	3	149	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560175	20	95730509	Install. Kit 1004 PV/V/C-3/8"x1/2"-NL	600000158	2024/01/23	2024/01/24	2024/02/20	1	0	1	-27	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674560177	10	96527109	Acc.cable 2m, ext.Stop in,dosing out,DME	600003895	2024/01/23	2024/01/26	2024/01/29	3	17	3	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560216	10	95730818	MFV-G5/8-10 PV/V U7	602001430	2024/01/23	2024/01/24	2024/01/25	4	142	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560216	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602001430	2024/01/23	2024/01/24	2024/01/25	15	1,480	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560226	10	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004150	2024/01/23	2024/01/24	2024/01/25	1	427	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560226	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004150	2024/01/23	2024/01/24	2024/01/25	1	641	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560242	20	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600004330	2024/01/23	2024/01/30	2024/02/20	1	1	7	-21	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560243	10	97221102	DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-311003BG	600004330	2024/01/23	2024/01/25	2024/01/26	1	1	2	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560316	40	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600000158	2024/01/24	2024/01/25	2024/01/30	1	33	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560337	10	95730490	Install. Kit 1003 PVC/V/C-0.17"x1/4"-NL	600000137	2024/01/24	2024/01/24	2024/01/25	4	189	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560395	10	95730818	MFV-G5/8-10 PV/V U7	600004150	2024/01/24	2024/01/25	2024/01/26	4	142	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560498	20	9722659	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-311004BG	600004330	2024/01/24	2024/01/31	2024/02/20	1	8	7	-20	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560498	30	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600004330	2024/01/24	2024/01/31	2024/02/20	1	51	7	-20	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560514	10	99159474	DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A3A3BG	602005395	2024/01/25	2024/01/26	2024/01/29	1	1	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560584	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/01/25	2024/01/26	2024/02/01	1	1,455	1	-6	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560612	10	97222385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600001985	2024/01/25	2024/01/26	2024/01/29	1	31	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560644	20	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread.1/2"MNPT	602001430	2024/01/25	2024/01/26	2024/01/29	2	24	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560756	10	95730747	PLV-G5/8-3 PVC/V,E U7	600012799	2024/01/26	2024/01/29	2024/03/25	1	0	3	-56	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674560810	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000059	2024/01/26	2024/01/29	2024/01/31	2	1,438	3	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560810	40	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600000059	2024/01/26	2024/01/29	2024/01/31	6	397	3	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560919	10	95730914	Inject. unit 0200-16 PVC/V/C 4U7-21/100	600000158	2024/01/26	2024/01/30	2024/02/01	5	66	4	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560936	10	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	602005415	2024/01/26	2024/01/29	2024/01/31	3	8	3	-2	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674560944	10	97221063	DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31U7U7BG	600000158	2024/01/26	2024/01/30	2024/01/31	2	7	4	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560960	10	9722689	DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-311004BG	600002345	2024/01/26	2024/01/29	2024/02/08	1	0	3	-10	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674561002	10	9722672	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	602001671	2024/01/29	2024/01/30	2024/01/31	1	1	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561228	10	96529006	DME 375-10 AR-PP/E/G-F-31A4A4B	600004150	2024/01/29	2024/01/30	2024/01/31	1	8	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561273	10	9722672	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	602001430	2024/01/29	2024/01/30	2024/02/23	1	1	1	-24	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561294	10	9722692	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600004330	2024/01/29	2024/01/31	2024/03/18	10	3	2	-47	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674561328	10	97222383	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-32U7U7BG	602049531	2024/01/30	2024/01/31	2024/02/01	1	8	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561328	20	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602049531	2024/01/30	2024/01/31	2024/02/01	1	365	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561370	10	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602004263	2024/01/30	2024/01/31	2024/02/01	2	365	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561370	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602004263	2024/01/30	2024/01/31	2024/02/01	2	536	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561426	20	98070958	FV-NL-G5/8 PV/T/C U7	600000158	2024/01/30	2024/01/31	2024/02/01	2	132	1	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561469	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000043	2024/01/30	2024/01/30	2024/01/31	6	611	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561469	30	9722366	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-311003BG	600000043	2024/01/30	2024/01/30	2024/01/31	2	10	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561469	40	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000043	2024/01/30	2024/01/30	2024/01/31	6	611	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561469	50	97221063	DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31U7U7BG	600000043	2024/01/30	2024/01/30	2024/01/31	1	7	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561469	60	97222370	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311003BG	600000043	2024/01/30	2024/01/30	2024/01/31	1	67	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561469	70	95730815	MFV-G5/8-10 PVC/V U7	600000043	2024/01/30	2024/01/30	2024/01/31	1	81	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561469	90	99904127	Acc. DME4, M12 T-distrr., 5 pins, B-cod.	600000043	2024/01/30	2024/01/30	2024/02/02	3	14	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561568	10	97222370	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311003BG	600017539	2024/01/30	2024/01/31	2024/03/08	4	67	1	-37	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561582	10	97222389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	602004263	2024/01/30	2024/01/31	2024/02/01	1	17	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561690	10	98070958	FV-NL-G5/8 PV/T/C U7	602013686	2024/01/31	2024/01/31	2024/02/01	8	132	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos

GMU2	674561763	10	97722358	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-311003BG	600004150	2024/01/31	2024/01/31	2024/02/01	1	3	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561795	10	99159478	DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	602005415	2024/01/31	2024/01/31	2024/02/01	1	23	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557351	10	97722692	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	602010784	2024/01/08	2024/01/08	2024/02/19	12	0	0	-42	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559158	10	97722760	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602011805	2024/01/17	2024/01/24	2024/04/22	10	0	7	-89	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674555572	10	97721064	DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-311003BG	600004075	2023/12/21	2024/02/14	2024/02/20	10	16	55	-6	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674557928	10	99171932	E-box 500, Ethernet DDA	602005415	2024/02/03	2024/02/05	2024/02/26	3	4	2	-21	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674558017	10	97722696	DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600004040	2024/01/11	2024/02/14	2024/03/01	1	5	34	-16	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674560447	10	97722696	DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600003165	2024/01/24	2024/02/14	2024/03/01	2	5	21	-16	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674560978	40	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600012110	2024/01/28	2024/02/02	2024/02/05	1	37	5	-3	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674560978	20	99171932	E-box 500, Ethernet DDA	600012110	2024/01/28	2024/02/02	2024/02/15	1	27	5	-13	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674562033	40	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/02/01	2024/02/02	2024/02/19	3	8	1	-17	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674562609	10	97722659	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-311004BG	600004330	2024/02/06	2024/02/09	2024/02/12	1	8	3	-3	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674562610	10	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600004330	2024/02/06	2024/02/09	2024/02/20	1	18	3	-11	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674562842	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/02/06	2024/02/08	2024/02/14	1	1,330	2	-6	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562896	40	97721060	DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-311003BG	600000158	2024/02/06	2024/02/08	2024/02/12	1	84	2	-4	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674563593	10	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600012044	2024/02/09	2024/02/12	2024/02/19	8	180	3	-7	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562858	10	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600012110	2024/02/07	2024/02/09	2024/02/20	1	18	2	-11	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674566375	20	97702493	Acc.connector PVC-S,tubing 3/8x1/2	600000486	2024/02/26	2024/02/27	2024/03/05	2	33	1	-7	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674566375	80	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000486	2024/02/26	2024/02/27	2024/03/05	6	1,063	1	-7	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674563705	60	97722373	DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600000043	2024/02/13	2024/02/14	2024/02/16	1	3	1	-2	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674564145	10	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600004150	2024/02/13	2024/02/14	2024/02/21	1	21	1	-7	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564734	10	97722659	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-311004BG	602005415	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/20	1	7	3	-1	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674563170	10	95730503	Install. Kit 1006 PV/T/C-1/4"x3/8"-NL	600004330	2024/02/08	2024/02/12	2024/02/26	1	55	4	-14	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560750	10	98070958	FV-NL-G5/8 PV/T/C U7	600003890	2024/01/25	2024/02/08	2024/02/23	1	139	14	-15	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560750	20	95730816	MFV-G5/8-10 PVC/E U7	600003890	2024/01/25	2024/02/08	2024/02/23	1	55	14	-15	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565092	10	97722425	DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31U7U7BG	602004263	2024/02/19	2024/02/21	2024/02/23	1	5	2	-2	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674565304	60	97722442	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-311003BG	600000469	2024/02/20	2024/02/29	2024/03/05	3	4	9	-5	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674565695	20	99169412	Inject. unit 0300-10 PVC/E/C 4A7-31/120	602050524	2024/02/21	2024/02/22	2024/02/27	4	5	1	-5	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674562065	10	97722594	DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600004330	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/27	2	10	7	-19	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565946	50	97721060	DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-311003BG	600004280	2024/02/22	2024/02/23	2024/02/29	1	10	1	-6	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674562333	10	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	600004330	2024/02/03	2024/02/05	2024/02/26	2	2	2	-21	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674561026	10	98070958	FV-NL-G5/8 PV/T/C U7	600004330	2024/01/29	2024/02/05	2024/03/05	12	133	7	-29	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674548999	10	97722472	DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-311004BG	600004389	2023/11/13	2024/02/01	2024/02/20	2	0	80	-19	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674549869	10	99159454	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600000141	2023/11/17	2024/02/16	2024/02/26	100	99	91	-10	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674553044	10	97722434	DDA 7.5-16 FCM-PVC/E/C-F-311003BG	600004330	2023/12/08	2024/02/19	2024/03/05	4	0	73	-15	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674553122	10	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	600006570	2023/12/08	2024/02/13	2024/02/20	1	2	67	-7	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554801	20	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C-F-32U7U7BG	600003895	2023/12/18	2024/02/09	2024/02/23	2	0	53	-14	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674555323	70	97721060	DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-311003BG	600000486	2023/12/21	2024/02/02	2024/02/08	80	74	43	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674556196	70	97722381	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-31U7U7BG	600000158	2023/12/29	2024/02/07	2024/02/20	3	0	40	-13	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674556586	10	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	600004280	2024/01/03	2024/02/09	2024/02/23	1	2	37	-14	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674557964	10	99406010	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C with acc. SUEZ US	600003895	2024/01/11	2024/02/08	2024/03/01	1	0	28	-22	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558686	10	97722745	DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-311004BG	600004330	2024/01/16	2024/02/12	2024/03/01	2	0	0	-18	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674560422	10	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-311003BG	602049764	2024/01/24	2024/02/09	2024/02/23	2	0	16	-14	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674560493	10	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600004075	2024/01/24	2024/02/08	2024/02/12	1	0	15	-4	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674560937	10	99171932	E-box 500, Ethernet DDA	602005415	2024/01/26	2024/02/14	2024/02/15	5	0	19	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674560956	10	97722438	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-311003BG	600004330	2024/01/26	2024/02/02	2024/03/05	4	0	7	-32	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674561700	20	97722689	DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-311004BG	602023629	2024/01/31	2024/02/07	2024/02/08	1	0	7	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674561730	40	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	602010404	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/26	2	2	1	-25	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674561820	10	97721102	DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-311003BG	600004330	2024/01/31	2024/02/01	2024/03/01	4	24	1	-29	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674561821	10	97721094	DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-311003BG	600004330	2024/01/31	2024/02/07	2024/02/20	1	0	7	-13	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674561834	30	97722365	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600000469	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/12	3	0	7	-4	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674562033	30	97722438	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-311003BG	600004280	2024/02/01	2024/02/02	2024/03/05	2	0	1	-32	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674562033	90	99159485	DDA 200-4 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/02/01	2024/02/02	2024/02/19	1	0	1	-17	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674562329	10	97722457	DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600003895	2024/02/02	2024/02/14	2024/02/20	1	0	12	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674562696	20	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600000158	2024/02/06	2024/02/08	2024/02/12	1	0	2	-4	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674562709	10	97722643	DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-311004BG	600004330	2024/02/06	2024/02/13	2024/03/01	1	0	7	-17	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674562710	10	97721094	DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-311003BG	600004330	2024/02/06	2024/02/13	2024/02/20	1	0	7	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674562850	10	97721094	DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-311003BG	600004330	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/20	2	0	1	-13	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674563128	10	97722442	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-311003BG	600004330	2024/02/07	2024/02/14	2024/03/01	1	0	7	-16	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674563269	30	97722442	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-311003BG	600004330	2024/02/08	2024/02/08	2024/03/01	1	0	0	-22	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674563323	10	97722655	DDA 17-7 FCM-PV/V/C-F-311004BG	600004330	2024/02/08	2024/02/16	2024/02/23	1	0	8	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674563350	10	97722457	DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600004330	2024/02/08	2024/02/12	2024/02/20	1	0	4	-8	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674563350	20	97722442	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-311003BG	600004330	2024/02/08	2024/02/12	2024/03/01	1	0	4	-18	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674563432	10	97721094	DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-311003BG	600004330	2024/02/08	2024/02/12	2024/02/20	1	0	4	-8	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674563482	40	97722382	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-311003BG	600000469	2024/02/09	2024/02/22	2024/02/27	10	6	13	-5	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación

GMU2	674565192	20	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600012110	2024/02/20	2024/02/14	2024/02/26	2	0	-6	-12	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674565735	10	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2024/02/22	2024/02/20	2024/02/26	1	0	-2	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674565903	10	97722437	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600003895	2024/02/22	2024/02/23	2024/02/26	1	0	1	-3	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674565931	30	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600000158	2024/02/22	2024/02/23	2024/03/05	15	0	1	-11	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674565946	80	97722688	DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/02/22	2024/02/23	2024/02/26	1	0	1	-3	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674565946	130	99159462	DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/02/22	2024/02/23	2024/02/26	2	0	1	-3	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674566180	10	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31I003BG	600006570	2024/02/23	2024/02/27	2024/02/28	1	14	4	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562347	10	99159471	DDA 120-7 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600003895	2024/02/03	2024/02/05	2024/02/07	1	0	2	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674565192	10	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2024/02/20	2024/02/14	2024/02/23	2	0	-6	-9	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554394	20	97722672	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600000059	2023/12/15	2024/02/23	2024/02/26	1	10	70	-3	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562257	30	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread,1/2"MNPT	600000463	2024/02/05	2024/02/02	2024/02/07	5	15	-3	-5	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565001	10	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000043	2024/02/19	2024/02/12	2024/02/20	1	322	-7	-8	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565192	30	98071139	RSL-0980-2L-G5/8 PE/T/C U7	600012110	2024/02/20	2024/02/14	2024/02/26	2	18	-6	-12	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565192	40	95730958	Inject. unit 0202-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600012110	2024/02/20	2024/02/14	2024/02/26	3	20	-6	-12	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565194	10	95730926	Inject. unit 0200-16 PV/V/C 4U7-21/100	600000043	2024/02/20	2024/02/05	2024/02/22	1	110	-15	-17	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565194	20	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread,1/2"MNPT	600000043	2024/02/20	2024/02/05	2024/02/22	5	15	-15	-17	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565194	30	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600000043	2024/02/20	2024/02/05	2024/02/22	4	37	-15	-17	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565194	40	95730511	Install. Kit I004 PV/T/C-3/8"x1/2"-NL	600000043	2024/02/20	2024/02/05	2024/02/22	5	116	-15	-17	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565735	20	95730954	Inject. unit 0202-16 PVC/V/C 4U7-21/100	600012110	2024/02/22	2024/02/20	2024/02/26	1	18	-2	-6	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565735	30	98071139	RSL-0980-2L-G5/8 PE/T/C U7	600012110	2024/02/22	2024/02/20	2024/02/26	1	18	-2	-6	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565735	40	95730817	MFV-G5/8-10 PVC/T U7	600012110	2024/02/22	2024/02/20	2024/02/26	1	48	-2	-6	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565852	10	98070955	FV-NL-G5/8 PE/V,E/C U7	600012110	2024/02/22	2024/02/19	2024/02/23	6	158	-3	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561663	40	97691905	Acc.connector PP-U7,inch tubing comb.	600000158	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	4	390	1	-5	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562472	50	95730491	Install. Kit I003 PVC/E/C-0.17"x1/4"-NL	600000158	2024/02/05	2024/02/06	2024/02/08	2	44	1	-2	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562472	70	97691905	Acc.connector PP-U7,inch tubing comb.	600000158	2024/02/05	2024/02/06	2024/02/08	4	388	1	-2	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562860	30	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread,1/2"MNPT	600000043	2024/02/07	2024/02/09	2024/02/12	4	195	2	-3	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674563061	50	99159478	DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600000158	2024/02/07	2024/02/08	2024/02/12	1	19	1	-4	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674563061	100	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600000158	2024/02/07	2024/02/08	2024/02/12	2	334	1	-4	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674563502	10	98070973	FV-2L-G5/8 PV/T/C U7	600000469	2024/02/09	2024/02/13	2024/02/15	1	30	4	-2	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674563502	60	98589048	Acc. cable 3 m, GENibus, straight	600000469	2024/02/09	2024/02/13	2024/02/15	5	100	4	-2	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674563502	80	96698715	Acc.plugin,control or level input,straight	600000469	2024/02/09	2024/02/13	2024/02/15	2	55	4	-2	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674563502	90	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600000469	2024/02/09	2024/02/13	2024/02/15	5	324	4	-2	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674563861	10	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600000158	2024/02/12	2024/02/13	2024/02/15	15	324	1	-2	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674563861	20	98070955	FV-NL-G5/8 PE/V,E/C U7	600000158	2024/02/12	2024/02/13	2024/02/15	15	177	1	-2	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674564080	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602001571	2024/02/13	2024/02/14	2024/02/15	10	1,182	1	-1	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674564080	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602001571	2024/02/13	2024/02/14	2024/02/15	5	460	1	-1	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674564080	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602001571	2024/02/13	2024/02/14	2024/02/15	10	317	1	-1	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674564080	40	96440448	Acc. cable 5m, pulse, 0/4-20mA in, DME	602001571	2024/02/13	2024/02/14	2024/02/15	2	289	1	-1	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674564080	50	96534215	Acc. cable 5m, relay output, DME60-940	602001571	2024/02/13	2024/02/14	2024/02/15	1	140	1	-1	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674564080	60	96527111	Acc.cable 5m, ext.Stop in,dosing out,DME	602001571	2024/02/13	2024/02/14	2024/02/15	2	130	1	-1	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562349	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/02/03	2024/02/05	2024/02/07	1	1,358	2	-2	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566059	30	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600006570	2024/02/23	2024/02/27	2024/02/28	1	14	4	-1	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562859	30	95730818	MFV-G5/8-10 PV/V U7	600000043	2024/02/07	2024/02/08	2024/02/12	1	133	1	-4	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563552	60	99159481	DDA 120-7 FCM-SS/T/SS-F-31A3A3BG	600006570	2024/02/09	2024/02/13	2024/02/15	1	12	4	-2	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566484	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003890	2024/02/26	2024/02/27	2024/03/01	6	354	1	-3	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566484	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003890	2024/02/26	2024/02/27	2024/03/01	6	1,063	1	-3	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561600	10	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600004280	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/02	1	17	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561661	10	99159486	DDA 200-4 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600004150	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/05	1	16	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561682	10	99159474	DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A3A3BG	602005395	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/05	1	9	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561742	10	99159478	DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600000382	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/02	3	23	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562033	50	99159456	DDA 60-10 AR-PV/E/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/02/01	2024/02/02	2024/02/06	1	24	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562033	60	99159465	DDA 60-10 FCM-PV/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/02/01	2024/02/02	2024/02/06	1	4	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562033	70	99159469	DDA 120-7 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/02/01	2024/02/02	2024/02/06	2	10	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos

GMU2	674562033	80	99159475	DDA 120-7 FCM-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/02/01	2024/02/02	2024/02/06	1	1	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562112	10	97722662	DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	602005395	2024/02/02	2024/02/05	2024/02/07	1	13	3	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562185	10	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600004330	2024/02/02	2024/02/05	2024/02/06	1	102	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562283	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602001430	2024/02/02	2024/02/05	2024/02/07	1	1,358	3	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562491	10	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	602004263	2024/02/05	2024/02/06	2024/02/07	1	339	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562653	10	97722369	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	602001671	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/08	1	30	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563079	10	97722569	DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	602001430	2024/02/07	2024/02/08	2024/02/09	1	12	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566180	20	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600006570	2024/02/23	2024/02/27	2024/02/28	1	47	4	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563939	20	95730503	Install. Kit 1006 PV/T/C-1/4"x3/8"-NL	600006591	2024/02/12	2024/02/13	2024/02/15	2	55	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563939	30	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	600006591	2024/02/12	2024/02/13	2024/02/15	2	180	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563939	40	96632921	Acc. cable 2m, analog output, straight	600006591	2024/02/12	2024/02/13	2024/02/15	2	122	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564629	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004280	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/19	10	445	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564629	20	97722676	DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/19	2	17	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564629	70	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/19	1	7	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564629	80	99159467	DDA 60-10 FCM-SS/T/SS-F-31A3A3BG	600004280	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/19	4	46	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564676	10	97722673	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-311004BG	600000059	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/19	1	14	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566246	10	97722358	DDA 7.5-16 AR-PV/E/C-F-311003BG	600000395	2024/02/26	2024/02/27	2024/02/28	1	14	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565402	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000045	2024/02/20	2024/02/21	2024/02/23	2	1,126	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565651	10	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600000158	2024/02/21	2024/02/22	2024/02/26	1	10	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566482	10	97721094	DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-311003BG	600004330	2024/02/26	2024/02/27	2024/02/28	2	9	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565891	10	97722383	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-32U7U7BG	600004280	2024/02/22	2024/02/23	2024/02/26	1	8	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565894	10	99159457	DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	602001430	2024/02/22	2024/02/23	2024/02/26	1	18	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565914	10	95905941	DME 940-4 AR-PP/E/G-F-31A4A4B	600003165	2024/02/22	2024/02/23	2024/02/27	1	10	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565986	10	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	600000063	2024/02/22	2024/02/23	2024/02/26	2	158	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565986	20	96632921	Acc. cable 2m, analog output, straight	600000063	2024/02/22	2024/02/23	2024/02/26	2	110	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566012	10	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	600000535	2024/02/23	2024/02/26	2024/02/27	1	9	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566078	10	97722370	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311003BG	600004280	2024/02/23	2024/02/26	2024/02/27	1	59	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566964	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000045	2024/02/28	2024/02/29	2024/03/01	1	335	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566394	10	99159467	DDA 60-10 FCM-SS/T/SS-F-31A3A3BG	600004055	2024/02/26	2024/02/27	2024/03/01	1	42	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566394	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004055	2024/02/26	2024/02/27	2024/03/01	1	1,063	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566394	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004055	2024/02/26	2024/02/27	2024/03/01	1	281	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561774	10	97722693	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-311004BG	600004150	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/05	1	5	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564090	10	97722365	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	602023702	2024/02/13	2024/02/14	2024/02/15	1	5	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565931	40	97722468	DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-311004BG	600000158	2024/02/22	2024/02/23	2024/02/26	1	3	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565967	10	99159485	DDA 200-4 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600004150	2024/02/22	2024/02/23	2024/02/26	2	10	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561687	70	95730495	Install. Kit 1003 PV/T/C-0.17"x1/4"-NL	600000486	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	1	181	1	-5	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674561704	10	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600006570	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	2	17	1	-6	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562139	10	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600001985	2024/02/02	2024/02/05	2024/02/06	1	15	3	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562215	30	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	602049764	2024/02/02	2024/02/05	2024/02/06	1	25	3	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562220	10	95730815	MFV-G5/8-10 PVC/U7	600005455	2024/02/02	2024/02/05	2024/02/06	1	76	3	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674565548	10	95730922	Injct. unit 0200-16 PVC/T/C 4U7-21/100	602049764	2024/02/21	2024/02/22	2024/02/23	2	42	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562818	20	97721080	DDE 6-10 B-PV/T/C-X-311003BG	602049764	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/08	4	34	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562990	20	95730922	Injct. unit 0200-16 PVC/T/C 4U7-21/100	602049764	2024/02/07	2024/02/08	2024/02/09	2	44	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562990	50	98070955	FV-NL-G5/8 PE/V,E/C U7	602049764	2024/02/07	2024/02/08	2024/02/09	1	178	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674564428	10	95730815	MFV-G5/8-10 PVC/V U7	602004263	2024/02/14	2024/02/15	2024/02/16	1	73	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674564571	20	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600004857	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/20	4	304	1	-4	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674564672	10	98070957	FV-NL-G5/8 PV/V,E/C U7	600004330	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/19	5	14	1	-3	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674564672	20	95730914	Injct. unit 0200-16 PVC/V/C 4U7-21/100	600004330	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/19	4	63	1	-3	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674564925	30	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	602005704	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/21	1	19	3	-2	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674566461	10	95730926	Injct. unit 0200-16 PV/V/C 4U7-21/100	602001430	2024/02/26	2024/02/27	2024/02/28	1	90	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674565102	10	97722588	DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-32U7U7BG	600006591	2024/02/19	2024/02/20	2024/02/21	1	3	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674566461	30	98070956	FV-NL-G5/8 PE/T/C U7	602001430	2024/02/26	2024/02/27	2024/02/28	1	68	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674565471	10	97722569	DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600002545	2024/02/21	2024/02/22	2024/02/26	1	10	1	-4	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674565472	10	97722574	DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600002545	2024/02/21	2024/02/22	2024/02/26	1	6	1	-4	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674566461	120	96440448	Acc. cable 5m, pulse, 0/4-20mA in, DME	602001430	2024/02/26	2024/02/27	2024/02/28	1	287	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674565633	10	97722693	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-311004BG	600000486	2024/02/21	2024/02/22	2024/02/27	1	3	1	-5	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674565633	20	97722693	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-311004BG	600000486	2024/02/21	2024/02/22	2024/02/27	1	3	1	-5	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674566572	10	97722666	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-311003BG	600005455	2024/02/27	2024/02/28	2024/02/29	1	10	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas

GMU2	674566114	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602022119	2024/02/23	2024/02/26	2024/02/27	2	1,066	3	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674566953	30	97702494	Acc.connect. PVC-AR,pipe thread,1/2"MNPT	602001430	2024/02/28	2024/02/29	2024/03/01	6	146	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674566953	60	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602001430	2024/02/28	2024/02/29	2024/03/01	14	1,026	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674566953	70	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602001430	2024/02/28	2024/02/29	2024/03/01	5	281	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674565196	80	99159457	DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600000158	2023/12/29	2024/02/19	2024/02/20	4	29	52	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565196	120	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	600000158	2023/12/29	2024/02/09	2024/02/20	2	2	42	-11	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560782	10	97722437	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600000469	2024/01/26	2024/02/05	2024/02/06	1	2	10	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674560782	50	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000469	2024/01/26	2024/02/05	2024/02/06	2	25	10	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561848	20	97721060	DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-311003BG	600000158	2024/02/01	2024/02/02	2024/02/06	1	74	1	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562811	30	95730918	Inject. unit 0200-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600000158	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/29	4	32	1	-22	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563200	10	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000158	2024/02/08	2024/02/09	2024/02/15	10	322	1	-6	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563531	30	97722446	DDA 7.5-16 FCM-PV/E/C-F-311003BG	600000158	2024/02/09	2024/02/12	2024/02/22	1	1	3	-10	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564600	70	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600000158	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/20	20	304	1	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565419	30	97722382	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-311003BG	600000158	2024/02/20	2024/02/21	2024/02/22	3	7	1	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566191	10	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-311003BG	600000158	2024/02/23	2024/02/26	2024/03/05	2	18	3	-8	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557328	20	96529120	DME 375-10 AR-SS/V/SS-F-31A4A4B	600004856	2024/02/29	2024/02/29	2024/03/01	3	3	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674561833	20	98070956	FV-NL-G5/8 PE/T/C U7	600000043	2024/02/01	2024/02/01	2024/02/02	2	74	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562182	10	97722445	DDA 7.5-16 FCM-PV/E/C-F-31U7U7BG	600000096	2024/02/02	2024/02/02	2024/02/22	1	1	0	-20	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562596	10	97722575	DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-311004BG	600004389	2024/02/06	2024/02/06	2024/02/09	3	4	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562597	10	99159456	DDA 60-10 AR-PV/E/C-F-31A7A7BG	600004389	2024/02/06	2024/02/06	2024/02/08	4	22	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562677	10	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	602049764	2024/02/06	2024/02/06	2024/02/07	1	25	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562744	10	97722358	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-311003BG	600004150	2024/02/06	2024/02/06	2024/02/07	1	2	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562859	50	95730818	MFV-G5/8-10 PV/U U7	600000043	2024/02/07	2024/02/07	2024/02/12	1	133	0	-5	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562990	40	97702494	Acc.connect. PVC-AR,pipe thread,1/2"MNPT	602049764	2024/02/07	2024/02/08	2024/02/09	14	195	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563216	10	97722569	DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600000025	2024/02/08	2024/02/08	2024/02/09	1	12	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563269	10	97722457	DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600004330	2024/02/08	2024/02/08	2024/02/20	1	2	0	-12	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563269	20	97721098	DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-311003BG	600004330	2024/02/08	2024/02/08	2024/02/12	1	2	0	-4	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563269	40	97721098	DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-311003BG	600004330	2024/02/08	2024/02/08	2024/02/12	1	2	0	-4	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563638	10	97722383	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-32U7U7BG	600000158	2024/02/09	2024/02/09	2024/02/12	1	7	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563910	10	99159486	DDA 200-4 AR-PP/V/C-F-31A7A7BG	600000043	2024/02/12	2024/02/12	2024/02/13	3	15	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564035	10	97721117	DDE 6-10 P-SS/T/SS-X-31VVBG	600004330	2024/02/13	2024/02/13	2024/02/14	1	11	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564072	10	98070955	FV-NL-G5/8 PE/V,E/C U7	600012110	2024/02/13	2024/02/13	2024/02/14	4	177	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564490	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/02/15	2024/02/15	2024/02/19	2	1,180	0	-4	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564686	10	97722361	DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31U7U7BG	600000382	2024/02/16	2024/02/16	2024/02/19	1	20	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565118	10	97721098	DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-311003BG	600004330	2024/02/19	2024/02/19	2024/02/21	3	12	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565604	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/02/21	2024/02/21	2024/02/26	2	1,126	0	-5	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565811	10	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600004330	2024/02/22	2024/02/22	2024/02/23	3	105	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565831	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004341	2024/02/22	2024/02/22	2024/02/23	3	1,110	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565831	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004341	2024/02/22	2024/02/22	2024/02/23	9	409	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566106	10	98070958	FV-NL-G5/8 PE/T/C U7	602013686	2024/02/23	2024/02/23	2024/02/26	1	144	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566106	20	95730926	Inject. unit 0200-16 PV/V/C 4U7-21/100	602013686	2024/02/23	2024/02/23	2024/02/26	1	91	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566164	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602008859	2024/02/23	2024/02/23	2024/02/26	1	1,101	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566164	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602008859	2024/02/23	2024/02/23	2024/02/26	1	383	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566164	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602008859	2024/02/23	2024/02/23	2024/02/26	1	294	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566633	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004075	2024/02/27	2024/02/27	2024/02/28	10	354	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566950	10	96529139	DME 940-4 AR-PP/E/G-S-31A4A4B	600012110	2024/02/28	2024/02/28	2024/02/29	1	4	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566953	20	97722672	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	602001430	2024/02/28	2024/02/29	2024/03/01	2	9	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566984	40	97702494	Acc.connect. PVC-AR,pipe thread,1/2"MNPT	602001430	2024/02/28	2024/02/28	2024/03/01	2	146	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567184	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004341	2024/02/29	2024/02/29	2024/03/01	1	1,026	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567184	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004341	2024/02/29	2024/02/29	2024/03/01	1	335	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567202	10	97722659	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-311004BG	600016305	2024/02/29	2024/02/29	2024/03/01	1	8	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674549872	10	99159454	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600000141	2023/11/17	2024/03/18	2024/03/21	100	59	122	-3	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674550093	10	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	602051614	2023/11/20	2024/03/01	2024/03/05	20	18	102	-4	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674550992	10	99159482	DDA 200-4 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600005519	2023/11/28	2024/03/22	2024/04/12	1	0	115	-21	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554258	140	97722756	DDA 30-4 FCM-PV/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2023/12/14	2024/03/01	2024/05/09	2	0	78	-69	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554258	150	99159454	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600004280	2023/12/14	2024/03/08	2024/03/27	2	20	85	-19	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554416	10	97722760	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600006570	2023/12/15	2024/03/05	2024/05/20	12	0	81	-76	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674555538	10	95905799	DME 375-10 AR-PP/T/C-F-31A4A4B	602051614	2023/12/21	2024/03/06	2024/03/26	1	0	76	-20	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674556047	10	97721060	DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-311003BG	600000486	2023/12/28	2024/03/01	2024/03/05	10	59	64	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos

GMU2	674556196	10	97722366	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-311003BG	600000158	2023/12/29	2024/03/01	2024/03/05	6	12	63	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	40	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600000158	2023/12/29	2024/03/01	2024/03/05	5	18	63	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	50	97722590	DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000158	2023/12/29	2024/03/01	2024/03/05	5	16	63	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674556196	60	97722382	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-311003BG	600000158	2023/12/29	2024/03/01	2024/03/05	5	53	63	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674557159	10	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-32U7U7BG	602005395	2024/01/05	2024/03/01	2024/03/05	2	0	56	-4	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674558711	10	96529118	DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A4A4B	602005415	2024/01/16	2024/03/06	2024/04/01	2	11	50	-26	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559139	10	97722579	DDA 17-7 AR-PVC/T/C-F-311004BG	600000063	2024/01/17	2024/03/19	2024/03/21	2	6	62	-2	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674559857	20	97722438	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-311003BG	602013897	2024/01/22	2024/03/01	2024/03/05	1	0	39	-4	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674562846	20	98149245	Tank 300L,PE-transp./black	600000096	2024/02/06	2024/03/01	2024/03/14	1	0	24	-13	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674566540	10	97721102	DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-311003BG	600004330	2024/02/27	2024/03/04	2024/03/18	1	1	6	-14	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674563010	80	99159485	DDA 200-4 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600006591	2024/02/07	2024/03/18	2024/03/19	1	20	40	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563617	60	96731915	Acc. union nuts G2 PV.DME,FV	600000486	2024/02/09	2024/03/01	2024/03/07	2	0	21	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674563642	20	97722430	DDA 7.5-16 FCM-PP/V/C-F-311003BG	602005704	2024/02/09	2024/03/06	2024/03/15	4	2	26	-9	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674570788	10	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	602051614	2024/03/21	2024/03/22	2024/05/02	1	1	1	-41	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674564346	20	97702505	Acc.connector PV-AR,pipe thread,1/2"MNPT	600006570	2024/02/14	2024/03/28	2024/04/04	1	0	43	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674571510	10	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-32U7U7BG	602013686	2024/03/25	2024/03/26	2024/05/06	1	2	1	-41	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674571520	20	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-32U7U7BG	602013686	2024/03/25	2024/03/26	2024/05/06	1	2	1	-41	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674565694	40	97702505	Acc.connector PV-AR,pipe thread,1/2"MNPT	600006570	2024/02/21	2024/03/28	2024/04/04	1	0	36	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674565950	30	97722760	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600003890	2024/02/22	2024/03/01	2024/05/20	4	0	8	-80	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674566024	20	95730918	Inject. unit 0200-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600005211	2024/02/23	2024/03/20	2024/03/25	3	0	26	-5	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674566084	20	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	600005141	2024/03/18	2024/03/08	2024/03/20	3	8	-10	-12	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569032	20	97722591	DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-311004BG	600004280	2024/03/12	2024/03/13	2024/04/08	2	3	1	-26	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674566638	10	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600003890	2024/02/27	2024/03/08	2024/03/12	2	105	10	-4	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566638	20	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600003890	2024/02/27	2024/03/08	2024/03/12	2	12	10	-4	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674564092	40	98149245	Tank 300L,PE-transp./black	600000043	2024/02/15	2024/03/22	2024/05/14	1	4	36	-53	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674566944	10	98148805	Tank 60L,PE-transp./black	600000096	2024/02/28	2024/03/01	2024/03/08	4	6	2	-7	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567047	10	97721102	DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-311003BG	600004330	2024/02/29	2024/03/07	2024/03/18	2	1	7	-11	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674567107	10	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602004263	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/04	4	281	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567111	20	97722437	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U7U7BG	602004263	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/04	4	11	1	-3	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674567142	20	96696198	Acc. plug, relay output, straight	600002545	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/04	1	19	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567142	30	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	600002545	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/04	1	156	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567142	40	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600002545	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/04	1	335	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567246	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602001430	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/04	10	335	1	-3	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674567248	10	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600004150	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/04	1	10	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567251	50	95905001	DME 375-10 AR-PP/E/G-F-32A2A2F	600000469	2024/02/29	2024/03/08	2024/03/11	1	27	8	-3	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567251	60	96529118	DME 375-10 AR-PP/V/G-F-31A4A4B	600000469	2024/02/29	2024/03/08	2024/05/09	1	0	8	-62	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674567255	10	97721094	DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-311003BG	600004330	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/04	1	6	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567256	10	97722655	DDA 17-7 FCM-PV/V/C-F-311004BG	600004330	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/04	1	3	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567311	10	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600004280	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	2	277	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567311	20	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	2	11	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569476	20	97702505	Acc.connector PV-AR,pipe thread,1/2"MNPT	600003895	2024/03/14	2024/03/20	2024/04/16	4	6	6	-27	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674567311	40	99159476	DDA 120-7 FCM-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	2	5	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567311	50	99159478	DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	1	5	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567311	60	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	2	95	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567311	100	96440448	Acc. cable 5m, pulse, 0/4-20mA in, DME	600004280	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	5	285	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567311	110	96534215	Acc. cable 5m, relay output, DME60-940	600004280	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	5	139	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567311	120	96527111	Acc.cable 5m, ext.Stop in,dosing out,DME	600004280	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	5	126	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567311	130	97722457	DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600004280	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	2	17	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567311	140	96529158	DME 940-4 AR-PV/V/G-F-31A4A4B	600004280	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	1	3	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567320	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000137	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	4	325	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567391	30	97722437	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600000088	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/06	1	11	3	-2	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567405	10	99159462	DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600000057	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	1	7	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567405	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000057	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	1	994	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567405	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600000057	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	1	273	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567413	40	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600000158	2024/03/01	2024/03/05	2024/03/07	3	44	4	-2	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567462	10	96534214	Acc. cable 2m, relay output, DME60-940	602005704	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/05	1	60	3	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674567529	10	99291651	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-32A7A7BG	600000158	2024/03/04	2024/03/05	2024/03/07	2	1	1	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674567611	10	97722744	DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-31U7U7BG	602004263	2024/03/04	2024/03/05	2024/03/06	2	10	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562990	60	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	602049764	2024/02/07	2024/03/19	2024/04/05	1	7	41	-17	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674567699	10	97722365	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600005030	2024/03/04	2024/03/05	2024/03/06	2	11	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos

GMU2	674567708	10	95905799	DME 375-10 AR-PV/T/C-F-31A4A8	600004280	2024/03/04	2024/03/06	2024/03/27	4	0	2	-21	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674567810	20	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	602049764	2024/03/05	2024/03/12	2024/03/13	1	10	7	-1	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674569032	10	97722488	DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-311004BG	600004280	2024/03/12	2024/03/13	2024/04/08	3	7	1	-26	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674567887	60	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	602024375	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/07	3	155	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567887	70	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	602024375	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/07	6	157	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567887	80	95730490	Install. Kit 1003 PVC/V/C-0.17"x1/4"-NL	602024375	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/07	6	213	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567891	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000158	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/07	1	985	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567932	10	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000096	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/12	3	18	1	-6	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674567946	70	97722642	DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-31U7U7BG	602001671	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/07	3	3	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567994	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602001430	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/07	1	306	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567994	40	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602001430	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/07	1	265	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567994	50	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602001430	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/07	2	985	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568022	10	95730918	Inject. unit 0200-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600000158	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/07	10	31	1	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568022	20	95730820	MPV-G5/8-10 PV/T U7	600000158	2024/03/05	2024/03/06	2024/04/02	5	40	1	-27	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568034	20	95730501	Install. Kit 1006 PV/V/C-1/4"x3/8"-NL	600004075	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/07	3	87	1	-1	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568053	10	97722446	DDA 7.5-16 FCM-PV/E/C-F-311003BG	600004330	2024/03/06	2024/03/05	2024/04/16	1	1	-1	-42	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568132	60	97691907	Acc. connector PV-U7, inch tubing comb.	600000158	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/11	5	560	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568210	10	99159457	DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600003895	2024/03/06	2024/03/08	2024/03/14	1	35	2	-6	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568235	10	97722382	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-311003BG	600004150	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/08	1	47	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568367	10	97722764	DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	602014034	2024/03/07	2024/03/08	2024/03/11	1	19	1	-3	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674569278	10	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	602050524	2024/03/13	2024/03/14	2024/03/22	1	7	1	-8	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674568406	70	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003980	2024/03/07	2024/03/08	2024/03/11	1	918	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568412	10	99159474	DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A3A3BG	602024375	2024/03/07	2024/03/11	2024/04/12	2	0	4	-32	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674568428	10	97722449	DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C-F-31U7U7BG	600000096	2024/03/07	2024/03/18	2024/04/17	2	5	11	-30	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568428	30	95730493	Install. Kit 1003 PV/V/C-0.17"x1/4"-NL	600000096	2024/03/07	2024/03/12	2024/04/17	2	102	5	-36	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568428	40	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000096	2024/03/07	2024/03/12	2024/04/17	4	881	5	-36	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568428	50	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000096	2024/03/07	2024/03/12	2024/04/17	4	217	5	-36	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567311	30	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/03/01	2024/03/04	2024/03/13	2	13	3	-9	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674568587	20	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600000158	2024/03/08	2024/03/11	2024/03/14	1	10	3	-3	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568686	10	97722357	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U7U7BG	600000158	2024/03/08	2024/03/11	2024/03/21	1	1	3	-10	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568770	10	98070958	PV-NL-G5/8 PV/T/C U7	600000043	2024/03/09	2024/03/11	2024/03/12	2	124	2	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568884	10	95730914	Inject. unit 0200-16 PVC/V/C 4U7-21/100	600000469	2024/03/11	2024/03/08	2024/03/12	4	59	-3	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568884	20	95730910	Inject. unit 0200-16 PP/E/C 4U7-21/100	600000469	2024/03/11	2024/03/08	2024/03/12	6	15	-3	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568884	30	97722659	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-311004BG	600000469	2024/03/11	2024/03/08	2024/03/12	2	21	-3	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568884	40	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	600000469	2024/03/11	2024/03/08	2024/03/12	1	8	-3	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568884	50	99159469	DDA 120-7 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600000469	2024/03/11	2024/03/08	2024/03/12	1	40	-3	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568884	60	97722357	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U7U7BG	600000469	2024/03/11	2024/03/08	2024/03/20	1	1	-3	-12	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568884	70	95730820	MPV-G5/8-10 PV/T U7	600000469	2024/03/11	2024/03/08	2024/04/02	6	12	-3	-25	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568936	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000469	2024/03/11	2024/03/12	2024/03/13	30	881	1	-1	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674568936	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000469	2024/03/11	2024/03/12	2024/03/13	10	217	1	-1	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674568936	50	99159471	DDA 120-7 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600000469	2024/03/11	2024/03/12	2024/03/13	4	130	1	-1	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674569029	10	97722488	DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-311004BG	600004280	2024/03/12	2024/03/13	2024/03/14	4	7	1	-1	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674569029	20	97722591	DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-311004BG	600004280	2024/03/12	2024/03/13	2024/03/14	2	3	1	-1	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674571119	10	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600006591	2024/03/22	2024/03/26	2024/04/11	1	13	4	-16	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674567866	20	97721166	DDE 15-4 P-PVC/V/C-0.17"x1/4"-NL	600004423	2024/03/05	2024/03/08	2024/04/30	16	16	3	-53	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674569116	40	95730491	Install. Kit 1003 PVC/E/C-0.17"x1/4"-NL	600000158	2024/03/12	2024/03/14	2024/03/19	1	46	2	-5	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569116	60	97722689	DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-311004BG	600000158	2024/03/12	2024/03/14	2024/03/19	1	3	2	-5	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569172	10	97722764	DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600004280	2024/03/12	2024/03/13	2024/03/14	1	18	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569191	10	97722370	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311003BG	602020705	2024/03/12	2024/03/13	2024/03/14	1	41	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565096	10	95730325	valve - PV-G5/8-3PP/V/C X nutG5/8	600004330	2024/02/19	2024/03/01	2024/03/15	4	21	11	-14	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569208	20	97702508	Acc. connector SS-AS, pipe thread, 1/2" MNPT	600006591	2024/03/12	2024/03/14	2024/03/15	1	81	2	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569922	10	95730918	Inject. unit 0200-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600003890	2024/03/15	2024/03/28	2024/04/10	6	26	13	-13	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674569281	30	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	602004263	2024/03/13	2024/03/25	2024/05/02	6	0	12	-38	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674569297	10	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600006570	2024/03/13	2024/03/14	2024/03/19	1	78	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569460	30	95730815	MPV-G5/8-10 PVC/V U7	602001430	2024/03/13	2024/03/24	2024/03/25	1	72	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569471	10	96529118	DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A4A48	600003895	2024/03/13	2024/03/20	2024/05/08	1	0	7	-49	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación

GMU2	674570404	10	95730918	Inject. unit 0200-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600003890	2024/03/19	2024/03/28	2024/04/10	6	26	9	-13	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674569494	20	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	600006591	2024/03/13	2024/03/14	2024/03/15	1	7	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569494	30	95730503	Install. Kit 1006 PV/T/C-1/4"x3/8"-NL	600006591	2024/03/13	2024/03/14	2024/03/15	1	52	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569494	40	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	600006591	2024/03/13	2024/03/14	2024/03/15	1	160	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569494	50	96632921	Acc. cable 2m, analog output, straight	600006591	2024/03/13	2024/03/14	2024/03/15	1	96	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569526	80	99082040	Acc.connector PVC-A7, thread.3/4" NPT	600003980	2024/03/14	2024/03/15	2024/03/18	4	82	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569619	10	99159420	DDE 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600004330	2024/03/14	2024/03/18	2024/03/22	1	0	4	-4	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674569681	30	97722764	DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	602050876	2024/03/14	2024/03/15	2024/03/18	4	10	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569699	10	99159457	DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600004075	2024/03/14	2024/03/14	2024/03/18	1	35	0	-4	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569798	10	97722673	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-311004BG	600002547	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/20	2	11	3	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569806	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600002547	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/19	10	787	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569806	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600002547	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/19	10	189	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569810	30	97702504	Acc.connector PV-5,tubing 3/8x1/2	602005395	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/19	3	37	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569834	10	97722370	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311003BG	600004150	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/19	1	40	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569840	10	97722370	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311003BG	602020705	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/20	1	40	3	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569889	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004330	2024/03/15	2024/03/15	2024/03/18	2	189	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568378	10	99159483	DDA 200-4 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600003890	2024/03/07	2024/03/08	2024/04/03	1	32	1	-26	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569945	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000043	2024/03/15	2024/03/11	2024/04/03	40	896	-4	-23	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569945	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000043	2024/03/15	2024/03/11	2024/04/03	40	225	-4	-23	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674569945	30	95730511	Install. Kit 1004 PV/T/C-3/8"x1/2"-NL	600000043	2024/03/15	2024/03/11	2024/04/03	20	97	-4	-23	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570033	10	97722540	DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-311004BG	600004050	2024/03/18	2024/03/19	2024/03/20	2	10	1	-1	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674570120	60	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-32U7U7BG	602013686	2024/03/18	2024/03/25	2024/03/28	1	2	7	-3	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674570182	10	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	602001571	2024/03/18	2024/03/19	2024/03/20	1	144	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570182	20	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	602001571	2024/03/18	2024/03/19	2024/03/20	1	152	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570256	20	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/03/19	2024/03/20	2024/03/21	1	28	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570256	30	97722377	DDA 7.5-16 AR-PV/E/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/03/19	2024/03/20	2024/03/21	2	8	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570256	40	97722381	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/03/19	2024/03/20	2024/03/21	1	33	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570280	10	98071138	RSL-0980-2L-G5/8 PE/V,E/C U7	602004263	2024/03/19	2024/03/20	2024/03/21	1	66	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570323	50	95730918	Inject. unit 0200-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600000158	2024/03/19	2024/03/21	2024/03/26	1	0	2	-5	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674564708	20	99159454	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	602049764	2024/02/16	2024/03/15	2024/03/27	2	59	28	-12	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674570407	10	99406010	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C with acc. SUEZ US	600003895	2024/03/19	2024/03/25	2024/03/27	2	0	6	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674570419	10	97722594	DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600004150	2024/03/19	2024/03/20	2024/03/21	1	8	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570426	10	97691905	Acc.connector PP-U7,inch tubing comb.	602004263	2024/03/19	2024/03/20	2024/03/21	3	373	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674570513	10	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600004055	2024/03/19	2024/03/20	2024/03/21	10	229	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674570685	10	96529114	DME 375-10 AR-PP/E/G-S-31A4A4B	602022119	2024/03/20	2024/03/21	2024/03/22	4	6	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570688	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004341	2024/03/20	2024/03/21	2024/03/22	6	704	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570688	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004341	2024/03/20	2024/03/21	2024/03/22	26	146	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570695	20	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	600000486	2024/03/20	2024/03/21	2024/03/26	6	143	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570695	30	97702493	Acc.connector PVC-S,tubing 3/8x1/2	600000486	2024/03/20	2024/03/21	2024/03/26	2	31	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570695	40	97721098	DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-311003BG	600000486	2024/03/20	2024/03/21	2024/03/26	6	16	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570695	50	95730499	Install. Kit 1006 PVC/E/C-1/4"x3/8"-NL	600000486	2024/03/20	2024/03/21	2024/03/26	1	22	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570695	60	97721064	DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-311003BG	600000486	2024/03/20	2024/03/29	2024/04/01	10	13	9	-3	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674566834	10	97721060	DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-311003BG	600005140	2024/02/28	2024/03/01	2024/04/04	24	59	2	-34	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674570843	10	97722555	DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602018794	2024/03/21	2024/03/21	2024/03/22	3	14	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570843	20	95730820	MPV-G5/8-10 PV/T U7	602018794	2024/03/21	2024/03/21	2024/03/22	3	9	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570843	30	95730325	valve - PV-G5/8-3PP/V/C X nutG5/8	602018794	2024/03/21	2024/03/21	2024/03/22	3	17	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570843	40	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602018794	2024/03/21	2024/03/21	2024/03/22	6	704	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570843	50	95730503	Install. Kit 1006 PV/T/C-1/4"x3/8"-NL	602018794	2024/03/21	2024/03/21	2024/03/22	3	49	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570843	60	99159485	DDA 200-4 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	602018794	2024/03/21	2024/03/21	2024/03/22	3	19	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570857	40	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600003980	2024/03/21	2024/03/22	2024/03/26	1	13	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570857	50	97722696	DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600003980	2024/03/21	2024/03/22	2024/03/26	2	4	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570906	10	97722361	DDA 7.5-16 AR-PP/PV/C-F-31U7U7BG	602001430	2024/03/21	2024/03/22	2024/03/25	1	10	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570919	10	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	600004280	2024/03/21	2024/03/21	2024/05/02	1	1	0	-42	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570953	10	97722658	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602005415	2024/03/28	2024/03/28	2024/04/05	2	0	0	-8	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674570953	20	95730820	MPV-G5/8-10 PV/T U7	602005415	2024/03/28	2024/03/28	2024/04/02	2	0	0	-5	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674567689	10	97721060	DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-311003BG	600002885	2024/03/04	2024/03/05	2024/04/02	1	59	1	-28	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674571136	10	97722366	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-311003BG	600004330	2024/03/22	2024/03/29	2024/04/10	1	16	7	-12	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571136	20	97702508	Acc.connector SS-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600004330	2024/03/22	2024/03/29	2024/04/10	2	76	7	-12	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571155	10	95730506	Install. Kit 1004 PVC/V/C-3/8"x1/2"-NL	600004330	2024/03/22	2024/03/25	2024/03/26	4	32	3	-1	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos

GMU2	674571169	10	95730502	Install, Kit 1006 PV/E/C-1/4"x3/8"-NL	600012044	2024/03/22	2024/03/22	2024/03/27	2	12	0	-5	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571173	10	97722445	DDA 7.5-16 FCM-PV/E/C-F-31U7U7BG	602013897	2024/03/22	2024/03/25	2024/03/27	1	3	3	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571341	10	96529139	DME 940-4 AR-PP/V/G-F-31A4A4B	602024960	2024/03/25	2024/03/26	2024/03/29	1	3	1	-3	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674571345	20	96529119	DME 375-10 AR-PP/V/G-F-31A4A4B	600004525	2024/03/25	2024/03/25	2024/04/04	5	1	0	-10	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674571350	70	99159486	DDA 200-4 AR-PP/V/C-F-31A7A7BG	602024375	2024/03/25	2024/03/26	2024/03/27	2	19	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571355	10	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600000043	2024/03/25	2024/03/25	2024/03/26	2	94	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571355	20	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600000043	2024/03/25	2024/03/25	2024/03/26	2	94	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571368	10	96529006	DME 375-10 AR-PP/E/G-F-31A4A4B	600004280	2024/03/25	2024/03/26	2024/03/27	1	5	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571423	10	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600004055	2024/03/25	2024/03/26	2024/03/27	7	219	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571486	10	97722472	DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-311004BG	600004432	2024/03/25	2024/03/26	2024/05/14	1	0	1	-49	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674569199	30	99159454	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600000469	2024/03/12	2024/03/18	2024/03/27	1	59	6	-9	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674571516	10	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/TS-F-31VVBG	600002547	2024/03/25	2024/03/26	2024/04/11	4	13	1	-16	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571516	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600002547	2024/03/25	2024/03/26	2024/04/11	8	685	1	-16	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571516	30	96698715	Acc.plugin,control or level input,straight	600002547	2024/03/25	2024/03/26	2024/04/11	8	47	1	-16	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568489	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003895	2024/03/07	2024/03/11	2024/03/21	1	225	4	-10	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571529	10	99082040	Acc.connector PVC-A7, thread.3/4" NPT	600004389	2024/03/25	2024/03/26	2024/03/27	1	78	1	-1	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674571656	10	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-311003BG	600004335	2024/03/26	2024/03/26	2024/03/28	1	21	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571749	10	95730926	Inject. unit 0200-16 PV/V/C 4U7-21/100	600004075	2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	5	121	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674571855	10	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-32U7U7BG	602013686	2024/03/27	2024/03/28	2024/05/14	1	3	1	-47	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674571917	50	97702493	Acc.connector PVC-S,tubing 3/8x1/2	600006570	2024/03/27	2024/03/28	2024/03/29	10	20	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674572197	10	99159471	DDA 120-7 AR-PP/T/C-F-31A7A7BG	600004330	2024/03/28	2024/03/29	2024/05/24	4	116	1	-56	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674572229	10	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/G 4U7-21/100	600000043	2024/03/28	2024/03/29	2024/04/01	1	96	1	-3	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674572229	20	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/G 4U7-21/100	600000043	2024/03/28	2024/03/29	2024/04/01	3	96	1	-3	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674553419	10	97722760	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600006570	2023/12/11	2024/03/05	2024/04/29	1	0	85	-55	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674560810	30	97722438	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-311003BG	600000059	2024/01/26	2024/03/01	2024/03/05	2	0	35	-4	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674566897	10	97702505	Acc.connector PV-A9,pipe thread.1/2"MNPT	602006153	2024/02/28	2024/03/28	2024/03/29	4	0	29	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	1971255877	10	97722381	DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31U7U7BG	600010890	2024/04/25	2024/04/26	2024/05/06	2	7	1	-10	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674553726	10	99159482	DDA 200-4 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	602051614	2023/12/12	2024/04/01	2024/04/12	2	0	111	-11	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674554505	20	96529118	DME 375-10 AR-PP/V/G-F-31A4A4B	600006591	2023/12/15	2024/04/10	2024/04/11	1	5	117	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674554508	20	96529118	DME 375-10 AR-PP/V/G-F-31A4A4B	600006591	2023/12/15	2024/04/10	2024/04/11	1	5	117	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674558834	20	97722760	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600006570	2024/01/16	2024/04/11	2024/05/16	1	0	86	-35	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674559487	20	96529118	DME 375-10 AR-PP/V/G-F-31A4A4B	600006591	2024/01/18	2024/04/03	2024/05/09	1	6	76	-36	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674562351	10	97722692	DDA 30-4 AR-PP/T/C-F-31U7U7BG	600000045	2024/02/03	2024/04/17	2024/04/18	1	29	74	-1	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562816	10	97722692	DDA 30-4 AR-PP/T/C-F-31U7U7BG	600000045	2024/02/06	2024/04/17	2024/04/18	3	29	71	-1	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674563190	90	96440448	Acc. cable 5m, pulse, 0/4-20mA in, DME	600000469	2024/03/01	2024/04/19	2024/04/23	12	252	49	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563190	100	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000469	2024/03/01	2024/04/19	2024/04/23	17	364	49	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563190	110	97722386	DDA 7.5-16 AR-PP/T/C-F-311003BG	600000469	2024/03/01	2024/04/19	2024/04/23	17	22	49	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563295	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600005211	2024/02/08	2024/04/24	2024/04/25	4	263	76	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563295	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600005211	2024/02/08	2024/04/24	2024/04/25	4	0	76	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674563295	30	99159456	DDA 60-10 AR-PP/E/C-F-31A7A7BG	600005211	2024/02/08	2024/04/24	2024/04/25	4	4	76	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674563617	50	96731901	Acc. insert thread 1 1/4"-NPT, PVDF	600000486	2024/02/09	2024/04/03	2024/04/09	2	0	54	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674564346	10	97722761	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-311004BG	600006570	2024/02/14	2024/04/23	2024/05/02	1	0	69	-9	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674564895	30	97702505	Acc.connector PV-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600003895	2024/02/16	2024/04/08	2024/04/16	4	1	52	-8	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674565194	110	95730511	Install, Kit 1004 PV/T/C-3/8"x1/2"-NL	600000043	2024/02/20	2024/04/29	2024/05/01	3	5	69	-2	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674565474	10	97722438	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-311003BG	600000043	2024/02/21	2024/04/05	2024/04/09	3	3	44	-4	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674567866	30	97721166	DDE 15-4 P-PVC/V/C-X-311004BG	600004423	2024/04/29	2024/04/30	2024/05/14	9	16	1	-14	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674568217	10	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PP/T/C-F-32U7U7BG	600003895	2024/03/06	2024/04/15	2024/04/16	3	0	40	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674569646	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000043	2024/03/14	2024/04/22	2024/04/25	6	3	39	-3	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674571978	10	96529158	DME 940-4 AR-PP/V/G-F-31A4A4B	600003895	2024/03/27	2024/04/03	2024/04/09	1	1	7	-6	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674571995	10	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PP/T/C-F-31U7U7BG	600003890	2024/03/27	2024/04/09	2024/04/16	3	1	13	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674572239	10	97722366	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-311003BG	600000469	2024/03/29	2024/04/02	2024/04/03	5	15	4	-1	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674572304	50	99159478	DDA 120-7 FCM-PP/T/C-F-31A7A7BG	600003980	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/02	1	9	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674572316	20	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600004055	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/03	25	211	3	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674572316	30	97722591	DDA 17-7 AR-PP/T/C-F-311004BG	600004055	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/03	10	22	3	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674572349	20	97722575	DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-311004BG	600016305	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/08	1	2	3	-7	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674572367	10	97722655	DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-311004BG	600004330	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/02	1	3	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674572442	20	97721060	DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-311003BG	600000158	2024/04/01	2024/04/02	2024/04/09	3	17	1	-7	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674572472	10	99082042	Acc.connector PVDF-A7, thread.3/4"NPT	602013897	2024/04/01	2024/04/02	2024/04/03	1	65	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674572488	10	97722658	DDA 17-7 FCM-PP/T/C-F-31U7U7BG	602005415	2024/04/01	2024/04/10	2024/05/06	16	17	9	-26	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674572554	10	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600016465	2024/04/02	2024/04/02	2024/04/03	1	394	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674572554	20	97691905	Acc.connector PP-U7,inch tubing comb.	600016465	2024/04/02	2024/04/02	2024/04/03	1	367	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674572689	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602012509	2024/04/02	2024/04/03	2024/04/05	2	91	1	-2	Otros	Otros	Otros	Otros

GMU2	674572709	10	98071138	RSL-0980-2L-G5/8 PE/V,E/C U7	600004050	2024/04/02	2024/04/03	2024/04/05	2	65	1	-2	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674572826	10	97722544	DDA 12-10 FCM-PVC/T/C-F-311004BG	600000158	2024/04/03	2024/04/03	2024/04/04	1	2	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674572914	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602011805	2024/04/03	2024/04/09	2024/04/25	36	14	6	-16	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674572958	10	99159469	DDA 120-7 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600004428	2024/04/03	2024/04/04	2024/04/08	1	30	1	-4	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674572975	10	97722673	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-311004BG	600002547	2024/04/03	2024/04/04	2024/04/05	1	6	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674572999	10	97722575	DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-311004BG	600004423	2024/04/03	2024/04/05	2024/05/08	15	0	2	-33	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674573003	10	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	602001430	2024/04/03	2024/04/04	2024/04/05	1	133	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674573003	20	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	602001430	2024/04/03	2024/04/04	2024/04/05	1	147	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674573081	30	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000158	2024/04/04	2024/04/05	2024/04/09	14	381	1	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573083	10	97722457	DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600004075	2024/04/04	2024/04/04	2024/04/05	1	18	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573209	30	97702494	Acc.connect. PVC-AB,pipe thread.1/2"MNPT	600004280	2024/04/04	2024/04/05	2024/04/08	3	241	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573209	40	97722369	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/04/04	2024/04/05	2024/04/08	1	14	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573209	50	97722688	DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/04/04	2024/04/05	2024/04/08	1	5	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573209	60	97722764	DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600004280	2024/04/04	2024/04/05	2024/04/08	5	15	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573209	70	97722764	DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600004280	2024/04/04	2024/04/05	2024/05/15	6	15	1	-40	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674573209	80	98589048	Acc. cable 3 m, GENibus, straight	600004280	2024/04/04	2024/04/05	2024/04/08	1	99	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573209	90	99159472	DDA 120-7 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/04/04	2024/04/05	2024/04/08	3	5	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573231	10	99159478	DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	602013897	2024/04/04	2024/04/05	2024/04/08	6	18	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573258	10	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600004330	2024/04/04	2024/04/05	2024/04/08	4	381	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573274	10	97722693	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-311004BG	602005704	2024/04/05	2024/04/08	2024/04/09	1	19	3	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674573335	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602008859	2024/04/05	2024/04/08	2024/04/10	1	566	3	-2	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573367	10	97722745	DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-311004BG	600000180	2024/04/05	2024/04/05	2024/04/08	2	4	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573368	10	99159486	DDA 200-4 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	602001430	2024/04/05	2024/04/08	2024/04/09	2	22	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573421	40	96632921	Acc. cable 2m, analog output, straight	600009147	2024/04/05	2024/04/08	2024/04/09	5	97	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573421	50	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	600009147	2024/04/05	2024/04/08	2024/04/09	5	131	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573421	60	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	600009147	2024/04/05	2024/04/08	2024/04/09	5	146	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573421	70	97722659	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-311004BG	600009147	2024/04/05	2024/04/08	2024/04/09	3	26	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573484	30	98149215	Tank 200L,PE-transp./black	600000059	2024/05/15	2024/04/08	2024/05/24	1	5	-37	-46	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573484	40	95730501	Install. Kit 1006 PV/V/C-1/4"x3/8"-NL	600000059	2024/05/15	2024/04/08	2024/05/16	1	88	-37	-38	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573484	50	95730818	MFV-G5/8-10 PV/V U7	600000059	2024/05/15	2024/04/08	2024/05/16	1	110	-37	-38	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573491	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000059	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/10	1	503	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573491	30	97722688	DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-31U7U7BG	600000059	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16	1	2	1	-7	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573496	10	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600005141	2024/04/08	2024/04/08	2024/04/09	4	33	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573496	20	97722591	DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-311004BG	600005141	2024/04/08	2024/04/08	2024/04/09	1	16	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573496	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600005141	2024/04/08	2024/04/08	2024/04/09	5	566	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573519	10	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600006570	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/10	2	53	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573596	20	97721102	DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-110038G	600004330	2024/04/08	2024/04/09	2024/05/02	5	1	1	-23	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674573614	10	98071138	RSL-0980-2L-G5/8 PE/V,E/C U7	602004263	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/11	1	63	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573615	10	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-311003BG	600004335	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/10	1	18	1	-1	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573630	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000158	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/22	2	14	1	-13	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674573890	10	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	600000063	2024/04/09	2024/04/10	2024/04/11	2	171	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573939	20	97722484	DDA 12-10 AR-PV/V/C-F-311004BG	600005502	2024/04/10	2024/04/10	2024/04/22	1	3	0	-12	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574016	10	99159457	DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600004150	2024/04/10	2024/04/11	2024/04/12	1	33	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574031	10	97722361	DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31U7U7BG	600004150	2024/04/10	2024/04/11	2024/04/12	3	6	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574059	10	97722555	DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000059	2024/04/10	2024/04/11	2024/04/15	1	9	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574094	20	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-32U7U7BG	602013686	2024/04/10	2024/04/11	2024/05/16	1	0	1	-35	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674574116	10	95730818	MFV-G5/8-10 PV/V U7	600000063	2024/04/10	2024/04/11	2024/04/12	1	109	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574116	20	95730817	MFV-G5/8-10 PVC/T U7	600000063	2024/04/10	2024/04/11	2024/04/12	1	24	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574120	10	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000158	2024/04/10	2024/04/11	2024/04/30	4	1	1	-19	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674574121	10	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600000063	2024/04/10	2024/04/11	2024/04/16	3	214	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574121	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000063	2024/04/10	2024/04/11	2024/04/16	3	14	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574177	10	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	600004330	2024/04/11	2024/04/12	2024/05/25	1	0	1	-33	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674574332	10	97722370	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311003BG	602013897	2024/04/11	2024/04/12	2024/04/15	2	32	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574375	10	95730818	MFV-G5/8-10 PV/V U7	600000063	2024/04/11	2024/04/12	2024/04/17	4	109	1	-5	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574375	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000063	2024/04/11	2024/04/12	2024/04/16	6	409	1	-4	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574375	40	97722540	DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-311004BG	600000063	2024/04/11	2024/04/12	2024/04/17	2	15	1	-5	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574375	50	97722457	DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600000063	2024/04/11	2024/04/12	2024/04/17	2	16	1	-5	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574375	60	95730817	MFV-G5/8-10 PVC/T U7	600000063	2024/04/11	2024/04/12	2024/04/17	2	24	1	-5	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos

GMU2	674574412	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602005415	2024/04/12	2024/04/12	2024/04/29	8	12	0	-17	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574510	10	97722587	DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-311004BG	600000158	2024/04/12	2024/04/12	2024/04/15	1	5	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574562	20	97722374	DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-311003BG	600003165	2024/04/12	2024/04/15	2024/05/02	1	8	3	-17	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674574623	10	95730918	Inject. unit 0200-16 PVC/E/C-4U7-21/100	600000045	2024/04/13	2024/04/15	2024/04/18	2	19	2	-3	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674574682	10	99082040	Acc.connector PVC-A7, thread.3/4" NPT	600000395	2024/04/15	2024/04/15	2024/04/16	1	69	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574784	10	97721060	DDE 6-10 B-PVC/E/C-F-311003BG	600004280	2024/04/15	2024/04/16	2024/04/17	1	34	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574792	10	97722457	DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600006570	2024/04/15	2024/04/15	2024/04/16	1	16	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574806	10	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2024/04/15	2024/04/17	2024/04/22	2	2	2	-5	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674574819	10	97722365	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	602051614	2024/04/15	2024/04/19	2024/04/26	1	2	4	-7	Otros	Otros	Otros	Área de planeación
GMU2	674574856	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004330	2024/04/15	2024/04/16	2024/04/25	1	11	1	-9	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674574858	50	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003895	2024/04/15	2024/04/18	2024/04/25	4	7	3	-7	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674574950	40	97722662	DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	602011805	2024/04/29	2024/04/24	2024/04/30	3	10	-5	-6	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574955	10	97722358	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-311003BG	600004280	2024/04/16	2024/04/17	2024/04/18	3	13	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575051	10	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	600000043	2024/04/16	2024/04/17	2024/04/18	1	124	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575051	20	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	600000043	2024/04/16	2024/04/17	2024/04/18	1	167	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575257	40	99159460	DDA 60-10 AR-SS/T/SS-F-31A3A3BG	600006570	2024/04/17	2024/04/18	2024/04/19	1	3	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575288	10	97702505	Acc.connector PV-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600004150	2024/04/17	2024/04/17	2024/04/18	4	107	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575337	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602004263	2024/04/17	2024/04/18	2024/04/19	8	368	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674575337	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602004263	2024/04/17	2024/04/18	2024/04/19	8	170	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674575345	10	97722373	DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31U7U7BG	602013897	2024/04/17	2024/04/18	2024/04/19	2	11	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575350	10	95730499	Install. Kit 1006 PVC/E/C-1/4"x3/8"-NL	600012044	2024/04/17	2024/04/17	2024/04/23	2	20	0	-6	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575398	90	97722672	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/05/28	2	4	1	-39	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575490	10	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	602025358	2024/04/18	2024/04/18	2024/04/19	2	48	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575507	10	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C-4U7-21/100	600004330	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	1	112	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575536	10	99159457	DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600004075	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/23	1	28	1	-4	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575557	10	96440448	Acc. cable 5m, pulse, 0.4-20mA in, DME	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	1	252	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575557	40	96527111	Acc.cable 5m, ext.Stop in,dosing out,DME	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	1	150	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575557	50	96534215	Acc. cable 5m, relay output, DME60-940	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	1	118	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575557	60	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	11	364	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575557	70	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/25	12	7	1	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575557	80	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	14	166	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575557	110	97722386	DDA 7.5-16 AR-PP/T/C-F-311003BG	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	1	22	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575557	150	97722662	DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	5	15	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575557	160	97722676	DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	1	5	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575557	180	99159483	DDA 200-4 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	1	26	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575572	10	97722591	DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-311004BG	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	10	13	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575572	20	99159485	DDA 200-4 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	2	20	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575572	40	99159478	DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	1	10	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575575	20	97722370	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311003BG	602001430	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/23	2	26	1	-4	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575587	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003895	2024/04/18	2024/04/25	2024/05/17	12	100	7	-22	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575587	20	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600003895	2024/04/18	2024/04/25	2024/05/09	12	126	7	-14	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575587	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/04/18	2024/04/25	2024/05/09	5	261	7	-14	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575601	20	97722659	DDA 17-7 FCM-PP/T/C-F-311004BG	602005415	2024/04/18	2024/04/26	2024/05/02	25	23	8	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575632	10	95730922	Inject. unit 0200-16 PVC/T/C-4U7-21/100	600000043	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	4	9	1	-3	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575633	10	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000063	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	2	32	1	-3	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674575633	30	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	600000063	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	2	120	1	-3	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674575635	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600017539	2024/04/18	2024/04/19	2024/04/22	1	364	1	-3	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674575650	10	97722415	DDA 7.5-16 FC-PV/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/23	4	7	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575650	30	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600004280	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/23	5	341	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575725	10	99159468	DDA 120-7 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600000059	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/23	2	15	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575725	50	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000059	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/23	5	346	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575753	10	95730491	Install. Kit 1003 PVC/E/C-0.17"x1/4"-NL	600012044	2024/04/19	2024/04/19	2024/04/23	4	53	0	-4	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575766	130	97721052	DDE 6-10 B-PP/E/C-X-311003BG	600000486	2024/04/30	2024/04/19	2024/05/02	16	44	-11	-13	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575779	10	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600000158	2024/04/19	2024/04/22	2024/05/14	1	19	3	-22	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575810	50	99082040	Acc.connector PVC-A7, thread.3/4" NPT	600000158	2024/04/19	2024/04/23	2024/04/25	4	68	4	-2	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575827	10	97722539	DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600004556	2024/04/19	2024/04/26	2024/05/07	1	3	7	-11	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575827	20	97722445	DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31U7U7BG	600004556	2024/04/19	2024/04/26	2024/05/07	1	1	7	-11	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575840	10	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C-4U7-21/100	600004075	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/23	3	111	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575858	10	95730816	MPV-G5/8-10 PVC/E U7	600000059	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/24	1	50	3	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos

GMU2	674575898	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602008859	2024/04/22	2024/04/22	2024/04/24	1	346	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575898	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602008859	2024/04/22	2024/04/22	2024/05/03	1	3	0	-11	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575898	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602008859	2024/04/22	2024/04/22	2024/04/24	1	3	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575898	40	95730326	Valve - PV-G5/8-3PP/E/C X nutG5/8	602008859	2024/04/22	2024/04/22	2024/04/24	1	5	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575945	10	99171932	E-box 500, Ethernet DDA	602005415	2024/04/22	2024/04/22	2024/04/23	1	40	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575945	20	98071150	RSL-1100-2L-G5/8 PE/V,E/C U7	602005415	2024/04/22	2024/04/22	2024/04/23	1	12	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575949	20	95730433	Acc. adaptor PVC/V,E-nutG11/4-G5/8	602001430	2024/04/22	2024/04/24	2024/05/02	4	11	2	-8	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575949	30	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	602001430	2024/04/22	2024/04/23	2024/04/25	4	164	1	-2	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575949	90	99159454	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	602001430	2024/04/22	2024/04/23	2024/04/25	2	68	1	-2	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575949	100	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	602001430	2024/04/22	2024/04/23	2024/04/25	2	37	1	-2	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575949	110	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602001430	2024/04/22	2024/04/23	2024/04/25	14	296	1	-2	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576014	10	99171932	E-box 500, Ethernet DDA	602005415	2024/04/22	2024/04/22	2024/04/23	1	40	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576014	20	98071150	RSL-1100-2L-G5/8 PE/V,E/C U7	602005415	2024/04/22	2024/04/22	2024/04/23	1	12	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576055	10	97722692	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	602005395	2024/04/22	2024/04/22	2024/04/23	1	25	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576105	10	95730491	Install. Kit 1003 PVC/E/C-0.17"x1/4"-NL	600004330	2024/04/22	2024/04/23	2024/04/24	1	52	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576286	10	99159468	DDA 120-7 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600004150	2024/04/23	2024/04/24	2024/04/25	1	12	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576286	20	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004150	2024/04/23	2024/04/24	2024/04/25	1	130	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576297	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003890	2024/04/23	2024/04/24	2024/05/10	4	0	1	-16	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674576321	10	97722555	DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000045	2024/04/23	2024/04/24	2024/04/25	1	7	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576328	10	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600002547	2024/04/23	2024/04/22	2024/05/14	2	19	-1	-22	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576328	20	96698715	Acc.plug.control or level input,straight	600002547	2024/04/23	2024/04/22	2024/04/26	2	39	-1	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576344	10	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600004330	2024/04/23	2024/04/24	2024/04/25	6	326	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576345	10	98071078	RSL-0400-2L-G5/8 PE/V,E/C U7	600004330	2024/04/23	2024/04/24	2024/04/25	2	10	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576383	10	97722426	DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-311003BG	600000057	2024/04/24	2024/04/25	2024/05/03	1	6	1	-8	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576454	10	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600003895	2024/04/24	2024/04/24	2024/04/25	1	130	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576493	10	95730926	Inject. unit 0200-16 PV/V/C 4U7-21/100	600004075	2024/04/24	2024/04/24	2024/04/25	4	78	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576516	10	98070956	PV-NL-G5/8 PE/T/C U7	600004330	2024/04/24	2024/04/24	2024/04/25	1	53	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576518	20	97721098	DDE 6-10 P-PVC/C-X-X-311003BG	600004330	2024/04/24	2024/04/26	2024/04/29	1	18	2	-3	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674576518	30	97721117	DDE 6-10 P-SS/T/SS-X-311VVBG	600004330	2024/04/24	2024/04/26	2024/04/29	1	4	2	-3	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674576518	40	97721094	DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-311003BG	600004330	2024/04/24	2024/04/26	2024/04/29	1	17	2	-3	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674576558	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000043	2024/04/24	2024/04/24	2024/04/25	112	263	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576558	40	95730511	Install. Kit 1004 PV/T/C-3/8"x1/2"-NL	600000043	2024/04/24	2024/04/24	2024/04/25	51	56	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576572	10	97721060	DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-311003BG	600004280	2024/04/24	2024/04/25	2024/04/26	1	21	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576597	10	98149057	tank 100L,PE-transp./black	602013686	2024/04/24	2024/04/25	2024/04/26	1	5	1	-1	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674576597	20	98071115	RSL-0690-2L-G5/8 PE/T/C U7	602013686	2024/04/24	2024/04/25	2024/04/26	1	7	1	-1	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674576597	40	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-32U7U7BG	602013686	2024/04/24	2024/04/25	2024/05/22	1	0	1	-27	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674576597	50	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	602013686	2024/04/24	2024/04/25	2024/04/26	1	104	1	-1	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674576623	30	99082042	Acc.connector PVD7-AF7, thread.3/4"NPT	602001571	2024/04/24	2024/04/25	2024/04/26	4	59	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576650	40	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000158	2024/04/25	2024/04/30	2024/05/17	5	74	5	-17	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674576681	10	99159476	DDA 120-7 FCM-PVC/C-F-31A7A7BG	600001751	2024/04/25	2024/04/26	2024/04/29	1	3	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576681	20	95730509	Install. Kit 1004 PV/V/C-3/8"x1/2"-NL	600001751	2024/04/25	2024/04/26	2024/04/29	1	6	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576732	10	97722370	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311003BG	600004150	2024/04/25	2024/04/26	2024/04/29	1	24	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576802	60	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004280	2024/04/25	2024/04/26	2024/05/17	14	0	1	-21	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674576802	90	97722369	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/04/25	2024/04/26	2024/04/30	1	6	1	-4	Otros	Otros	Otros	
GMU2	674576824	10	97722373	DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31U7U7BG	602001430	2024/04/25	2024/04/26	2024/04/29	1	8	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576837	10	99159478	DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	602013897	2024/04/25	2024/04/26	2024/05/28	13	6	1	-32	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674576924	40	95730924	Inject. unit 0200-16 PV/V/C 4U2-20/100	600000180	2024/04/26	2024/04/26	2024/04/30	2	9	0	-4	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576953	10	97721080	DDE 6-10 B-PV/T/C-X-311003BG	600000158	2024/04/26	2024/04/30	2024/05/02	10	62	4	-2	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674576995	10	97722457	DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600003895	2024/04/26	2024/04/26	2024/04/29	2	15	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576995	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/04/26	2024/04/26	2024/04/29	2	109	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576995	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600003895	2024/04/26	2024/04/26	2024/04/29	2	123	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576995	40	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003895	2024/04/26	2024/04/26	2024/05/03	2	0	0	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577114	10	99159482	DDA 200-4 AR-PVC/C-F-31A7A7BG	600000045	2024/04/27	2024/04/29	2024/05/02	1	35	2	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577140	10	97702504	Acc.connector PV-S,tubing 3/8x1/2	600004330	2024/04/29	2024/04/29	2024/04/30	1	27	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577187	10	97722760	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602014034	2024/04/29	2024/04/30	2024/05/31	3	0	1	-31	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577187	20	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	602014034	2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	3	78	1	-8	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674577187	30	96632921	Acc. cable 2m, analog output, straight	602014034	2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	3	34	1	-8	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674577187	40	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	602014034	2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	3	164	1	-8	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674577194	10	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	602013897	2024/04/29	2024/04/30	2024/05/02	1	8	1	-2	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos

GMU2	674577200	10	97722662	DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	60000057	2024/04/29	2024/04/30	2024/05/03	2		10	1	-3	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674577255	20	95730436	Acc. adaptor PV/T-nutG11/4-G5/8	602024136	2024/04/29	2024/04/30	2024/05/01	1		16	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577267	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600006570	2024/04/29	2024/04/30	2024/05/01	2		114	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577267	120	97722692	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600006570	2024/04/29	2024/04/30	2024/05/01	1		24	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577477	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602011805	2024/04/30	2024/04/30	2024/05/21	4		74	0	-21	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577477	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602011805	2024/04/30	2024/04/30	2024/05/21	3		25	0	-21	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577477	30	97702505	Acc.connector PV-A9,pipe thread.1/2"MNPT	602011805	2024/04/30	2024/04/30	2024/05/21	20		115	0	-21	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577669	10	97722373	DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600000043	2024/05/01	2024/04/26	2024/05/06	2		8	-5	-10	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674574135	10	97722467	DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600004389	2024/04/10	2024/04/10	2024/05/15	2		0	0	-35	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674574135	20	97722365	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600004389	2024/04/10	2024/04/10	2024/05/28	1		0	0	-48	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674510711	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000043	2024/05/14	2024/05/15	2024/06/05	1		9	1	-21	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674510711	40	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000043	2024/05/14	2024/05/15	2024/05/17	1		4	1	-2	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674567390	60	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	602013456	2024/03/01	2024/05/15	2024/05/16	18		53	75	-1	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674570220	20	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2024/03/18	2024/05/01	2024/05/28	4		0	44	-27	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674570949	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004280	2024/03/21	2024/05/29	2024/06/05	30		1	69	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674571212	10	97722437	DDA 7.5-16 FCM-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600003895	2024/03/22	2024/05/24	2024/05/31	1		0	63	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674572024	10	96529118	DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A4A4B	600006570	2024/03/28	2024/05/23	2024/06/18	1		0	56	-26	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674572276	120	97722383	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-32U7U7BG	600000158	2024/03/29	2024/05/06	2024/05/14	2		3	38	-8	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674572320	10	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U003BG	600000469	2024/03/29	2024/05/31	2024/06/04	7		9	63	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674573245	10	97722383	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-32U7U7BG	600003895	2024/04/04	2024/05/07	2024/05/30	2		3	33	-23	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674574045	10	97722658	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600009147	2024/04/10	2024/05/13	2024/05/14	1		0	33	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674574046	10	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600000096	2024/04/10	2024/05/24	2024/05/28	4		151	44	-4	Ejecución tardía de la entrega	Ejecución tardía de la entrega	Ejecución tardía de la entrega	Área de logística
GMU2	674574766	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000043	2024/04/15	2024/05/20	2024/06/05	10		7	35	-16	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575381	10	96529118	DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A4A4B	602005704	2024/04/18	2024/05/23	2024/06/18	1		0	35	-26	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575688	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600006591	2024/04/19	2024/05/30	2024/06/06	8		0	41	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575688	50	96529118	DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A4A4B	600006591	2024/04/19	2024/05/23	2024/06/18	2		0	34	-26	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575820	10	99159474	DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A3A3BG	600000158	2024/04/19	2024/05/28	2024/06/27	2		1	39	-30	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575903	20	98915690	Acc. sensor cable 1m	600004330	2024/04/22	2024/05/15	2024/05/16	10		54	23	-1	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674575903	30	95730325	valve - PV-G5/8-3PPV/C X nutG5/8	600004330	2024/04/22	2024/05/15	2024/05/16	4		14	23	-1	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674576419	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003890	2024/04/24	2024/05/30	2024/06/05	2		0	36	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674576558	10	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000043	2024/04/24	2024/05/22	2024/06/28	2		2	28	-37	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674576719	60	97722696	DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600003980	2024/04/25	2024/05/13	2024/05/14	1		0	18	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577007	10	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600004330	2024/04/26	2024/05/02	2024/06/10	2		6	6	-39	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577141	10	99159458	DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600004330	2024/04/29	2024/05/06	2024/05/14	1		4	7	-8	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577267	150	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600006570	2024/04/29	2024/05/30	2024/06/05	2		0	31	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577404	20	99159478	DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	602024375	2024/04/30	2024/05/08	2024/06/25	10		6	8	-48	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577416	10	95730922	Inject. unit 0200-16 PVC/T/C 4U7-21/100	600005211	2024/04/30	2024/05/30	2024/06/06	1		0	30	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577521	10	97722586	DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-31U7U7BG	600004150	2024/04/30	2024/05/01	2024/05/02	2		29	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577625	10	98149057	tank 100L,PE-transp./black	602013686	2024/04/30	2024/05/24	2024/05/28	1		2	24	-4	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674577625	20	98149057	tank 100L,PE-transp./black	602013686	2024/04/30	2024/05/24	2024/05/28	1		2	24	-4	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674577625	50	97722455	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-32U7U7BG	602013686	2024/05/23	2024/05/24	2024/06/14	1		0	1	-21	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577625	70	98071115	RSL-0690-2L-G5/8 PE/T/C U7	602013686	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	1		4	1	-4	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674577625	80	98071115	RSL-0690-2L-G5/8 PE/T/C U7	602013686	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	1		4	1	-4	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674577625	90	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	602013686	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	1		151	1	-4	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674577625	100	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	602013686	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	1		151	1	-4	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674577651	10	97722430	DDA 7.5-16 FCM-PP/V/C-F-31U003BG	600000469	2024/05/01	2024/05/15	2024/05/16	1		4	14	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577658	10	97721110	DDE 6-10 P-PV/V/C-X-31U003BG	600004330	2024/05/01	2024/05/06	2024/06/18	1		0	5	-43	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577680	10	97722756	DDA 30-4 FCM-PV/V/C-F-31U7U7BG	600004040	2024/05/01	2024/05/28	2024/05/30	1		0	27	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577695	10	99159461	DDA 60-10 FCM-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600006591	2024/05/01	2024/05/02	2024/07/01	1		5	1	-60	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577715	10	97722692	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	602010784	2024/05/01	2024/05/01	2024/05/02	9		24	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577715	20	99171932	E-box 500, Ethernet DDA	602010784	2024/05/01	2024/05/01	2024/05/02	21		34	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577784	20	96529118	DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A4A4B	600006591	2024/05/01	2024/05/23	2024/06/18	1		0	22	-26	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577784	30	99159485	DDA 200-4 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600006591	2024/05/01	2024/05/02	2024/05/07	1		17	1	-5	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577790	10	99082042	Acc.connector PVDf-A7, thread.3/4"NPf	602004263	2024/05/01	2024/05/02	2024/05/03	2		55	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674577842	10	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600004075	2024/05/01	2024/05/02	2024/05/03	1		95	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674577886	10	97721148	DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31U004BG	602012465	2024/05/01	2024/05/02	2024/05/03	1		2	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674577887	20	96529118	DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A4A4B	600004075	2024/05/01	2024/05/06	2024/06/18	1		0	5	-43	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674577958	10	97722389	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600004150	2024/05/02	2024/05/03	2024/05/06	1		7	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578001	10	97722369	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600000043	2024/05/02	2024/05/09	2024/05/14	1		1	7	-5	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674578032	10	97722370	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U003BG	600000043	2024/05/02	2024/05/03	2024/05/07	1		17	1	-4	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578040	10	95730818	MFV-G5/8-10 PV/V U7	600004075	2024/05/02	2024/05/02	2024/05/06	58		99	0	-4	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578061	10	96440448	Acc. cable 5m, pulse, 0/4-20mA in, DME	600004280	2024/05/02	2024/05/03	2024/05/06	1		212	1	-3	Remoción tardía			

GMU2	674578061	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004280	2024/05/02	2024/05/03	2024/05/08	1	10	1	-5	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674578061	40	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004280	2024/05/02	2024/05/03	2024/05/06	1	36	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578061	50	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004280	2024/05/02	2024/05/03	2024/05/06	1	111	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578061	70	97222764	DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-311VVBG	600004280	2024/05/02	2024/05/03	2024/05/06	1	5	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578063	20	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600000088	2024/05/02	2024/05/03	2024/05/07	3	159	1	-4	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578079	10	95730490	Install. Kit 1003 PVC/C-0.17"x1/4"-NL	600004075	2024/05/02	2024/05/03	2024/05/08	6	182	1	-5	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578100	10	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600004055	2024/05/02	2024/05/03	2024/05/06	2	111	1	-3	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674578149	10	97722370	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311003BG	600000059	2024/05/03	2024/05/06	2024/05/09	1	17	3	-3	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578195	10	97722450	DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C-F-311003BG	600004330	2024/05/03	2024/05/06	2024/05/09	1	13	3	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578239	10	97722430	DDA 7.5-16 FCM-PP/V/C-F-311003BG	602024136	2024/05/03	2024/05/06	2024/05/07	1	5	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578294	10	97722659	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-311004BG	600004330	2024/05/04	2024/05/13	2024/05/15	3	2	9	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674578327	10	97722756	DDA 30-4 FCM-PV/V/C-F-31U7U7BG	600004040	2024/05/06	2024/05/28	2024/05/30	1	0	22	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674578340	10	97722655	DDA 17-7 FCM-PV/V/C-F-311004BG	600006570	2024/05/06	2024/05/07	2024/05/09	2	4	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578342	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000043	2024/05/06	2024/05/13	2024/06/06	106	17	7	-24	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674578348	10	97722457	DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	602025358	2024/05/06	2024/05/06	2024/05/08	1	11	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578427	10	97722385	DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31U7U7BG	600005519	2024/05/06	2024/05/07	2024/05/08	1	34	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578442	80	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000486	2024/05/06	2024/05/07	2024/05/08	5	253	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578484	10	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	602022119	2024/05/06	2024/05/07	2024/05/08	4	88	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674578518	10	97722445	DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31U7U7BG	602051614	2024/05/06	2024/05/06	2024/06/25	2	2	0	-50	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578518	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602051614	2024/05/06	2024/05/06	2024/05/17	2	30	0	-11	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578518	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602051614	2024/05/06	2024/05/06	2024/05/08	2	8	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578518	40	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602051614	2024/05/06	2024/05/06	2024/05/08	2	111	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578584	10	97721063	DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31U7U7BG	600000158	2024/05/07	2024/05/07	2024/05/08	1	15	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578624	40	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004364	2024/05/07	2024/05/29	2024/06/05	4	2	22	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674578661	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004150	2024/05/07	2024/05/29	2024/06/05	4	2	22	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674578776	10	97723357	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U7U7BG	602049589	2024/05/07	2024/05/17	2024/05/21	2	3	10	-4	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578776	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602049589	2024/05/07	2024/05/17	2024/06/04	2	8	10	-18	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674578868	10	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000158	2024/05/08	2024/05/09	2024/05/28	2	224	1	-19	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578919	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600016305	2024/05/08	2024/05/08	2024/06/04	4	52	0	-27	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578919	20	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600016305	2024/05/08	2024/05/08	2024/05/09	4	110	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578919	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600016305	2024/05/08	2024/05/08	2024/05/17	4	23	0	-9	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578997	10	97722449	DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C-F-31U7U7BG	600000158	2024/05/08	2024/05/09	2024/05/10	1	6	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674578997	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000158	2024/05/08	2024/05/09	2024/06/05	1	35	1	-27	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579003	10	99159486	DDA 200-4 AR-PV/V/C-F-31A7A7BG	600000115	2024/05/08	2024/05/09	2024/05/10	1	15	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674579009	10	97721094	DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-311003BG	600004330	2024/05/08	2024/05/09	2024/05/10	2	11	1	-1	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674579023	10	97722692	DDA 30-4 AR-PP/T/C-F-31U7U7BG	602004263	2024/05/08	2024/05/09	2024/05/10	1	14	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674579048	10	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600004055	2024/05/08	2024/05/09	2024/05/10	33	62	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674579053	10	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread.1/2"MNPT	600000043	2024/05/08	2024/05/24	2024/05/28	2	191	16	-4	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674579075	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004066	2024/05/09	2024/05/29	2024/06/05	2	2	20	-7	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579075	40	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004066	2024/05/09	2024/05/29	2024/06/05	2	1	20	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579152	10	97722383	DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-32U7U7BG	600000158	2024/05/09	2024/05/10	2024/06/03	1	3	1	-24	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579252	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/05/09	2024/05/10	2024/06/05	1	30	1	-26	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579255	10	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600003895	2024/05/09	2024/05/24	2024/06/20	4	1	15	-27	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579255	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/05/09	2024/05/24	2024/06/05	5	2	15	-12	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579262	20	99159482	DDA 200-4 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600002547	2024/05/09	2024/05/10	2024/05/13	1	30	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674579293	10	97722438	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-311003BG	602004263	2024/05/10	2024/05/31	2024/06/24	4	0	21	-24	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579293	20	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	602004263	2024/05/10	2024/05/31	2024/06/24	4	39	21	-24	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674579293	30	96698715	Acc.plugin,control or level input,straight	602004263	2024/05/10	2024/05/31	2024/06/24	4	31	21	-24	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674579293	40	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	602004263	2024/05/10	2024/05/31	2024/06/24	4	137	21	-24	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674579293	50	96632921	Acc. cable 2m, analog output, straight	602004263	2024/05/10	2024/05/31	2024/06/24	4	15	21	-24	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579293	60	95730815	MFV-G5/8-10 PVC/V U7	602004263	2024/05/10	2024/05/31	2024/06/24	4	57	21	-24	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674579314	10	97722357	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U7U7BG	600002547	2024/05/10	2024/05/13	2024/05/15	2	5	3	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674579352	10	97722658	DDA 17-7 FCM-PP/T/C-F-31U7U7BG	602006153	2024/05/10	2024/05/15	2024/05/22	1	0	5	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579378	10	97722489	DDA 12-10 AR-PP/T/C-F-32U7U7BG	600000158	2024/05/10	2024/05/14	2024/05/16	1	3	4	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674579378	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000158	2024/05/10	2024/05/14	2024/06/05	1	25	4	-22	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579415	30	97722369	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600004428	2024/05/10	2024/05/24	2024/06/07	1	2	14	-14	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579426	30	95730918	Inject. unit 0200-16 PVC/E/C 4U7-21/100	602001430	2024/05/10	2024/05/13	2024/05/16	3	151	3	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674579476	10	97722468	DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-311004BG	600017539	2024/05/10	2024/05/13	2024/05/14	2	5	3	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674579517	10	97722442	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-311003BG	600000158	2024/05/13	2024/05/14	2024/05/17	2	10	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674579570	20	97722369	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600003890	2024/05/13	2024/05/17	2024/06/07	2	4	4	-21	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579637	10	95730926	Inject. unit 0200-16 PV/V/C 4U7-21/100	600000043	2024/05/13	2024/05/14	2024/05/15	1	65	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos

GMU2	674579644	10	96529119	DME 375-10 AR-PV/I/G-S-31A4A4B	602022119	2024/05/13	2024/05/13	2024/05/14	5	8	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación			Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674579651	20	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600004055	2024/05/13	2024/05/14	2024/05/17	22	116	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674579661	10	98071115	RSL-0690-2L-G5/8 PE/T/C U7	600000059	2024/05/13	2024/05/14	2024/05/17	1	4	1	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674579781	10	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600003895	2024/05/14	2024/05/24	2024/06/20	5	1	10	-27	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674579781	20	97702505	Acc.connector PV-A5,pipe thread.1/2"MNPT	600003895	2024/05/14	2024/05/24	2024/05/28	8	198	10	-4	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674579781	30	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600003895	2024/05/14	2024/05/24	2024/05/28	2	50	10	-4	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674579781	40	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/05/14	2024/05/24	2024/06/05	5	2	10	-12	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674579781	50	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600003895	2024/05/14	2024/05/24	2024/05/28	5	44	10	-4	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674579781	60	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003895	2024/05/14	2024/05/24	2024/05/28	5	8	10	-4	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674579845	10	97722366	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-311003BG	600004075	2024/05/14	2024/05/14	2024/05/28	1	0	0	-14	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674579849	10	97722658	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600003895	2024/05/14	2024/05/21	2024/06/03	2	0	7	-13	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674579886	10	97722591	DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-311004BG	600004330	2024/05/14	2024/05/14	2024/05/15	1	2	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674579887	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004040	2024/05/14	2024/05/29	2024/06/05	2	2	15	-7	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674579910	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004040	2024/05/14	2024/05/29	2024/06/05	1	2	15	-7	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674579970	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602025358	2024/05/14	2024/05/29	2024/06/05	12	2	15	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674579983	10	99291651	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-32A7A7BG	600003895	2024/05/14	2024/05/21	2024/06/25	1	1	7	-35	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674580015	10	97722591	DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-311004BG	600004330	2024/05/14	2024/05/21	2024/05/22	2	1	7	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674580083	10	99159454	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600004050	2024/05/15	2024/05/06	2024/05/22	2	132	-9	-16	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580102	10	97722692	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000043	2024/05/15	2024/05/15	2024/05/16	1	12	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580102	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000043	2024/05/15	2024/05/15	2024/05/17	1	4	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580111	10	99159458	DDA 60-10 AR-PV/I/C-F-31A7A7BG	600004330	2024/05/15	2024/05/31	2024/06/10	4	0	16	-10	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674580130	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600006570	2024/05/15	2024/05/30	2024/06/05	3	0	15	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674580173	10	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	600004280	2024/05/15	2024/05/17	2024/06/28	4	4	2	-42	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674580179	10	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-311003BG	600004280	2024/05/15	2024/05/16	2024/05/20	3	11	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580186	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/05/15	2024/05/24	2024/06/06	2	2	9	-13	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674580233	40	99904127	Acc. DME4, M12 T-dist-r, 5 pins, B-cod.	600006591	2024/05/15	2024/05/17	2024/05/20	3	15	2	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580234	10	97722555	DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600003895	2024/05/15	2024/05/16	2024/05/17	1	5	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas	
GMU2	674580240	10	99159471	DDA 120-7 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600000158	2024/05/15	2024/05/16	2024/05/21	1	98	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580243	30	98589048	Acc. cable 3 m, GENibus, straight	602052195	2024/05/15	2024/05/24	2024/06/14	2	42	9	-21	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación	
GMU2	674580248	40	97691905	Acc.connector PP-U7,inch tubing comb.	600000486	2024/05/15	2024/05/16	2024/05/20	20	349	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580248	60	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000486	2024/05/15	2024/05/16	2024/05/20	4	186	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580248	80	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600000486	2024/05/15	2024/05/16	2024/05/20	17	105	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580411	30	97722487	DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000469	2024/05/16	2024/05/23	2024/05/31	6	5	7	-8	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674580444	10	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600004150	2024/05/16	2024/05/07	2024/05/17	4	34	-9	-10	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580444	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004150	2024/05/16	2024/05/07	2024/06/06	4	8	-9	-30	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580468	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004280	2024/05/16	2024/05/17	2024/06/06	10	8	1	-20	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674580468	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004280	2024/05/16	2024/05/17	2024/05/21	10	65	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580468	40	97722586	DDA 17-7 AR-PV/I/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/05/16	2024/05/17	2024/05/21	1	26	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580468	60	97722664	DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/05/16	2024/05/17	2024/05/21	1	1	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580468	90	99082042	Acc.connector PVDf-A7, thread.3/4"NPT	600004280	2024/05/16	2024/05/17	2024/05/21	2	53	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580468	100	99159462	DDA 60-10 FCM-PVC/I/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/05/16	2024/05/17	2024/05/21	2	3	1	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580523	10	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600005281	2024/05/16	2024/05/17	2024/05/21	5	146	1	-4	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580535	10	95730436	Acc. adaptor PV/T-nut.G11/4-G5/8	600000382	2024/05/17	2024/05/17	2024/05/21	2	15	0	-4	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580542	10	95905001	DME 375-10 AR-PP/E/G-F-32A2A2F	602022119	2024/05/17	2024/05/20	2024/05/21	2	26	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580542	20	96529119	DME 375-10 AR-PV/I/G-S-31A4A4B	602022119	2024/05/17	2024/05/20	2024/05/21	3	3	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580594	10	97722373	DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600004150	2024/05/17	2024/05/20	2024/05/22	1	4	3	-2	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas	
GMU2	674580594	30	97722680	DDA 30-4 AR-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600004150	2024/05/17	2024/05/20	2024/05/22	1	8	3	-2	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas	
GMU2	674580594	40	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600004150	2024/05/17	2024/05/20	2024/05/22	2	35	3	-2	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloqueo Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas	
GMU2	674580620	30	97722381	DDA 7.5-16 AR-PV/I/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/05/17	2024/05/20	2024/05/21	2	18	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674580625	10	97721110	DDE 6-10 P-PV/I/C-X-311003BG	600004330	2024/05/17	2024/05/24	2024/06/20	1	0	7	-27	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674580645	10	97721098	DDE 6-10 P-PVC/I/C-X-311003BG	600004330	2024/05/17	2024/05/22	2024/06/07	2	10	5	-16	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674580659	10	97721110	DDE 6-10 P-PV/I/C-X-311003BG	600004330	2024/05/17	2024/05/24	2024/06/17	3	0	7	-24	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674580680	10	97721098	DDE 6-10 P-PVC/I/C-X-311003BG	600004330	2024/05/17	2024/05/22	2024/06/07	2	10	5	-16	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación	
GMU2	674580693	10	97721080	DDE 6-10 B-PV/T/C-X-311003BG	602001430	2024/05/17	2024/05/20	2024/05/21	1	48	3	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos	
GMU2	674																

GMU2	674580711	20	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600004330	2024/05/17	2024/05/16	2024/05/20	1	186	-1	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674580711	30	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600004330	2024/05/17	2024/05/16	2024/05/20	1	186	-1	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674580717	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004075	2024/05/17	2024/05/20	2024/06/07	14	24	3	-18	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674580728	20	96440448	Acc. cable 5m, pulse, 0/4-20mA in, DME	600005186	2024/05/17	2024/05/20	2024/05/29	1	198	3	-9	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674580741	10	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600004330	2024/05/17	2024/05/17	2024/05/20	3	159	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674580746	10	99159457	DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600003890	2024/05/17	2024/05/20	2024/05/21	1	11	3	-1	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674580753	80	99159462	DDA 60-10 FCM-PVC/C-X-F-31A7A7BG	600000046	2024/05/19	2024/05/20	2024/05/21	1	3	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674580758	20	97721052	DDE 6-10 B-PP/E/C-X-311003BG	600000486	2024/05/20	2024/05/21	2024/05/22	4	18	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674580758	50	97721098	DDE 6-10 P-PVC/C-X-311003BG	600000486	2024/05/20	2024/05/21	2024/05/22	1	11	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674580758	100	97722358	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-311003BG	600000486	2024/05/20	2024/05/21	2024/05/22	2	10	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674580758	110	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600000486	2024/05/20	2024/05/21	2024/05/22	4	66	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674580825	10	97721080	DDE 6-10 B-PV/T/C-X-311003BG	600004330	2024/05/20	2024/05/21	2024/06/07	1	48	1	-17	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674580848	10	95905799	DME 375-10 AR-PV/T/C-F-31A4A4B	600005186	2024/05/20	2024/05/21	2024/06/14	1	0	1	-24	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674580885	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004075	2024/05/20	2024/05/28	2024/06/17	58	8	8	-20	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674580934	10	97722370	DDA 7.5-16 AR-PVC/C-X-F-311003BG	600000043	2024/05/20	2024/05/28	2024/06/28	1	10	8	-31	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674580940	10	96529120	DME 375-10 AR-SS/V/SS-F-31A4A4B	602001571	2024/05/20	2024/05/20	2024/05/21	1	5	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674580943	10	97724454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-311003BG	602005415	2024/05/20	2024/05/28	2024/06/07	1	3	8	-10	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674580968	10	99159482	DDA 200-4 AR-PVC/C-X-F-31A7A7BG	600000045	2024/05/20	2024/05/21	2024/05/22	1	25	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581081	20	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2024/05/21	2024/05/22	2024/06/14	1	1	1	-23	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581081	50	98071139	RSL-0980-2L-G5/8 PE/T/C U7	600012110	2024/05/22	2024/05/22	2024/05/23	1	14	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581081	60	95730954	Inject. unit 0202-16 PVC/C 4U7-21/100	600012110	2024/05/22	2024/05/22	2024/05/23	1	23	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581140	10	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-311003BG	600005455	2024/05/21	2024/05/22	2024/05/23	2	22	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674581175	10	97702494	Acc.connect. PVC-AS,pipe thread,1/2"MNPT	600000043	2024/05/21	2024/05/31	2024/06/03	4	215	10	-3	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674581197	10	99159454	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600004389	2024/05/21	2024/05/22	2024/05/23	4	147	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581242	20	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600000158	2024/05/22	2024/05/23	2024/05/28	5	151	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581242	40	9772591	DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-311004BG	600000158	2024/05/22	2024/05/23	2024/05/28	2	4	1	-5	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581257	40	99159468	DDA 120-7 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600000059	2024/05/22	2024/05/23	2024/05/24	1	9	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581267	10	95730515	Install.kit 1013 PVC/E/C-0.17"x1/4"-2L	600000204	2024/05/22	2024/05/29	2024/06/06	2	0	7	-8	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581293	10	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000043	2024/05/22	2024/05/28	2024/06/20	2	1	6	-23	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581293	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000043	2024/05/22	2024/05/28	2024/06/06	2	2	6	-9	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581298	10	97721098	DDE 6-10 P-PVC/C-X-311003BG	600004330	2024/05/22	2024/05/24	2024/05/29	1	7	2	-5	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581299	10	97721098	DDE 6-10 P-PVC/C-X-311003BG	600004330	2024/05/22	2024/05/24	2024/05/30	1	7	2	-6	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581313	20	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	600000043	2024/05/22	2024/05/23	2024/05/24	1	12	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581313	30	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	600000043	2024/05/22	2024/05/23	2024/05/24	1	138	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581313	40	95730493	Install. Kit 1003 PV/V/C-0.17"x1/4"-NL	600000043	2024/05/22	2024/05/23	2024/05/24	1	71	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581313	50	95730501	Install. Kit 1006 PV/V/C-1/4"x3/8"-NL	600000043	2024/05/22	2024/05/23	2024/05/24	1	100	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581313	60	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000043	2024/05/22	2024/05/23	2024/05/24	1	149	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581379	10	91835723	Connector - DN 20 PVC to 3/4in MNPT	600004341	2024/05/22	2024/05/23	2024/05/24	1	25	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674581404	10	95730491	Install. Kit 1003 PVC/E/C-0.17"x1/4"-NL	600005455	2024/05/22	2024/05/23	2024/05/24	6	92	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674581404	20	95730490	Install. Kit 1003 PVC/C-X-0.17"x1/4"-NL	600005455	2024/05/22	2024/05/23	2024/05/24	4	112	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674581553	10	95905799	DME 375-10 AR-PV/T/C-F-31A4A4B	600003895	2024/05/23	2024/05/30	2024/06/17	1	1	7	-18	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581565	20	97722659	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-311004BG	600004330	2024/05/23	2024/05/30	2024/06/11	6	4	7	-12	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581626	10	95730820	MPV-G5/8-10 PV/T U7	600003895	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	3	137	1	-4	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674581633	10	95730818	MPV-G5/8-10 PV/V U7	600003165	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	2	33	1	-4	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674581653	10	95730820	MPV-G5/8-10 PV/T U7	600004280	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	1	137	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581653	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004280	2024/05/23	2024/05/24	2024/06/20	4	2	1	-27	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581653	40	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004280	2024/05/23	2024/05/24	2024/06/20	7	8	1	-27	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581653	50	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004280	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	3	44	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581653	60	917702494	Acc.connect. PVC-AS,pipe thread,1/2"MNPT	600004280	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	9	191	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581653	70	97722457	DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31VWBG	600004280	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	2	15	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581653	80	97722471	DDA 12-10 AR-PVC/C-X-F-31U7U7BG	600004280	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	1	2	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581653	120	99159467	DDA 60-10 FCM-SS/T/SS-F-31A3A3BG	600004280	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	5	33	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581653	130	99159490	DDA 200-4 FCM-PVC/C-X-F-31A7A7BG	600004280	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	3	10	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581658	10	98070956	FV-NL-G5/8 PE/T/C U7	602004263	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/28	2	58	1	-4	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674581671	10	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	602005415	2024/05/23	2024/05/24	2024/05/30	1	50	1	-6	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581671	20	97722658	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602005415	2024/05/23	2024/05/29	2024/06/03	1	1	6	-5	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581671	30	95730820	MPV-G5/8-10 PV/T U7	602005415	2024/05/23	2024/05/29	2024/05/30	1	128	6	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581846	10	95730499	Install. Kit 1006 PVC/E/C-1/4"x3/8"-NL	600000158	2024/05/24	2024/05/28	2024/06/18	1	0	4	-21	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581860	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600006591	2024/05/24	2024/05/28	2024/05/30	15	44	4	-2	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674581860	40	99159464	DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31A7A7BG	600006591	2024/05/24	2024/05/28	2024/05/30	6	50	4	-2	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674581875	10	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600003895	2024/05/24	2024/05/31	2024/06/20	1	1	7	-20	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación

GMU2	674581895	10	97722457	DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600004075	2024/05/27	2024/05/24	2024/06/07	1	15	-3	-14	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581998	10	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000043	2024/05/28	2024/05/29	2024/05/30	6	42	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582078	10	97722383	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-32U7U7BG	600000158	2024/05/28	2024/05/30	2024/06/20	1	6	2	-21	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582139	50	97721098	DDE 6-10 P-PVC/C-C-X-311003BG	600000486	2024/05/29	2024/05/30	2024/06/04	1	6	1	-5	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582139	80	95730918	Inject. unit 0200-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600000486	2024/05/29	2024/05/30	2024/06/04	4	145	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582139	170	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000486	2024/05/29	2024/05/30	2024/06/04	4	42	1	-5	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582178	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600000059	2024/05/29	2024/05/30	2024/06/03	6	33	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582178	40	98070973	FV-2L-G5/8 PV/T/C U7	600000059	2024/05/29	2024/05/30	2024/06/03	4	58	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582186	60	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-311003BG	600000059	2024/05/29	2024/05/30	2024/06/03	2	9	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582178	80	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600000059	2024/05/29	2024/05/30	2024/06/03	4	41	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582178	90	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000059	2024/05/29	2024/05/30	2024/06/03	2	42	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582178	150	99159468	DDA 120-7 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600000059	2024/05/29	2024/05/30	2024/06/03	1	8	1	-4	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582298	10	99159454	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	602001430	2024/05/29	2024/05/30	2024/05/31	1	162	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582305	10	95730817	MFV-G5/8-10 PVC/T U7	600012110	2024/05/29	2024/05/30	2024/05/31	10	3	1	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582492	10	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	602005704	2024/05/30	2024/05/31	2024/06/03	1	41	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582505	10	97722453	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600000096	2024/05/30	2024/05/31	2024/06/20	3	1	1	-20	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582525	10	97722383	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-32U7U7BG	600003895	2024/05/30	2024/05/31	2024/06/28	3	4	1	-28	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582558	10	97722457	DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600004150	2024/05/30	2024/05/31	2024/06/03	1	8	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582600	10	96527111	Acc.cable 5m, ext.Stop in dosing out,DME	600004280	2024/05/30	2024/05/31	2024/06/03	2	121	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582600	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004280	2024/05/30	2024/05/31	2024/06/20	21	0	1	-20	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582600	40	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004280	2024/05/30	2024/05/31	2024/06/03	2	11	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582600	50	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread,1/2"MNPT	600004280	2024/05/30	2024/05/31	2024/06/03	17	215	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582617	10	99159471	DDA 120-7 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	602050876	2024/05/30	2024/05/31	2024/06/03	4	87	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582653	10	97722692	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	602002052	2024/05/30	2024/05/31	2024/06/20	2	0	1	-20	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582653	40	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602002052	2024/05/30	2024/05/31	2024/06/20	5	0	1	-20	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582671	10	99159468	DDA 120-7 AR-PVC/E/C-F-31A7A7BG	600000043	2024/05/31	2024/05/30	2024/05/31	2	8	-1	-1	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582671	20	95730816	MFV-G5/8-10 PVC/E U7	600000043	2024/05/31	2024/05/30	2024/05/31	2	7	-1	-1	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582720	10	97702494	Acc.connect. PVC-A9,pipe thread,1/2"MNPT	600000043	2024/05/31	2024/05/31	2024/06/03	1	215	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582720	20	97722680	DDA 30-4 AR-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600000043	2024/05/31	2024/05/31	2024/06/03	1	3	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674565194	100	98149266	Tank 500L,PE-transp./black	600000043	2024/02/20	2024/05/01	2024/05/07	1	0	71	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581148	10	97722374	DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-311003BG	600004334	2024/05/21	2024/05/22	2024/05/23	2	0	1	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674560924	10	97722425	DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31U7U7BG	600000096	2024/01/26	2024/06/17	2024/06/21	4	20	143	-4	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674560924	20	98149266	Tank 500L,PE-transp./black	600000096	2024/01/26	2024/06/17	2024/06/21	1	4	143	-4	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674562345	20	98149245	Tank 300L,PE-transp./black	600000096	2024/02/03	2024/06/04	2024/06/19	4	3	122	-15	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674574085	10	96529118	DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A4A4B	602005415	2024/04/10	2024/06/04	2024/06/18	2	0	55	-14	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575653	10	97722437	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/04/19	2024/06/26	2024/06/27	1	9	68	-1	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674575653	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004280	2024/04/19	2024/06/26	2024/06/27	1	0	68	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575653	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004280	2024/04/19	2024/06/26	2024/06/27	1	6	68	-1	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674575655	10	97722437	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/04/19	2024/06/26	2024/06/27	1	9	68	-1	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674575655	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004280	2024/04/19	2024/06/26	2024/06/27	1	0	68	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575655	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004280	2024/04/19	2024/06/26	2024/06/27	1	6	68	-1	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674575658	10	97722437	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/04/19	2024/06/26	2024/06/27	1	9	68	-1	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674575658	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004280	2024/04/19	2024/06/26	2024/06/27	1	0	68	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575658	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004280	2024/04/19	2024/06/26	2024/06/27	1	6	68	-1	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674575659	10	97722437	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/04/19	2024/06/26	2024/06/27	2	9	68	-1	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674575659	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004280	2024/04/19	2024/06/26	2024/06/27	2	0	68	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674575659	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004280	2024/04/19	2024/06/26	2024/06/27	2	6	68	-1	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674575725	40	97722365	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600000059	2024/04/19	2024/06/05	2024/06/07	1	0	47	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674576681	30	95730507	Install. Kit 1004 PVC/E/C-3/8"x1/2"-NL	600001751	2024/04/25	2024/06/18	2024/06/20	1	0	54	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674579033	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/05/08	2024/06/04	2024/06/05	6	0	27	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674580827	10	97722383	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-32U7U7BG	602049764	2024/05/20	2024/06/07	2024/06/14	3	3	18	-7	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674580872	10	97722370	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311003BG	602049764	2024/05/20	2024/06/07	2024/06/28	1	10	18	-21	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674580991	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000059	2024/05/21	2024/06/04	2024/06/05	1	0	14	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581035	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602050661	2024/05/21	2024/06/04	2024/06/06	10	0	14	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581266	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600006570	2024/05/22	2024/06/04	2024/06/06	1	0	13	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581313	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000043	2024/05/22	2024/06/04	2024/06/06	1	0	13	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581343	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000043	2024/05/22	2024/06/04	2024/06/06	3	0	13	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581343	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000043	2024/05/22	2024/06/18	2024/06/20	5	20	27	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de bloque	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581355	10	98070958	FV-NL-G5/8 PV/T/C U7	600003895	2024/05/22	2024/06/25	2024/06/27	2	180	34	-2	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674581535	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602050845	2024/05/23	2024/06/11	2024/06/17	2	1	19	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación

GMU2	674581535	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602050845	2024/05/23	2024/06/11	2024/06/17	2		1	19	-6	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581664	10	97722559	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-311004BG	600004330	2024/05/23	2024/06/06	2024/06/07	3		4	14	-1	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581664	20	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600004330	2024/05/23	2024/06/06	2024/06/07	3		111	14	-1	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581693	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004389	2024/05/23	2024/06/18	2024/06/20	40		0	26	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581693	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004389	2024/05/23	2024/06/18	2024/06/20	30		20	26	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581805	40	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602050845	2024/05/24	2024/06/13	2024/06/20	8		0	20	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581860	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600006591	2024/05/24	2024/06/18	2024/06/20	15		0	25	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581876	10	97721110	DDE 6-10 P-PV/G/C-X-311003BG	600004330	2024/05/24	2024/06/07	2024/06/20	1		0	14	-13	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581951	10	9772366	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-311003BG	600004432	2024/05/28	2024/06/04	2024/06/07	1		12	7	-3	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674581983	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004040	2024/05/28	2024/06/18	2024/06/20	2		0	21	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674581990	30	95730325	valve - PV-G5/8-3PP/V/C X nutG5/8	600004330	2024/05/28	2024/06/04	2024/06/13	4		6	7	-9	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582009	10	95730503	Install. Kit 1006 PV/T/C-1/4"x3/8"-NL	600003898	2024/05/28	2024/06/04	2024/06/05	2		85	7	-1	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582178	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000059	2024/05/29	2024/06/18	2024/06/20	6		0	20	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582178	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000059	2024/05/29	2024/06/18	2024/06/20	4		20	20	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582178	50	98070970	FV-2L-G5/8 PE/V/E/C U7	600000059	2024/05/29	2024/06/11	2024/06/14	4		191	13	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582182	10	97722587	DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-311004BG	600000469	2024/05/29	2024/06/10	2024/06/11	1		4	12	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582182	20	97722438	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-311003BG	600000469	2024/05/29	2024/06/10	2024/06/20	1		0	12	-10	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582182	30	99159493	DDA 200-4 FCM-PV/V/C-F-31A7A7BG	600000469	2024/05/29	2024/06/10	2024/06/11	4		23	12	-1	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582182	40	96529118	DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A4A4B	600000469	2024/05/29	2024/06/10	2024/06/18	1		0	12	-8	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582258	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004075	2024/05/29	2024/06/19	2024/06/20	36		0	21	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582286	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004334	2024/05/29	2024/06/18	2024/06/20	2		0	20	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582286	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004334	2024/05/29	2024/06/18	2024/06/20	2		20	20	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582496	10	99406010	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C with acc. SUEZ US	600003895	2024/05/30	2024/06/03	2024/06/04	1		16	4	-1	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582516	10	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600003895	2024/05/30	2024/06/03	2024/06/25	1		11	4	-22	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582516	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/05/30	2024/06/03	2024/06/27	1		0	4	-24	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582516	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003895	2024/05/30	2024/06/03	2024/06/27	1		0	4	-24	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582580	10	97722433	DDA 7.5-16 FCM-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600003890	2024/05/30	2024/06/14	2024/06/27	1		12	15	-13	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582580	20	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600003890	2024/05/30	2024/06/14	2024/06/27	1		10	15	-13	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582664	10	97722386	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-311003BG	600000063	2024/05/30	2024/06/05	2024/06/18	2		8	6	-13	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582725	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600006591	2024/05/31	2024/06/18	2024/06/20	2		0	18	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582771	10	98070958	FV-NL-G5/8 PV/T/C U7	600000043	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	1		158	3	-3	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582791	10	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600003895	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/04	1		11	3	-1	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582791	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/20	1		0	3	-17	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582791	30	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600003895	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/20	1		0	3	-17	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582806	10	97722760	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	602005415	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/28	15		2	3	-25	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582820	10	97722761	DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-311004BG	600004330	2024/05/31	2024/06/07	2024/06/28	1		2	7	-21	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582820	20	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600004330	2024/05/31	2024/06/07	2024/06/28	1		95	7	-21	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674582883	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004040	2024/05/31	2024/06/19	2024/06/20	1		0	19	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582946	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000059	2024/06/03	2024/06/19	2024/06/20	3		0	16	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582976	10	97722357	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U7U7BG	602005395	2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	1		0	1	-3	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674582980	10	98589048	Acc. cable 3 m, GENibus, straight	600004335	2024/06/03	2024/06/04	2024/06/21	4		41	1	-17	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583016	10	97722362	DDA 7.5-16 AR-PP/PV/C-F-311003BG	600000063	2024/06/03	2024/06/19	2024/06/20	2		8	16	-1	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674583016	20	95730488	Install. Kit 1003 PP/V/C-0.17"x1/4"-NL	600000063	2024/06/03	2024/06/19	2024/06/20	1		16	16	-1	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674583016	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000063	2024/06/03	2024/06/19	2024/06/20	1		0	16	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583044	10	97722369	DDA 7.5-16 AR-PVC/C-F-31U7U7BG	600000025	2024/06/03	2024/06/19	2024/06/28	1		2	16	-9	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583077	10	95730727	Acc.inlays PVC-R,tubing 1/4x3/8	602001430	2024/06/03	2024/06/04	2024/06/06	8		12	1	-2	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583077	50	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602001430	2024/06/03	2024/06/18	2024/06/20	29		20	15	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583192	10	97722487	DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	602004263	2024/06/04	2024/06/03	2024/06/05	2		7	-1	-2	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583192	20	97702505	Acc.connector PV-A9,pipe thread.1/2"MNPT	602004263	2024/06/04	2024/06/03	2024/06/05	2		190	-1	-2	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583246	20	97722559	DDA 12-10 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600006570	2024/06/04	2024/06/06	2024/06/07	1		6	2	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583257	10	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2024/06/04	2024/06/04	2024/06/14	1		2	0	-10	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583257	20	98071138	RLS-0980-2L-G5/8 PE/V/E/C U7	600012110	2024/06/04	2024/06/04	2024/06/10	1		61	0	-6	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583276	10	95730503	Install. Kit 1006 PV/T/C-1/4"x3/8"-NL	600005141	2024/06/04	2024/06/06	2024/06/11	5		89	2	-5	Datos modificados en la orden de venta	Datos modificados en la orden de venta	Manejo de ordenes de venta	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583279	20	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600004040	2024/06/04	2024/06/05	2024/06/06	10		115	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583279	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004040	2024/06/04	2024/06/19	2024/06/20	10		0	15	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583310	10	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600000043	2024/06/04	2024/06/05	2024/06/10	4		135	1	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583310	20	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000043	2024/06/04	2024/06/05	2024/06/27	4		5	1	-22	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583333	10	97722362	DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-311003BG	600000158	2024/06/04	2024/06/06	2024/06/10	1		6	2	-4	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583355	20	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600006570	2024/06/04	2024/06/06	2024/06/11	1		111	2	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583355	30	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600006570	2024/06/04	2024/06/06	2024/06/11	1		5	2	-5	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583404	20	97721059	DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31U7U7BG	600002547	2024/06/04	2024/06/05	2024/06/07	1		1	1	-2	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía del bloqueo Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos

GMU2	674583535	10	97721110	DDE 6-10 P-PV/V/C-X-310038G	600004330	2024/06/05	2024/06/12	2024/06/25	1	0	7	-13	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583639	10	97722437	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U7U78G	600000469	2024/06/05	2024/06/07	2024/06/12	1	0	2	-5	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583659	10	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U78G	602051614	2024/06/05	2024/06/12	2024/06/28	2	11	7	-16	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583659	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602051614	2024/06/05	2024/06/12	2024/06/20	2	4	7	-8	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583659	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602051614	2024/06/05	2024/06/12	2024/06/20	2	0	7	-8	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583659	40	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602051614	2024/06/05	2024/06/12	2024/06/20	2	0	7	-8	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583659	60	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602051614	2024/06/05	2024/06/12	2024/06/20	2	4	7	-8	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583659	70	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	602051614	2024/06/05	2024/06/12	2024/06/20	2	0	7	-8	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583659	80	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602051614	2024/06/05	2024/06/12	2024/06/20	2	0	7	-8	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583665	10	97722659	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-3110048G	600004330	2024/06/05	2024/06/12	2024/06/14	1	0	7	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583769	10	97722689	DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-3110048G	600000158	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/11	1	5	1	-4	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583799	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000043	2024/06/06	2024/06/18	2024/06/20	1	20	12	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583830	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000043	2024/06/06	2024/06/24	2024/06/27	10	69	18	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583877	10	97702494	Acc.connect. PVC-AG,pipe thread.1/2"MNPT	602001430	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/10	1	147	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583877	20	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	602001430	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/10	1	37	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583877	30	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	602001430	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/10	1	137	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583877	40	96632921	Acc. cable 2m, analog output, straight	602001430	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/10	1	15	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583922	20	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600004280	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/27	8	0	1	-20	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583922	30	97722369	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U7U78G	600004280	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/17	1	5	1	-10	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583922	50	97722662	DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-31VVBG	600004280	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/12	1	0	1	-5	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583922	80	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A78G	600004280	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/10	1	13	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583922	90	99159469	DDA 120-7 AR-PVC/V/C-F-31A7A78G	600004280	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/10	1	21	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583922	100	99171932	E-box 500, Ethernet DDA	600004280	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/10	2	52	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674583931	10	97722437	DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U7U78G	600003895	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/12	1	0	1	-5	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674583931	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600003895	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/20	1	15	1	-13	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674584006	50	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000158	2024/06/07	2024/06/10	2024/06/20	8	5	3	-10	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674584006	70	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600000158	2024/06/07	2024/06/10	2024/06/27	6	0	3	-17	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674584030	10	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U78G	600000469	2024/06/07	2024/06/11	2024/06/18	6	13	4	-7	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674584030	20	97722454	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-3110038G	600000469	2024/06/07	2024/06/11	2024/06/28	2	2	4	-17	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674584050	10	97702494	Acc.connect. PVC-AG,pipe thread.1/2"MNPT	602001430	2024/06/07	2024/06/06	2024/06/10	1	149	-1	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584050	20	96609014	Acc. cable 2m, control input, straight	602001430	2024/06/07	2024/06/06	2024/06/10	1	37	-1	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584050	30	96609017	Acc. cable 2m, relay output, straight	602001430	2024/06/07	2024/06/06	2024/06/10	1	137	-1	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584050	40	96632921	Acc. cable 2m, analog output, straight	602001430	2024/06/07	2024/06/06	2024/06/10	1	15	-1	-4	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584050	50	99159472	DDA 120-7 AR-PV/V/C-F-31A7A78G	602001430	2024/06/07	2024/06/06	2024/06/26	1	0	-1	-20	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674584071	20	96440448	Acc. cable 5m, pulse, 0/4-20mA in, DME	600004330	2024/06/07	2024/06/07	2024/06/20	1	197	0	-13	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584077	10	95730817	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600002010	2024/06/07	2024/06/07	2024/06/10	1	13	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584102	10	97721117	DDE 6-10 P-SS/T/SS-X-31VVBG	600000088	2024/06/07	2024/06/07	2024/06/10	1	5	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584103	10	99159457	DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-31A7A78G	600000043	2024/06/07	2024/06/10	2024/06/11	1	16	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584232	10	95730926	Inject. unit 0200-16 PV/V/C 4U7-21/100	600006570	2024/06/10	2024/06/17	2024/06/27	1	42	7	-10	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584310	10	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	602025358	2024/06/10	2024/06/11	2024/06/13	1	85	1	-2	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584317	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600006570	2024/06/10	2024/06/18	2024/06/20	3	20	8	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584326	10	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004150	2024/06/10	2024/06/18	2024/06/20	1	0	8	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674584351	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000158	2024/06/10	2024/06/19	2024/06/20	10	0	9	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674584358	10	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A78G	600000022	2024/06/10	2024/06/11	2024/06/12	2	17	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584358	20	96440448	Acc. cable 5m, pulse, 0/4-20mA in, DME	600000022	2024/06/10	2024/06/11	2024/06/12	1	197	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584412	10	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U78G	600000158	2024/06/11	2024/06/12	2024/06/18	5	13	1	-6	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584426	10	96529006	DME 375-10 AR-PP/E/G-F-31A4A4B	602001430	2024/06/11	2024/06/12	2024/06/13	2	2	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584453	10	97722591	DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-3110048G	600004428	2024/06/11	2024/06/12	2024/06/13	1	7	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584489	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602013897	2024/06/11	2024/06/11	2024/06/20	4	1	0	-9	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674584489	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	602013897	2024/06/11	2024/06/11	2024/06/20	4	3	0	-9	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674584496	10	99159471	DDA 120-7 AR-PV/T/C-F-31A7A78G	600000469	2024/06/11	2024/06/23	2024/06/27	1	67	12	-4	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584525	10	97722366	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-3110038G	600000043	2024/06/11	2024/06/13	2024/06/14	1	8	2	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584525	20	95730820	MFV-G5/8-10 PV/T U7	600000043	2024/06/11	2024/06/13	2024/06/14	1	82	2	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584535	10	99406010	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C with acc. SUEZ US	600003895	2024/06/11	2024/06/18	2024/06/21	1	12	7	-3	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584577	10	97722366	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-3110038G	600005455	2024/06/11	2024/06/12	2024/06/13	6	8	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584592	10	98070958	PV-NL-G5/8 PV/T/C U7	600004150	2024/06/11	2024/06/12	2024/06/13	5	187	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584605	10	97722442	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-3110038G	600000158	2024/06/11	2024/06/13	2024/06/14	2	18	2	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía de pedidos	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584802	20	97722689	DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-3110048G	600005455	2024/06/14	2024/06/14	2024/06/17	1	4	0	-3	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674584845	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000045	2024/06/12	2024/06/19	2024/06/20	2	0	7	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación

GMU2	674584919	90	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600000158	2024/06/13	2024/06/18	2024/06/20	2	0	5	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674584919	100	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000158	2024/06/13	2024/06/14	2024/06/27	2	2	1	-13	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674585104	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600002547	2024/06/13	2024/06/18	2024/06/20	2	0	5	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674585173	30	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000486	2024/06/14	2024/06/18	2024/06/27	2	0	4	-9	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674585186	10	97722696	DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31VVBG	600004280	2024/06/14	2024/06/18	2024/06/20	1	3	4	-2	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674585186	20	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/06/14	2024/06/18	2024/06/20	1	19	4	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674585193	10	97722555	DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/06/14	2024/06/17	2024/06/18	3	4	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674585257	10	97722383	DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-32U7U7BG	600000158	2024/06/14	2024/06/17	2024/06/28	2	0	3	-11	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674585263	20	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600000158	2024/06/14	2024/06/18	2024/06/20	2	0	4	-2	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674585295	10	97721076	DDE 6-10 B-PV/G/C-X-311003BG	602005395	2024/06/14	2024/06/17	2024/06/18	6	20	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674585346	40	97722574	DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600000469	2024/06/14	2024/06/21	2024/06/27	1	10	7	-6	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674585465	10	99904127	Acc. DME4, M12 T-dist.r., 5 pins, B-cod.	600000043	2024/06/17	2024/06/18	2024/06/20	6	11	1	-2	Otros	Otros	Otros	Otros
GMU2	674585482	10	99406010	DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C with acc. SUEZ US	600003895	2024/06/17	2024/06/17	2024/06/18	1	12	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674585531	20	97702494	Acc.connect. PVC-AC,pipe thread.1/2"MNPT	600004280	2024/06/17	2024/06/18	2024/06/19	1	140	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674585615	20	97722385	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U7U7BG	600005519	2024/06/18	2024/06/18	2024/06/20	1	19	0	-2	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674585724	20	99171932	E-box 500, Ethernet DDA	602005415	2024/06/18	2024/06/19	2024/06/25	3	42	1	-6	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674585724	30	95730820	MPV-G5/8-10 PV/T U7	602005415	2024/06/18	2024/06/19	2024/06/25	3	71	1	-6	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674585796	10	99159471	DDA 120-7 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	602005395	2024/06/18	2024/06/19	2024/06/21	1	69	1	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674585850	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004040	2024/06/19	2024/06/25	2024/06/26	4	0	6	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674585930	30	97722689	DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-311004BG	600000158	2024/06/19	2024/06/20	2024/06/25	1	3	1	-5	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674586051	10	97722586	DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-31U7U7BG	600017539	2024/06/19	2024/06/20	2024/06/24	1	21	1	-4	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674586057	10	95730815	MPV-G5/8-10 PVC/V U7	600003898	2024/06/19	2024/06/20	2024/06/21	2	46	1	-1	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586057	20	97691906	Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb.	600003898	2024/06/19	2024/06/20	2024/06/27	8	0	1	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674586057	30	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600003898	2024/06/19	2024/06/20	2024/06/27	2	2	1	-7	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674586057	60	95730918	Inject. unit 0200-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600003898	2024/06/19	2024/06/20	2024/06/21	2	149	1	-1	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586057	70	98070955	FV-NL-G5/8 PE/V,E/C U7	600003898	2024/06/19	2024/06/20	2024/06/21	2	175	1	-1	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Remoción tardía del bloque Y (Cliente)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586060	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000158	2024/06/19	2024/06/20	2024/06/27	1	188	1	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674586064	30	96632921	Acc. cable 2m, analog output, straight	600000486	2024/06/19	2024/06/20	2024/06/25	1	11	1	-5	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Remoción tardía del bloque Z (Finanzas)	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674586067	20	97691907	Acc.connector PV-U7,inch tubing comb.	600000158	2024/06/19	2024/06/20	2024/06/27	20	2	1	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674586095	10	97722659	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-311004BG	600004330	2024/06/19	2024/06/21	2024/06/28	1	0	2	-7	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674586110	10	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000395	2024/06/20	2024/06/25	2024/06/27	1	1	5	-2	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586151	10	97722441	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U7U7BG	600012110	2024/06/20	2024/06/25	2024/06/28	2	0	5	-3	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674586175	70	95730815	MPV-G5/8-10 PVC/V U7	602001430	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	2	46	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586175	80	95730818	MPV-G5/8-10 PV/V U7	602001430	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	2	29	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	10	95730914	Inject. unit 0200-16 PVC/V/C 4U7-21/100	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	4	46	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	20	95730918	Inject. unit 0200-16 PVC/E/C 4U7-21/100	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	1	141	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	40	95730934	Inject. unit 0200-16 PV/T/C 4U7-21/100	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	2	103	1	-3	Fecha no alineada con fechas de ruta	Fecha no alineada con fechas de ruta	Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	50	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/27	14	57	1	-6	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674586282	60	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/27	13	39	1	-6	Falta de existencias	Falta de existencias	Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674586282	70	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/27	12	34	1	-6	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674586282	80	97722658	DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	2	2	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	90	97722672	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	1	2	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	100	97722673	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-311004BG	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	1	9	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	110	97722676	DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	1	8	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	150	98070955	FV-NL-G5/8 PE/V,E/C U7	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	5	169	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	160	98070957	FV-NL-G5/8 PV/V,E/C U7	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	3	9	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	170	98070958	FV-NL-G5/8 PV/T/C U7	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	2	182	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	180	99159455	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	3	10	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	190	99159456	DDA 60-10 AR-PV/E/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/26	3	0	1	-5	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674586282	200	99159457	DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-31A7A7BG	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	2	11	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586282	210	99159467	DDA 60-10 FCM-SS/T/SS-F-31A3A3BG	600004280	2024/06/20	2024/06/21	2024/06/24	1	28	1	-3	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586333	10	96529118	DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A4A4B	600000382	2024/06/21	2024/06/21	2024/06/25	1	18	0	-4	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586360	10	95730506	Install. Kit 1004 PVC/V/C-3/8"x1/2"-NL	602001430	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/25	2	23	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586360	20	95730507	Install. Kit 1004 PVC/E/C-3/8"x1/2"-NL	602001430	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/25	2	5	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586360	30	95730818	MPV-G5/8-10 PV/V U7	602001430	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/25	2	24	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586499	10	97722676	DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U7U7BG	600004334	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/25	1	8	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586530	10	97722425	DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31U7U7BG	602022119	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/25	2	16	3	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586568	10	99291626	DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-32A7A7BG	600000046	2024/06/24	2024/06/25	2024/06/26	4	9	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586568	50	98589048	Acc. cable 3 m, GENibus, straight	600000046	2024/06/24	2024/06/25	2024/06/26	5	22	1	-1	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Remoción tardía del bloque R (Robot)	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586602	10	97722591	DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-311004BG	600000204	2024/06/24	2024/06/24	2024/06/25	1	15	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586602	20	98070973	FV-2L-G5/8 PV/T/C U7	600000204	2024/06/24	2024/06/24	2024/06/25	1	59	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos

GMU2	674586602	30	99171932	E-box 500, Ethernet DDA	600000204	2024/06/24	2024/06/24	2024/06/25	1	42	0	-1	Fecha requerida igual a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674586633	40	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600000469	2024/06/24	2024/06/26	2024/06/27	20	1	2	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674586991	10	95730820	MPV-G5/8-10 PV/T U7	602025358	2024/06/25	2024/06/06	2024/06/26	1	111	-19	-20	Fecha requerida anterior a la fecha de creación		Creación incorrecta de la orden	Área de gestión de pedidos
GMU2	674587043	10	96609016	Acc. cable 5m, control input, straight	600004354	2024/06/25	2024/06/26	2024/06/27	1	0	1	-1	Falta de existencias		Falta de existencias	Área de planeación
GMU2	674587043	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	600004354	2024/06/25	2024/06/26	2024/06/27	1	1	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674587043	30	96632922	Acc. cable 5m, analog output, straight	600004354	2024/06/25	2024/06/26	2024/06/27	1	6	1	-1	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Orden con entrega completa	Área de planeación
GMU2	674587056	20	95730503	Install. Kit I006 PV/T/C-1/4"x3/8"-NL	600004857	2024/06/25	2024/06/26	2024/06/27	1	84	1	-1	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Liberación tardía del crédito	Área de finanzas
GMU2	674587164	10	99082042	Acc.connector PVDF-A7, thread.3/4"NPT	602004263	2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	4	53	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674587164	20	96609019	Acc. cable 5m, relay output, straight	602004263	2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	2	251	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
GMU2	674587244	20	97722442	DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-3110038G	602001430	2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	2	19	1	-1	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía del bloqueo R (Robot)	Remoción tardía de bloqueo	Área de gestión de pedidos
